



Gerencia de contratos de Infraestrutura <documentos.gaci@gmail.com>

DOCUMENTAÇÃO NF 465

1 mensagem

Mevato Construções <mevatoconstrucoes@gmail.com>
Para: GACI/DACC <documentos.gaci@gmail.com>

22 de maio de 2020 09:51

Bom dia, segue documentos referente a NFe 465

--

À disposição**Mevato Construções e Comércio LTDA**
(61) 3363-9197 / 3363-9345 / 3363-8237

9 anexos**CE 043-2020.pdf**
275K**ATESTADO DE EXECUÇÃO.pdf**
414K**NFe 465.pdf**
213K**ORDEM DE SERVIÇO 038-2020.pdf**
406K**CND FGTS.pdf**
79K**CND INSS.pdf**
66K**CND GDF.pdf**
100K**CND TRT.pdf**
85K**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf**
5056K

Recebemos de MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 20/05/2020 Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Valor Total 2,082,551,96		NF-e No. 0000465 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA SETOR SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 05 CEP: 71250-155 ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61)33639-197	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA No. 0000465 SÉRIE: 001	1 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
--	--	----------------	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200020989721 - 20/05/2020 16:49:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732939900133	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.611.343/0001-92	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2005-00.611.343/0001-92-55-001-000.000.465-120.052.055-1
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 20/05/2020
ENDEREÇO SAIN PARQUE RURAL S/N	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA SAÍDA 20/05/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
HORA DE SAÍDA			

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.082.551,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000001	REFERENTE A 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA E 20 (VINTE) LEITOS DE RETAGUARDA NO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- PMDF PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES VÍTIMAS DO COVID-19 NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E CONTRATO 075/2020.	00	01	5933	SERV	1,00	2,082,551,96	0,00	2,082,551,96	0,00	0,00	0,00	0

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732939900133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.082,551,96	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 833,020,78	VALOR DO ISSQN 16,660,42
-------------------------------------	--	--	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$92.673,57 - - Percentual Serviço: 0,00% Nome Fantasia: SES MATERIAL APLICADO R\$ 1.249.531,18 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO - 070 BRB AGENCIA - 046 CONTA CORRENTE 046.000.364-0	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES ISS: 16,660,42 IRPJ: 20,825,52 INSS: 72,889,32	CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000003



GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/SULIS

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número:

DEA- 001/2020

DADOS GERENCIAIS			
Firma Executora: Mevato Construções e Comércio Ltda		Banco e Conta:	
Unidade Orçamentária:		NOTA DE EMPENHO	
		Número: 2020 NE 03562	Data: 29.04.2020
Projeto/Atividade: Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura...			
Obra/Equipamento: Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal			
PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início: 04.05.2020	Término: 13.05.2020
CONVÊNIO >	Número: -	Data: -	Vigência até: -
CONTRATO >	Número: 075/2020-SES/DF	Data: 30.04.2020	Vigência até: 27.10.2020

ORDEM DE SERVIÇO			RITMO	
Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar:	1 - Normal (x)
038/2020-DEA	04.05.2020	R\$1.000,00		
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:		
RS5.795.298,43	RS2.082.551,96	RS3.712.746,47	64,06%	

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA

Atesto a execução da etapa da obra/serviço ou o recebimento do equipamento supra, conforme abaixo discriminado:

Referente à 1ª medição do CFF da Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo COVID-19.

Conforme processo nº 04016-00030034/2020-62

Nota Fiscal nº 465 - datada de :20/05/2020

RS2.082.551,96 (dois milhões, oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)

Brasília-DF,

Mevato Construções e Comércio Ltda
Responsável Técnico
Eng. Civil

Isaque Albuquerque

Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF
Executor do convênio/Contrato

Brasília-DF,

Supervisão da Obra



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE.
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

ORDEM DE SERVIÇO

Número:

038/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AUTORIZAMOS a execução da obra ou serviço a seguir especificado, conforme:

Processo número: 04016-00030034/2020-62

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

Descrição da obra ou serviço:

- Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19.
- **OBS:** O valor total do contrato é de **R\$ 5.795.298,43** (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos). Esta Ordem de Serviço tem por objetivo efetuar o empenho no valor de **R\$ 1.000,00** (um mil reais), para adequação da Unidade.

VALOR R\$ 1.000,00 (um mil reais).

DADOS GERENCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início: 04/05/2020	Término: 24/05/2020
CONVÊNIO >CONTRATO>	Nº 075/2020 SES/DF	Data: 30/04/2020	Vigência: 27/10/2020

NOTA DE EMPENHO

Sigla da U. O: 23901	Número 2020 NE 03562	Data 29/04/2020	Valor R\$ 1.000,00
-------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------


Fonte de recurso:

100000000

Programa de Trabalho:

10.122.8202.2396.5303

Brasília, 04 de maio de 2020.


Sócrates A. de Souza
Mat. 4686903-6
DEA/SINFRA/SES
Diretor

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 01/2020

DATA: 30/04/2020

DIA DA SEMANA:

Quinta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS
SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2 – AVALIAÇÃO DOS ELEVADORES

3 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

4 – INÍCIO DOS TESTES DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS

5 – INÍCIO DO ISOLAMENTO COM PAREDES DE DRAY WALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE

6 – INÍCIO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR NA ÁREA PERTINENTE A INTERNAÇÃO

7 – REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO (SINFRA) PARA APROVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

8 – REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO (SINFRA) PARA APROVAÇÃO DA LOCAÇÃO DOS PORTÕES E FECHAMENTO DE ALAMBRADO PARA DIVIDIR OS ESTACIONAMENTOS.

9 – REUNIÃO COM O SUBSECRETÁRIO (SINFRA) PARA DEFINIÇÃO DA ABERTURA DE ACESSO E ENTRADA DE PACIENTE AO HOSPITAL.

10 – VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TELHADO E CALHAS.

11 – VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS E HIDRÁULICAS.

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado		5	5	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		1	1	
Técnico de Segurança		1	1		Montador		3	3	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		1	1	
Eletricista		2	2		Carpinteiro				
Encarregado		1	1		Marceneiro		6	1	
Ajudante		2	2		Almoxarife				

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 02/2020

DATA: 1º/05/2020

DIA DA SEMANA:

Sexta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO COM PAREDES DE DRAY WALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE

2 – EXECUÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR NA ÁREA PERTINENTE A INTERNAÇÃO – CONCLUSÃO DA PRIMEIRA ALA DA INTERNAÇÃO COM 26 LEITOS

3 – FOI ENVIADO PARA O SUBSECRETARIO (SINFRA) PARA APROVAÇÃO DA ANÁLISE E APROVAÇÃO JUNTO A POLÍCIA MILITAR UM LAYOUT DO ALAMBRADO PARA LIBERAÇÃO DA EXECUÇÃO.

4 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO E TESTES DOS SISTEMA DE GASES MEDICINAIS

SERVIÇOS EXECUTADOS

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado		2	2	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		1	1	
Técnico de Segurança		1	1		Montador		4	4	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro				
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		7	7	
Ajudante		2	2		Almoxarife				

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 03/2020

DATA: 02/05/2020

DIA DA SEMANA:

Sábado

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – EXECUÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR NA ÁREA PERTINENTE A INTERNAÇÃO – CONCLUSÃO DA PINTURA DA INTERNAÇÃO, DA ÁREA DOS QUARTOS DE INTERNAÇÃO E CORREDORES, ÁREAS DE DESCANSO, BANHEIROS, COPA, ÁREA DOS ELEVADORES E CIRCULAÇÕES E CORREDOR DE ACESSO - ÁREA ROTA DE FUGA.

2 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS – SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULAS NA ALA DA INTERNAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado		2	2	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico				
Técnico de Segurança		1	1		Montador				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro				
Eletricista					Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		10	10	
Ajudante		2	2		Almoxarife				

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 04/2020

DATA: 03/05/2020

DIA DA SEMANA:

DOMINGO

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – NÃO HOUVE EXPEDIENTE

SERVIÇOS EXECUTADOS

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado				
Engenheiro					Bombeiro Hidráulico				
Técnico de Segurança					Montador				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro				
Eletricista					Marceneiro				
Encarregado					Pintor				
Ajudante					Almoxarife				

[Assinatura]
 MEVATO - Construções e Com. Ltda
 André Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694631-6
 SINFRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 05/2020

DATA: 04/05/2020

DIA DA SEMANA:

Segunda-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO COM PAREDES DE DRAY WALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE

2 – CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR NA ÁREA PERTINENTE A INTERNAÇÃO

3 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS

4 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SPLITS

5 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES

6 – INÍCIO DA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS

7 – RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO EM DIVERSOS LOCAIS

8 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS

9 – LEVAMENTO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO – EXTINTORES, PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES

10 – LEVAMENTO E VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA

11 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 – REUNIÃO COM O SR. THIAGO (IGESDF) E O EXECUTOR CONTRATO ENGº SOCRATES ONDE FOI COLOCADO DIVERSAS MODIFICAÇÕES, ONDE ESTAMOS DEPENDENDO DE AUTORIZAÇÃO POR PARTE DA SINFRAS - SES. (ENTRADA, FECHAMENTOS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO – CHUVEIROS)

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador - Gases medicinais e ar condicionado		4	4	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		1	1	
Técnico de Segurança		1	1		Montador		4	4	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		2	2	
Eletricista		2	2		Marceneiro		1	1	
Encarregado		1	1		Pintor		8	8	
Ajudante		2	2		Almoxarife		1	1	

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 06/2020

DATA: 05/05/2020

DIA DA SEMANA:

terça-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO COM PAREDES DE DRAY WALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE

2 – CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR NA ÁREA PERTINENTE A INTERNAÇÃO E INCÍO DA PINTURA DO PAVIMENTO TÉRREO

3 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO E TESTES DOS SISTEMA DE GASES MEDICINAIS

4 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SPLITS

5 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES

6 – INICIO DA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS

7 – RECUPERÇÃO DO FORRO DE GESSO EM DIVERSOS LOCAIS

8 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS

9 – LEVAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – EXTINTORES, PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES

10 – LEVAMENTO E VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA

11 – INICIO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 – DEMOLIÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DO SR. THIAGO (IGESDF) – BALCÃO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		7	7	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		1	1	
Técnico de Segurança		1	1		Montador		1	1	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		2	2	
Eletricista		2	2		Marceneiro		2	2	
Encarregado		1	1		Pintor		8	8	
Ajudante		3	3		Almoxarife		1	1	

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 07/2020

DATA: 06/05/2020

DIA DA SEMANA:

Quarta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1 – FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO COM PAREDES DE DRAY WALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE
- 2 – CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR NA ÁREA PERTINENTE A INTERNAÇÃO E INCÍO DA PINTURA DO PAVIMENTO TÉRREO
- 3 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO E TESTES DOS SISTEMA DE GASES MEDICINAIS
- 4 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SPLITS
- 5 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES
- 6 – INICIO DA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS
- 7 – FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERÇÃO DO FORRO DE GESSO EM DIVERSOS LOCAIS DO HOSPITAL
- 8 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS
- 9 – LEVAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – EXTINTORES, PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES
- 10 – LEVAMENTO E VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA
- 11 – INICIO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		7	7	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		1	1	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		2	2	
Eletricista		2	2		Marceneiro		2	2	
Encarregado		1	1		Pintor		7	7	
Ajudante		3	3		Almoxarife		1	1	

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 07/2020

DATA: 07/05/2020

DIA DA SEMANA:

Quinta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR E TÉRRO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2 – FINALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE GASES MEDICINAIS

3 – FINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SPLITS DO PAVIMENTO SUPERIO E CONTINUAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL

4 – FINALIZAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES

5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS

6 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS

7 – CONTINUAÇÃO VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – EXTINTORES, PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES

8 – INICIO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA

9 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

XXXXXX

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		6	6	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		3	3	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		2	2		Marceneiro		2	2	
Encarregado		1	1		Pintor		6	6	
Ajudante		3	3		Almoxarife		1	1	



OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 09/2020

DATA: 08/05/2020

DIA DA SEMANA:

Sexta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR E TÉRRO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2 – FINALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE GASES MEDICINAIS

3 – FINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO SPLITS DO PAVIMENTO SUPERIO E CONTINUAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL

4 – FINALIZAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES

5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS

6 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS

7 – CONTINUAÇÃO VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – EXTINTORES, PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES

8 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA

9 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO

10 – DEFINIÇÃO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE JUNTAMENTE COM O REPRESENTANTES DA POLICIA MILITAR DA ÁREA ONDE SERÁ EXECUTADO O ABRIGO DE RESÍDUOS

11 – SOLICITAÇÃO POR PARTE DO SR. THIAGO – IGESDF, DE FECHAMENTO EM DRAY-WAL NO PAVIMENTO TÉRREO, PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS DOS JÁ EM ESTADO DE LIBERAÇÃO – SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO DO EXECUTOR DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

M T N

M T N

Vigilantes

Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores

Engenheiro

Bombeiro Hidráulico

Técnico de Segurança

Montadores

Auxiliar de Engenharia

Serralheiro

Eletricista

Marceneiro

Encarregado

Pintor

Ajudante

Almoxarife

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 10/2020

SERVIÇOS EXECUTADOS

DATA: 09/05/2020		DIA DA SEMANA:	Sábado
SERVIÇOS EXECUTADOS			
1 – CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR E TÊRRO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE			
2 – FINALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE GASES MEDICINAIS			
3 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL			
4 – FINALIZAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES			
5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFEÇÃO DE ALAMBRADOS			
6 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS			
7 – CONTINUAÇÃO VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – EXTINTORES, PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES			
8 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA			
9 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO			
10 – SOLICITAÇÃO POR PARTE DO SR. THIAGO – IGESDF, INICIO DO FECHAMENTO EM DRAY-WAL NO PAVIMENTO TÊRREO, PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS DOS JÁ EM ESTADO DE LIBERAÇÃO.			

CHUVA

	Forte	Fraca
Manhã		
Tarde		
Noite		

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		4	4	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		4	4	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		5	5	
Eletricista		2	2		Marceneiro		3	3	
Encarregado		1	1		Pintor		5	5	
Ajudante		3	3		Almoxarife		1	1	



OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 11/2020

SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA: 10/05/2020		DIA DA SEMANA:		DOMINGO	
	SERVIÇOS EXECUTADOS					
	1 - NÃO HOUVE EXPEDIENTE					
	CHUVA					
	Manhã		Forte		Frac	
Tarde						
Noite						
		M	T	N		
Vigilantes					Instalador - Gases medicinais e ar condicionado	
Engenheiro					Bombeiro Hidráulico	
Técnico de Segurança					Montador	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro	
Eletricista					Marceneiro	
Encarregado					Pintor	
Ajudante					Almoxarife	

[Assinatura]
MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad

[Assinatura]
Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 12/2020

DATA: 11/05/2020

DIA DA SEMANA:

Segunda-Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO SUPERIOR E TÉRRO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2 – FINALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE GASES MEDICINAIS

3 – CONTINUAÇÃO DO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL

4 – FINALIZAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES

5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS

6 – CONTINUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS

7 – CONTINUAÇÃO VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – EXTINTORES, PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES

8 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA

9 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO

10 – FINALIZAÇÃO DOS FECHAMENTOS EM DRY-WAL NO PAVIMENTO TÉRREO, PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES INFECTADOS DOS JÁ EM ESTADO DE LIBERAÇÃO.

11 – INICIO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

M T N

M T N

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		4	4	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		3	3	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		2	2		Marceneiro		2	2	
Encarregado		1	1		Pintor		5	5	
Ajudante		4	4		Almoxarife		1	1	



OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 13/2020

DATA: 12/05/2020

DIA DA SEMANA:

Terça-Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONCLUSÃO DA PINTURA DO PAVIMENTO SUPERIOR E CONTINUAÇÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO TÉRREO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2 – FINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GASES MEDICINAIS – PAVIMENTO SUPERIOR, CONTINUAÇÃO DA REVISÃO NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA

3 – CONTINUAÇÃO DO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL

4 – FINALIZAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES

5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS

6 – ANDAMENTO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NOS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR

7 – ANDAMENTO DA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES

8 – CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA

9 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO

10 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – ALAMBRADO E TERRAPLENAGEM

11 – INÍCIO DOS SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO – TERRAPLENAGEM

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		4	4	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		3	3	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		2	2		Marceneiro		1	1	
Encarregado		1	1		Pintor		6	6	
Ajudante		4	4		Almoxarife		1	1	



OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 14/2020

DATA: 13/05/2020

DIA DA SEMANA:

Quarta-Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – ANDAMENTO DA PINTURA NO PAVIMENTO TÉRREO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2 – FINALIZAÇÃO DOS SISTEMA DE GASES MEDICINAIS – PAVIMENTO SUPERIOR, CONTINUAÇÃO DA REVISÃO NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA – FOI VERIFICADO DIVERSOS VAZAMENTOS NA REDE DE OXIGÊNIO ACARRETANDO UMA DIFICULDADE EM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE VAZAMENTO E TAMBÉM A CENTRAL DE OXIGÊNIO ENCONTRA-SE QUEIMADA, SOLICITAMOS DA FÁBRICA COM PRAZO DE CHEGADA DE 5 A 8 DIAS

3 – CONTINUAÇÃO DO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – SOLICITAMOS DA FÁBRICA DOS FILTROS DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA FÁBRICA – ATÉ 10 DIAS PARA A ENTREGA. APÓS TESTES VERIFICAMOS 3 COMPRESSORES COM FUNCIONAMENTO IRREGULAR – RETIRADOS PARA CONserto

4 – FINALIZAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – SOLICITAMOS DO FABRICANTE A OS LIMITADORES DE VELOCIDADE ADEQUADOS PARA OS ELEVADORES EXISTENTES – 10 DIAS PARA A ENTREGA

5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS

6 – ANDAMENTO DA VERIFICAÇÃO, TESTES E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NOS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR

7 – ANDAMENTO DA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES – CENTRAL DE INCÊNDIO NÃO ESTÁ EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, NECESSITANDO DE PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA E STARTUPS DE TODOS OS DETECTORES, ACIONADORES, SIRENES; COMISSIONAMENTO DO SISTEMA EM CURSO DE MANUSEIO; ENDEREÇAMENTO DE TODOS OS PONTOS COMPATÍVEIS COM O LOCAL, IDENTIFICAÇÃO NO PAINEL CENTRAL DOS ALARMES;

8 – CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA – PORTAS, FECHADURAS, DOBRADINHAS, FERROLHOS E BATE MACA

9 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO

10 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – ALAMBRADO E TERRAPLENAGEM

11 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO – TERRAPLENAGEM

12 – serviços de revisão do piso em Paviflex no pavimento térreo

13 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO TÉRREO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 15/2020

DATA: 14/05/2020

DIA DA SEMANA:

Quinta-Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – ANDAMENTO DA PINTURA NO PAVIMENTO TÉRREO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA – FOI VERIFICADO DIVERSOS VAZAMENTOS NA REDE DE OXIGÊNIO ACARRETANDO UMA DIFICULDADE EM LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE VAZAMENTO E TAMBÉM A CENTRAL DE OXIGÊNIO ENCONTRA-SE QUEIMADA.

3 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

4 – FINALIZAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – AGUADANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFEÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS

6 – FINALIZAÇÃO DOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NOS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR

7 – ANDAMENTO DA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES – AGUARDANDO PEÇAS PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS;

8 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO

9 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – CONCLUSÃO DO ALAMBRADO E TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DAS OBRAS

10 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO – TERRAPLENAGEM

11 – SERVIÇOS DE REVISÃO DO PISO EM PAVIFLEX NO PAVIMENTO TÉRREO

12 – SERVIÇOS DE REVISÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E CONFEÇÃO DE PORTA DE ENTRADA CONFORME SOLICITADO PELO SR. THIAGO – IGEST

13 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO TÉRREO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

XXXXXXXX

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		4	4	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		3	3	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		2	2		Marceneiro		1	1	

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 16/2020

DATA: 15/05/2020

DIA DA SEMANA:

Sexta-Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1 – ANDAMENTO DA PINTURA NO PAVIMENTO TÉRREO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
- 2 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DA REDE DE GASES NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA – AGUARDANDO A CHEGADA DA CENTRAL DE OXIGÊNIO PARA TESTES FINAIS.
- 3 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.
- 4 – FINALIZAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – AGUARDANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
- 5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS. CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
- 6 – FINALIZAÇÃO DOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INTERRUPTORES E TOMADAS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NOS BANHEIROS DO PAVIMENTO SUPERIOR
- 7 – ANDAMENTO DA VERIFICAÇÃO DOS SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES – AGUARDANDO PEÇAS PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS;
- 8 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO – 8 PONTOS PARA DML
- 9 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – CONCLUSÃO DO ALAMBRADO E TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DAS OBRAS – CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
- 10 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO – TERRAPLENAGEM – CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS
- 11 – SERVIÇOS DE REVISÃO DO PISO EM PAVIFLEX NO PAVIMENTO TÉRREO
- 12 – SERVIÇOS DE REVISÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E CONCLUSÃO DE PORTA DE ENTRADA PAVIMENTO TÉRREO
- 13 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO TÉRREO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

XXXXXXXX

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		3	3	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		3	3	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		2	2		Marceneiro		1	1	

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 17/2020

	DATA: 16/05/2020		DIA DA SEMANA:	Sábado					
SERVIÇOS EXECUTADOS	SERVIÇOS EXECUTADOS								
	1 – CONCLUSÃO DA PINTURA NO PAVIMENTO TÉRREO NA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE								
	2 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DA REDE DE GASES NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA – AGUARDANDO A CHEGADA DA CENTRAL DE OXIGÊNIO PARA TESTES FINAIS.								
	3 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.								
	4 – ANDAMENTO DOS TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – AGUARDANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS								
	5 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS. CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS								
	6 – ANDAMENTO DA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES – AGUARDANDO PEÇAS PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS;								
	7 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO – 8 PONTOS PARA DML								
	8 – SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA, CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS								
	9 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – CONCLUSÃO DO ALAMBRADO E TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DAS OBRAS – CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS								
	10 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO – TERRAPLENAGEM – CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS								
	11 – SERVIÇOS DE REVISÃO DO PISO EM PAVIFLEX NO PAVIMENTO TÉRREO								
	12 – CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PORTA DE ENTRADA PAVIMENTO TÉRREO, REVISÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO								
	13 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO TÉRREO								
CHUVA									
	Forte		Fraca						
Manhã									
Tarde	XXXXXXXX								
Noite									
		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		2	2	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		3	3	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		3	3	
Eletricista		2	2		Marceneiro				

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 18/2020

SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA: 17/05/2020	DIA DA SEMANA:		Domingo
	SERVIÇOS EXECUTADOS			
	1 – Devido as intensas chuvas no dia anterior não houve condições de trabalho e execução dos serviços			
CHUVA				
	Forte		Fraca	
Manhã				
Tarde				
Noite				
		M	T	N
Vigilantes				Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores
Engenheiro				Bombeiro Hidráulico
Técnico de Segurança				Montadores
Auxiliar de Engenharia				Serralheiro
Eletricista				Marceneiro
Encarregado				Pintor
Ajudante				Almoxarife


Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694631-6
 SINFRA/SES-DF


MEVATO - Construções e Com. Ltda
 André Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 199200-DF

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF

TÍTULO: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR

ENCARGOS
TRABALHISTAS:

B.D.I.: 20,94% (obra)

SINAPI FEV 2020

B.D.I.: 10,89% (equipamentos)



MEVATO
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	REFORMA		MANUTENÇÃO							
			10 Dias	20 Dias	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06		
02.00.000.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.648,95	50,00%	50,00%								
			9.324,47	9.324,47								
02.02.000.00	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL	110.261,42	47,50%	47,50%								5,00%
			52.501,98	52.501,98								5.257,47
10.00.000.00	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	614.649,77	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			122.929,95	122.929,95	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO											
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	2.135.710,84	47,99%	47,99%								4,02%
			1.024.968,36	1.024.968,36								85.774,11
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30.342,82	50,00%	50,00%								
			15.171,41	15.171,41								
11.01.300.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	81.237,82	47,77%	47,77%								4,47%
			38.804,66	38.804,66								3.628,51
11.01.410.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	103.998,00	47,53%	47,53%								4,94%
			49.430,57	49.430,57								5.136,86
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	157.549,51	28,43%	28,43%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	6,90%	10,92%	6,92%	
			44.794,01	44.794,01	11.546,38	11.546,38	11.546,38	11.546,38	10.867,18	10.908,78	10.908,78	
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	307.818,91	20,30%	20,30%	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	9,50%	9,50%	9,50%	
			62.489,70	62.489,70	31.082,72	31.082,72	31.082,72	31.082,72	29.254,32	29.254,32	29.254,32	
11.01.501.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	1.399.856,31	28,40%	28,40%	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	6,91%	6,91%	6,91%	
			397.608,39	397.608,39	102.788,72	102.788,72	102.788,72	102.788,72	96.742,32	96.742,32	96.742,32	
01.01.503.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	56.003,93	50,00%	50,00%								
			28.001,96	28.001,96								
11.01.900.00	CONDENSADO	150.006,14	16,88%	16,88%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	10,53%	10,97%	10,97%	
			25.323,19	25.323,19	16.776,80	16.776,80	16.776,80	16.776,80	15.789,93	16.462,66	16.462,66	
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS	629.214,03	33,57%	33,57%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,26%	5,26%	5,26%	
			211.203,32	211.203,32	35.157,26	35.157,26	35.157,26	35.157,26	33.089,18	33.089,18	33.089,18	
	VALOR MENSAL	5.795.298,43	2.082.551,96	2.082.551,96	258.816,85	258.816,85	258.816,85	258.816,85	247.207,92	347.719,18	347.719,18	
	VALOR ACUMULADO		2.082.551,96	4.165.103,92	4.423.920,77	4.682.737,63	4.941.554,48	5.200.371,33	5.447.579,25	5.795.298,43	5.795.298,43	
	% MENSAL		35,94%	35,94%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,27%	6,00%	6,00%	
	% ACUMULADO		35,94%	71,87%	76,34%	80,80%	85,27%	89,73%	94,00%	100,00%	100,00%	

MEVATO, Construções e Com. Ltda.
Pedro Luiz Delgado Assis
Eng. Civil CREA 199200-DF

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MEDICO DA POLICIA MILITAR
CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DADOS										
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	MESES		
02.06.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES														
02.01.401.00	TAPAJUE DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPOVEITAMENTO DE 2X	M2	300,00	15.420,00	50,00%	50,00%									
					7.710,00	7.710,00									
02.02.000.00	DEMOLIÇÃO														
02.02.100.00	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL														
02.02.100.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIPO LO MACOÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO AF_12/2017	M3	2,50	194,38	50,00%	50,00%									
					97,19	97,19									
02.02.100.06	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO	M2	106,00	720,30	50,00%	50,00%									
					360,15	360,15									
02.02.100.07	RETRADA DE TELHA DE ALAMBRAO	M2	120,00	378,00	50,00%	50,00%									
					189,00	189,00									
02.02.100.08	RETRADA DE ALAMBRAO	M2	62,00	458,18	50,00%	50,00%									
					229,09	229,09									
02.02.100.13	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PAREDES	M2	125,00	1.180,00	50,00%	50,00%									
					590,00	590,00									
02.02.100.16	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO / CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	136,00	780,24	50,00%	50,00%									
					390,12	390,12									
02.02.100.17	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO AF_12/2017	M2	30,00	454,30	47,50%	47,50%									
					215,75	215,75									
02.02.100.27	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO AF_12/2017	M2	692,00	844,24	40,1,01	40,1,01									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.29	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO AF_12/2017	M2	428,00	1.587,88	754,24	754,24									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.30	REMOÇÃO DE PINTURA A LATEX	M2	4.695,00	29.468,55	13.997,51	13.997,51									
					50,00%	50,00%									
02.02.100.34	REMOÇÃO DE GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO	M	60,00	535,80	257,90	257,90									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.37	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO AF_12/2017	LN	20,00	183,20	87,02	87,02									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.39	REMOÇÃO DE METAS SANITARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO AF_12/2017	LN	90,00	601,20	285,57	285,57									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.40	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO AF_12/2017	LN	60,00	67,80	32,21	32,21									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.44	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	LN	320,00	4.980,00	2.356,00	2.356,00									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.45	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO AF_12/2017	LN	30,00	14,70	6,98	6,98									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.46	REMOÇÃO DE TOMADAS TELEFÔNICAS	LN	60,00	29,40	13,97	13,97									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.48	REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS	M3	260,00	16.900,00	8.027,50	8.027,50									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.49	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	260,00	8.320,00	3.952,00	3.952,00									
					47,50%	47,50%									
02.02.100.50	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	2.197,40	23.512,18	11.168,29	11.168,29									
					50,00%	50,00%									
10.00.000.00	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS														
10.01.000.00	PESSOAL														
10.01.000.01	ENGENHEIRO CIVIL, DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	13,00	220.739,22	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
					44.147,84	44.147,84	22.073,92	22.073,92	22.073,92	22.073,92	22.073,92	22.073,92			
10.01.000.02	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	110.369,61	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
					22.073,92	22.073,92	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96			
10.01.000.03	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	110.369,61	22,073,92	22,073,92	11,036,96	11,036,96	11,036,96	11,036,96	11,036,96	11,036,96			



MEVATO
CONSTRUTORES E ENGENHEIROS

PLATE: REVENID0300
NÃO DESPENSADO
LEB SOCIAIS HOBISTA 114,00% MENSAL 73,45%

Isaque Albuquerque,
Subsecretário
Matrícula: 1694631-F
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/02/2020

DATA: 14/05/2020					DIAS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS				
10.01.000.04	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,50	28.519,14	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
10.01.000.05	ALMOXARFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,50	36.234,45	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
10.03.000.00	DE CONSTRUÇÃO CIVIL															
10.03.300.00	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA PORFECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALCAO	M2	500,00	1.995,00	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO				389,00	399,00	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50				
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO															
11.01.101.00	ALVENARIAS				50,00%	50,00%										
11.01.101.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X18X19CM (ESPESURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0802014	M2	196,00	11.595,48	50,00%	50,00%										
11.01.102.00	DIVISÓRIAS				5,797,74	5,797,74										
11.01.102.12	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_0902017_P	M2	256,00	31.557,12	50,00%	50,00%										
11.01.102.13	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA EM LOCAL ÚNICO, ESPESURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	M2	635,00	106.876,85	47,50%	47,50%						5,00%				
11.01.106.00	ESQUADRIAS METÁLICAS				50,00%	50,00%						5.343,84				
11.01.106.05	PORTA CORTA-FUOGO 80X210XCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0802015	UN	6,00	5.162,52	2.581,26	2.581,26										
11.01.106.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_0702016	M2	5,40	1.450,39	50,00%	50,00%						5,00%				
11.01.106.18	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - FUJADORES, ROLDANAS, ALAVANCAS, CAIXILHOS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS	M2	1.392,42	145.551,77	47,50%	47,50%						7.282,59				
11.01.109.00	PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA				69.184,59	69.184,59										
11.01.109.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÍVEO OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0802015	UN	5,00	3.218,45	50,00%	50,00%										
11.01.109.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÍVEO OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0802015	UN	5,00	3.646,35	50,00%	50,00%										
11.01.110.04	FECHADURA DE EMBAUTIR COM CILINDRO EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0802015	UN	10,00	1.039,50	1.823,18	1.823,18										
11.01.110.09	TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREFOR 2"	UN	6,00	86,70	519,76	519,76										
11.01.110.13	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	20,00	529,50	50,00%	50,00%										
11.01.111.00	VIDROS E ESPELHOS DE VIDRO				50,00%	50,00%										
11.01.111.03	VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	56,40	12.853,00	6.428,50	6.428,50										
11.01.112.00	COBERTURA				50,00%	50,00%										
11.01.112.04	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO ENVERNIZADA OU PINTADA, PERFIL ONDULADO # 0,4 MM	M2	111,00	5.757,57	2.878,79	2.878,79						5,00%				
11.01.112.11	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	635,00	4.019,55	47,50%	47,50%						5,00%				
11.01.112.17	REVISÃO GERAL DE TELHAS ONDULADAS	M2	5.493,50	16.535,44	7.854,33	7.854,33						826,77				

MEVATO
CENTRO MÉDICO E LABORATÓRIOBASE: FUNDACIONADO
MÃO DESCOBERTO
LEIS SOCIAIS HORISTIA 114,00%
MÉDIA 74,45%


Isaque Albuquerque

Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MEDICO DA POLICIA MILITAR
CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/05/2020



BASE: FVIVRIM2020
MÃO DE OBRA: 114,00%
LEIS SOCIAIS: HORRITA
MENSAL: 73,45%

MESES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS		MANUTENÇÃO					
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
11.01.113.00	REVESTIMENTO DE PISOS											
11.01.113.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADESIAMENTO	M3	10,00	5.102,80	50,00%	50,00%						
11.01.113.02	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, AF_08/2017	M3	10,00	4.444,20	50,00%	50,00%						
11.01.113.05	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO VINILICO	M2	2.174,90	28.794,31	47,50%	2.222,10						
11.01.113.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 AF_08/2014	M2	95,00	5.098,65	50,00%	50,00%						
11.01.113.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	10,00	5.888,30	2.834,15	2.834,15						
11.01.113.20	PISO VINILICO TIPO MANTA E=2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	788,00	101.681,16	47,50%	48.298,55						
11.01.113.21	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO VINILICO EM MANTE E=2CM	M2	1.145,00	100.498,66	47,50%	47.735,91						
11.01.114.00	REVESTIMENTO DE PAREDES											
11.01.114.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_08/2014	M2	216,00	948,08	47,50%	47,50%						
11.01.114.03	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUTENTAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_08/2014	M2	216,00	6.168,96	50,00%	50,00%						
11.01.114.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_08/2014	M2	125,00	4.621,25	50,00%	50,00%						
11.01.114.08	RELAUTAMENTO PARA AZULEJO C/ CIMENTO BRANCO - E=3MM (RECOMPOSIÇÃO)	M2	125,00	1.095,00	50,00%	50,00%						
11.01.115.00	REVESTIMENTOS DE FORRO											
11.01.115.03	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_08/2017_P	M2	852,00	48.666,24	47,50%	47,50%						
11.01.115.05	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_08/2017_P	M2	75,00	3.025,50	50,00%	50,00%						
11.01.116.00	PINTURAS											
11.01.116.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	5.120,00	62.617,60	47,50%	47,50%						
11.01.116.02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO, AF_06/2017	M2	856,00	18.772,08	47,50%	47,50%						
11.01.116.03	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃO	M2	712,00	14.994,72	47,50%	47,50%						
11.01.116.04	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.650,00	40.557,00	47,50%	47,50%						
11.01.116.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	3.795,60	61.071,20	47,50%	47,50%						
11.01.116.06	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANCOS COM PRESENÇA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO, AF_11/2016	M2	14.037,60	164.941,80	47,50%	47,50%						
11.01.116.07	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANCOS COM PRESENÇA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO, AF_11/2016 PAREDES REFORMA	M2	24.652,96	289.672,28	47,50%	47,50%						

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1604631-
SINFRA/SES-DF

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/02/2020

DATA: 14/05/2020					DIAS									
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS		
11.01.116.08	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAINOS COM PRESENCIA DE VAZOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016 PAREDES PERÍODO DE MANUTENÇÃO 50%	M2	12.328,48	144.836,14	47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.116.09	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAOL), DUAS DEMÃOS	M2	1.360,00	26.744,80	50,00%	50,00%							7.241,81	
11.01.116.10	PINTURA HOROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	1.298,00	21.252,00	50,00%	50,00%								
11.01.118.00	ACABAMENTOS E ARREMATOS													
11.01.118.12	LIMPEZA DE CALHAS	M2	435,00	639,45	47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.118.16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	1.688,80	47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.118.17	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF_10/2016	UN	30,00	1.391,20	47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.118.18	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF_10/2016	UN	30,00	1.123,20	47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.118.18	NOVA SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL	UN	1,00	32.800,00	47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.120.00	INTERIORES												1.640,00	
11.01.120.02	BRANCA EM AÇO INOXIDÁVEL	M2	20,00	28.594,80	50,00%	50,00%							5,00%	
11.01.120.03	PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MAÇA) EM PVC, LARGURA 20CM, ESPESURA 3CM	M	300,00	16.728,00	47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.120.05	RODAPÊ VINÍLICO HOSPITALAR 7,5CM DE SOBREPOR	M	600,00	17.004,00	47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.134.00	CERCAS / ALAMBRADOS													
11.01.134.01	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BRN3 E MALHA 7,5X7 5CM	M2	244,00	46.191,54	50,00%	50,00%								
11.01.141.00	SERVIÇOS PRELIMINARES													
11.01.141.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	30,00	875,30	50,00%	50,00%								
11.01.144.00	REVESTIMENTO COM BRITA													
11.01.144.01	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APLIADO MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30KG	M3	410,00	69.417,10	50,00%	50,00%								
11.01.144.02	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR	M2	7.000,00	1.780,00	50,00%	50,00%								
11.01.144.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR	M3	2.450,00	11.294,50	50,00%	50,00%								
11.01.144.04	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC-95% DO PH (ÁREAS) (CAMINHEIRO 140 HP E ROLLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	857,50	4.347,53	50,00%	50,00%								
11.01.144.05	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	857,50	1.337,86	50,00%	50,00%								
11.01.144.05	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	38.159,50	23.495,70	50,00%	50,00%								
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS													
11.01.210.00	REATERIO MANUAL APLIADO COM SQUEETE, AF_10/2017	M3	11,25	424,35	50,00%	50,00%								

Isaque Albuquerque



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

BASE: FEVEREIRO/2020
MÃO DE OBRA: 114,00%
MENSAL: 13,65%

Isaque Albuquerque

Subsecretário
Matrícula: 1694531-E
SINFRA/SES-DF

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/05/2020


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS										MESES					
					REFORMA - 10 DIAS		REFORMA - 20 DIAS		MANUTENÇÃO 1º MES		MANUTENÇÃO 2º MES		MANUTENÇÃO 3º MES		MANUTENÇÃO 4º MES		MANUTENÇÃO 5º MES		MANUTENÇÃO 6º MES	
11.01.210.02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	M3	16,00	327,00	50,00%	163,50	50,00%	163,50												
11.01.210.03	LASTRO DE BRITA COMPACTADO PARA FUNDO DE VALAS	M3	11,25	2.262,60	50,00%	1.131,30	50,00%	1.131,30												
11.01.210.04	CONCRETO FCK = 19MPa, TRAÇO 1:3:3,5 (CIMENTO/AREIA/ÁGUA) BRITA 11 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	26,25	7.758,45	50,00%	3.879,23	50,00%	3.879,23												
11.01.240.00	ESTRUTURA METÁLICA																			
11.01.240.01	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERIL 7/7 1277 X 5 14/7	KG	300,00	3.270,00	50,00%	1.635,00	50,00%	1.635,00												
11.01.240.02	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELÇAS, VÃO LIVRE DE 19M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	75,00	8.683,75	50,00%	4.291,88	50,00%	4.291,88												
11.01.240.06	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	M2	75,00	619,50	50,00%	309,75	50,00%	309,75												
11.01.240.07	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	75,00	1.843,50	50,00%	921,75	50,00%	921,75												
11.01.300.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS																			
11.01.310.00	ÁGUA FRIA																			
11.01.310.04	RASGO EM ALVENARIA PARA ELÉTRICOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_06/2015	M	90,00	417,60	50,00%	208,80	50,00%	208,80												
11.01.310.05	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_09/2015	M	110,00	1.181,40	50,00%	590,70	50,00%	590,70												
11.01.310.07	CHUMBEAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM AF_05/2015	UN	100,00	773,30	50,00%	386,65	50,00%	386,65												
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO																			
11.01.311.027	TUBO PVC SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25 MM	M	70,00	1.271,90	50,00%	635,95	50,00%	635,95												
11.01.312.00	APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS																			
11.01.312.003	BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	6,00	8.031,84	47,50%	3.816,12	47,50%	3.816,12												
11.01.312.004	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	463,54	47,50%	216,43	47,50%	216,43												
11.01.312.010	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPensa, BARRA DE APOIO DE CANTO E MISTURADOR MONOCOMANDO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	3,00	2.628,48	47,50%	1.248,53	47,50%	1.248,53												
11.01.312.016	FORNECEDOR CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	4,00	370,92	47,50%	176,19	47,50%	176,19												
11.01.312.034	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCEMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	10,00	901,30	47,50%	428,12	47,50%	428,12												
11.01.312.056	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	644,00	47,50%	305,90	47,50%	305,90												
11.01.312.061	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	564,78	47,50%	268,26	47,50%	268,26												
11.01.312.062	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (REPOSIÇÃO)	UN	6,00	615,60	47,50%	289,41	47,50%	289,41												
11.01.312.063	KIT REPARO DE VÁLVULA DE 1 1/2" 4686 325 DECA	UN	10,00	886,00	47,50%	426,60	47,50%	426,60												

MEVATO
CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

BASE: FEVEREIRO/2020
MÃO DE OBRA
LEIS SOCIAIS: 114,00%
MENSAL: 73,45%

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF

DATA: 14/05/2020



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DADOS									
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MES	MANUTENÇÃO 2º MES	MANUTENÇÃO 3º MES	MANUTENÇÃO 4º MES	MANUTENÇÃO 5º MES	MANUTENÇÃO 6º MES	MANUTENÇÃO 7º MES	MANUTENÇÃO 8º MES
11.01.312.065	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	15,00	1.607,70	47,50%	47,50%						80,39		5,00%
11.01.312.067	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	3,00	75,63	47,50%	47,50%	36,92					3,78		5,00%
11.01.312.068	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2" X 1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	6,00	231,80	47,50%	47,50%	110,01					11,88		5,00%
11.01.312.069	DUCHA HIGIÊNICA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	1.193,24	47,50%	47,50%	628,79					55,66		5,00%
11.01.312.074	TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESNATIC	UN	20,00	3.213,80	47,50%	47,50%	1.528,96					160,69		5,00%
11.01.312.081	PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUSO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UN	20,00	72,60	47,50%	47,50%	34,49					3,63		5,00%
11.01.312.082	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/27 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	20,00	581,80	47,50%	47,50%	278,36					29,08		5,00%
11.01.312.099	ASSENTO PLÁSTICO COM ABERTURA FRONTAL PARA BACIA SANITÁRIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	15,00	1.962,00	47,50%	47,50%	931,95					95,10		5,00%
11.01.340.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
11.01.341.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC													
11.01.341.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREFIDAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	M	60,00	876,60	50,00%	50,00%	438,30							
11.01.341.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREFIDAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	M	40,00	848,80	50,00%	50,00%	424,40							
11.01.341.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREFIDAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	6,00	47,82	50,00%	50,00%	23,91							
11.01.341.08	JUNÇÃO 45º DE PVC BRANCO, PONTA BOISA E VIROLA, DIAM. 100X50MM	UN	3,00	72,36	50,00%	50,00%	36,18							
11.01.341.09	JUNÇÃO 45º DE PVC BRANCO, PONTA BOISA E VIROLA, DIAM. 100X75MM	UN	2,00	89,06	50,00%	50,00%	44,53							
11.01.341.10	JUNÇÃO 45º DE PVC BRANCO, PONTA BOISA E VIROLA, DIAM. 75X50MM	UN	2,00	22,72	50,00%	50,00%	11,36							
11.01.341.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREFIDAL DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	4,00	18,64	50,00%	50,00%	9,32							
11.01.341.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREFIDAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	3,00	23,67	50,00%	50,00%	11,84							
11.01.341.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOISA SOLDAVEL DE PVC BRANCO, DIAM. 50X40MM	UN	3,00	12,87	50,00%	50,00%	6,44							
11.01.342.00	CAIXA SIFONADA COM GRELHA													
11.01.342.01	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_122014	UN	10,00	97,20	47,50%	47,50%	46,17					4,86		5,00%
11.01.342.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_122014	UN	2,00	42,96	47,50%	47,50%	20,41					2,16		5,00%
11.01.342.03	GRELHA INOX 15X15CM	UN	15,00	418,50	47,50%	47,50%	198,79					20,83		5,00%
11.01.342.04	GRELHA INOX 10X10CM	UN	8,00	121,60	47,50%	47,50%	57,76					8,08		5,00%
11.01.344.00	SERVIÇOS DIVERSOS													

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694 ... 2-6
 SINFRA/SES-DF

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR
 CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/05/2020

MEMORIAL DESCRITIVO										DIAS										MESES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR										REFORMA - 10 DIAS										REFORMA - 20 DIAS										MANUTENÇÃO 1º MÊS										MANUTENÇÃO 2º MÊS										MANUTENÇÃO 3º MÊS										MANUTENÇÃO 4º MÊS										MANUTENÇÃO 5º MÊS										MANUTENÇÃO 6º MÊS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL										DIAS										MESES										MANUTENÇÃO 1º MÊS										MANUTENÇÃO 2º MÊS										MANUTENÇÃO 3º MÊS										MANUTENÇÃO 4º MÊS										MANUTENÇÃO 5º MÊS										MANUTENÇÃO 6º MÊS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CÓDIGO										DESCRIÇÃO										UNIDADE										QUANT.										PREÇO TOTAL (R\$)										REFORMA - 10 DIAS										REFORMA - 20 DIAS										MANUTENÇÃO 1º MÊS										MANUTENÇÃO 2º MÊS										MANUTENÇÃO 3º MÊS										MANUTENÇÃO 4º MÊS										MANUTENÇÃO 5º MÊS										MANUTENÇÃO 6º MÊS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.01.344.18										LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL OU ESCOTO, INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM, COM EQUIPAMENTO DE HIPOCLORITAMENTO										M										520,00										35.350,00										47,50%										47,50%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



MINISTÉRIO DA SAÚDE
 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

BASE: FEVEREIRO/2020
 MÃO DESPESADA
 LER: SOCAS - HORISTA: 114,09% - MENSAL: 73,45%

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694631-6
 SINRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MEDICO DA POLICIA MILITAR
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/03/2020

MEMORIAL DESCRITIVO										BASE: FEVEREIRO/2020 MÃO DEOBREIRO/20 LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,00% MENSAL: 73,60%									
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MEDICO DA POLICIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL										MESES									
DATA: 04/02/2020										DIAS									
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MES	MANUTENÇÃO 2º MES	MANUTENÇÃO 3º MES	MANUTENÇÃO 4º MES	MANUTENÇÃO 5º MES	MANUTENÇÃO 6º MES							
11.01.412.53	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	20,00	219,60	47,50%	47,50%							5,00%						
11.01.412.61	LULA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	40,00	278,20	47,50%	47,50%							5,00%						
11.01.413.00	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				104,31	104,31							10,98						
11.01.413.05	LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	2.607,60	47,50%	47,50%							13,78						
11.01.413.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	15,00	313,05	47,50%	47,50%							16,65						
11.01.413.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO, 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	40,00	1.282,80	47,50%	47,50%							64,14						
11.01.413.16	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	470,80	47,50%	47,50%							23,54						
11.01.413.41	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, LUZ DO DIA	UN	420,00	3.048,20	47,50%	47,50%							182,48						
11.01.413.42	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR EMBUTIDO DE 20W	UN	80,00	1.083,20	47,50%	47,50%							54,15						
11.01.413.46	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA	UN	180,00	4.752,00	47,50%	47,50%							237,65						
11.01.420.00	TELEFONIA																		
11.01.424.00	CABOS E FIOS																		
11.01.424.06	CABO LÓGICA CAT. 6	M	2.650,00	8.400,50	47,50%	47,50%							5,00%						
11.01.424.07	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2018	UN	80,00	2.284,40	47,50%	47,50%							420,03						
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO				1.089,84	1.089,84							114,72						
11.01.431.00	SISTEMA DE ALARME																		
11.01.620.17	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES DE PAREDES E SPRINKLERS	UN	1,00	8.780,00	50,00%	50,00%													
11.01.620.18	MANUTENÇÃO E REGULAÇÃO DE PRESSOSTATOS COMANDO DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DE TODOS OS BLOCOS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE TEMPERATURA)	UN	1,00	12.500,00	50,00%	50,00%													
11.01.620.19	MANUTENÇÃO E REGULAÇÃO DE PRESSOSTATOS, TANQUES DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DA REDE, TESTE GERAL DO QUADRO DE COMANDO COM AS BOMBAS	UN	1,00	5.623,00	50,00%	50,00%													
11.01.620.20	SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME, ATUALIZAÇÃO DO FILME DA CENTRAL, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMAÇÃO DOS SISTEMAS E STARTUPS DE DETECTORES, ACONDORES, SIRENES, COMISSIONAMENTO DO SISTEMA EM CURSO DE MANUSEIO, ENDEREÇAMENTO DE TODOS OS PONTOS COMPATIVELIS COM LOCAL, IDENTIFICAÇÃO NO PAINEL CENTRAL DOS ALARMES, COMUGAR O PONTO A CADA DISPOSITIVO	UN	1,00	48.520,00	50,00%	50,00%													
11.01.620.22	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO	MES	6,00	56.160,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%						
11.01.433.00	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA												16,00%						
11.01.433.01	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	20,00	687,80	47,50%	47,50%							5,00%						
11.01.493.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				328,71	328,71							34,38						
11.01.493.01	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS NOBREAKS - baterias novas, revisado o funcionamento dos equipamentos	UN	1,00	78.690,00	50,00%	50,00%													
11.01.493.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS NOBREAKS	MES	6,00	161.182,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%						



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

BASE: FEVEREIRO/2020
MÃO DESONERADO
LEIS SOCIAIS: 114,00%
HONORÁRIA: 114,00%
MENSAL: 73,40%

Isaque Avelino
Subsecretário
Matricula: 16.044
SINFRA/SEF

MEMORIAL DESCRITIVO

ORGA: RESERVA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS		MESES							
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MES	MANUTENÇÃO 2º MES	MANUTENÇÃO 3º MES	MANUTENÇÃO 4º MES	MANUTENÇÃO 5º MES	MANUTENÇÃO 6º MES	MANUTENÇÃO 7º MES	MANUTENÇÃO 8º MES
11.01.493.03	INSTALAÇÃO DE SWITCHES DE 48 PORTAS	UN	4,00	17.000,00	50,00%	50,00%								
11.01.493.04	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA	UN	425,00	7.550,00	50,00%	50,00%								
11.01.500.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES				3.825,00	3.825,00								
11.01.501.00	ELEVADORES													
11.01.501.01	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REVISÃO E VERIFICAÇÃO DE PARADAS, REVISÃO DE PESSAGEM DIRETA, VERIFICAÇÃO DE CABOS E RODANHAS, VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE DO ELEVADOR, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS, LUBRIFICAÇÃO DO MAQUINÁRIO, REVISÃO DO POÇO DOS ELEVADORES, MOTORES, POLIAS, ENGRENAGEM, BOTONEIRAS E LÂMPADAS	UN	1,00	298.530,00	50,00%	50,00%								
11.01.501.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	MÊS	6,00	33.120,00	148.265,00	148.265,00	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
01.01.502.00	AR CONDICIONADO CENTRAL						5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.299,20	5.299,20	5.299,20	5.299,20
01.01.502.01	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CENTRAL - compressores, filtros, colocação de gás, verificação de vazamentos	UN	1,00	222.360,00	50,00%	50,00%								
01.01.502.02	MANUTENÇÃO MENSAL, AR CONDICIONADO CENTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	MÊS	6,00	373.830,00	111.176,00	111.176,00	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
01.01.503.00	GERADOR DE EMERGENCIA						63.551,10	63.551,10	63.551,10	63.551,10	63.551,10	59.812,80	59.812,80	59.812,80
01.01.503.01	MANUTENÇÃO DO GERADOR DE EMERGENCIA - REVISÃO GERAL DO GERADOR	UN	1,00	138.650,00	50,00%	50,00%								
01.01.503.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS GERADORES DE EMERGENCIA	MÊS	6,00	83.000,00	69.325,00	69.325,00	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
11.01.600.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
11.01.620.01	EXTINTOR DE CO2 5KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	7.188,76	50,00%	50,00%								
11.01.620.02	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	35,00	5.978,70	3.584,88	3.584,88								
11.01.620.08	CONJUNTO DE BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO	UN	10,00	12.650,00	2.989,35	2.989,35								
11.01.620.09	DOBRADIÇAS DE MOLTA PARA PORTA CORTA FOGO	UN	52,00	4.279,60	6.325,00	6.325,00								
11.01.620.10	SUPORTE DE CHÃO MODELO TRIPÉ EM CHAPA DE AÇO PARA EXTINTOR	UN	8,00	444,80	2.139,80	2.139,80								
11.01.620.11	FECHADURA PARA BARRA ANTIPÂNICO	UN	15,00	8.385,00	50,00%	50,00%								
11.01.620.13	VIDROS LEGENDADOS PARA HIDRANTES	UN	1,00	25,74	2.692,50	2.692,50								
11.01.620.14	PLACAS DE SINALIZAÇÃO NORMALIZADAS E CERTIFICADAS PARA SINALIZAÇÃO DIVERSAS	UN	12,00	153,60	12,87	12,87								
11.01.620.15	REVISÃO, MANUTENÇÃO E REGULAGEM EM PORTAS CORTAS FOGO	UN	32,00	4.000,00	79,80	79,80								
11.01.620.16	REVISÃO, MANUTENÇÃO E EM BARRAS ANTIPÂNICO	UN	32,00	3.840,00	2.000,00	2.000,00								
11.01.620.21	TESTE EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, REMOÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS CAIXAS DE INCÊNDIO E SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES, CONFORME NORMAS TÉCNICAS - CBMF 006/2000	UN	28,00	2.380,00	1.920,00	1.920,00								
11.01.900.00	CONDENSADO													
11.01.900.08	SUBSTITUIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE R-22 BOTOILHO DE 13KG	UN	56,00	27.043,52	50,00%	50,00%								



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

BASE: FEVEREIRO/2020
NÃO DESONERADO
LEIS SOCIAIS - HORISTA

114,00%

114,00%

114,00%

114,00%

114,00%

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

DATA: 14/05/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS										MÊSES					
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	MANUTENÇÃO 7º MÊS	MANUTENÇÃO 8º MÊS						
11.01.900.14	HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN	89,00	11.125,00	47,50%	47,50%														
					5.284,38	5.284,38														5,00%
11.01.900.15	CAPACITORES 40 UF + DU - 5% - MÁQUINA DE 16000 BTU	UN	20,00	2.240,00	50,00%	50,00%														
					1.120,00	1.120,00														
11.01.900.16	CAPACITORES 55 UF + DU - 5% - MÁQUINA DE 24000 BTU	UN	15,00	2.025,00	50,00%	50,00%														
					1.012,50	1.012,50														
11.01.900.17	MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT - 89 UNIDADES POR MÊS	MÊS	8,00	81.600,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%						
							13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00						
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS																			
11.01.1000.02	TUBO DE COBRE INCLUSIVE CONEXÕES Ø 15 MM - 1/2"	M	300,00	8.920,00	50,00%	50,00%														
					4.460,00	4.460,00														
11.01.1000.07	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRIMÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	150,00	5.475,00	50,00%	50,00%														
					2.737,50	2.737,50														
11.01.1000.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSCUEIRA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	120,00	2.083,20	50,00%	50,00%														
					1.041,60	1.041,60														
11.01.1000.14	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25 MM - 1"	M	80,00	8.990,40	50,00%	50,00%														
					2.996,80	2.996,80														
11.01.1000.22	VALVULA ESPERA PARA GÁS, T", PARA OXIGÊNIO	UN	12,00	1.653,09	50,00%	50,00%														
					826,50	826,50														
11.01.1000.23	VALVULA ESPERA PARA GÁS, T", PARA AR COMPRIMIDO	UN	9,00	1.270,56	50,00%	50,00%														
					635,49	635,49														
11.01.1000.24	VALVULA ESPERA PARA GÁS, T", VÁCUO	UN	10,00	1.412,20	50,00%	50,00%														
					706,10	706,10														
11.01.1000.25	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	13.710,60	50,00%	50,00%														
					6.855,30	6.855,30														
11.01.1000.27	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA VÁCUO	UN	90,00	6.275,00	50,00%	50,00%														
					3.138,00	3.138,00														
11.01.1000.28	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	7.399,80	50,00%	50,00%														
					3.699,90	3.699,90														
11.01.1000.39	BLOCO CENTRAL DE OXIGÊNIO 2 ESTÁGIOS COM 12 RAMAIS	UN	1,00	19.520,00	50,00%	50,00%														
					9.760,00	9.760,00														
11.01.1000.40	FILTRO	UN	1,00	13.286,00	50,00%	50,00%														
					6.623,00	6.623,00														
11.01.1000.41	VALVULA DE RETENÇÃO PARA VÁCUO	UN	80,00	121.612,80	50,00%	50,00%														
					60.806,40	60.806,40														
11.01.1000.42	VALVULA DE RETENÇÃO PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	74.223,60	50,00%	50,00%														
					37.111,80	37.111,80														
11.01.1000.43	VALVULA DE RETENÇÃO PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	31.255,20	50,00%	50,00%														
					15.627,60	15.627,60														
11.01.1000.44	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE ESTANQUEIDADES, SOLDAS, MANGUEIRAS DE COMPRESSOR, ÓLEO DO COMPRESSOR	UN	1,00	35.200,00	50,00%	50,00%														
					17.600,00	17.600,00														
11.01.1000.45	MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE GASES - LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, TESTES, ÓLEO DO COMPRESSOR	MÊS	6,00	171.000,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%						
							29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00						
	DESEMBOLSO MENSAL			4.791.878,88	1.731.971,19	1.731.971,19	214.004,34	214.004,34	214.004,34	214.004,34	214.004,34	214.004,34	214.004,34	214.004,34						
	BDI - 20,34%			1.003.419,46	390.590,77	390.590,77	44.812,81	44.812,81	44.812,81	44.812,81	44.812,81	44.812,81	44.812,81	44.812,81						
	DESEMBOLSO ACUMULADO			8.795.298,43	2.082.561,96	2.082.561,96	258.816,05	258.816,05	258.816,05	258.816,05	258.816,05	258.816,05	258.816,05	258.816,05						
	SOMA DO DESEMBOLSO ACUMULADO				2.082.561,96	2.082.561,96	4.423.920,77	4.423.920,77	4.423.920,77	4.423.920,77	4.423.920,77	4.423.920,77	4.423.920,77	4.423.920,77						
	PERCENTAGEM MENSAL				35,94%	35,94%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%						
	PERCENTAGEM ACUMULADO				35,94%	71,87%	75,34%	80,80%	85,27%	89,73%	94,09%	98,33%	100,00%	100,00%						

MECANTO - Construções e Com. Ltda

Prof. Luiz Delgado Assad

Eng. Civil CREA 199200-D-F

Isaque

Subs. Matrícula: 51

SINFRAS/51

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATORIO FOTOGRAFICO



Execução da pintura da ala de internação

[Handwritten signature]



Execução da pintura corredores ala internação



ISOLAMENTO COM DRYWALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE – PAVIMENTO TÉRREO



ISOLAMENTO COM DRYWALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE – PAVIMENTO TÉRREO



ISOLAMENTO COM DRYWALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE – PAVIMENTO TÉRREO

Handwritten signature in blue ink.



RECUPERAÇÃO FORRO DE GESSO CORREDORES PAVIMENTO SUPERIOR


Isaia Luiz
MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINTRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

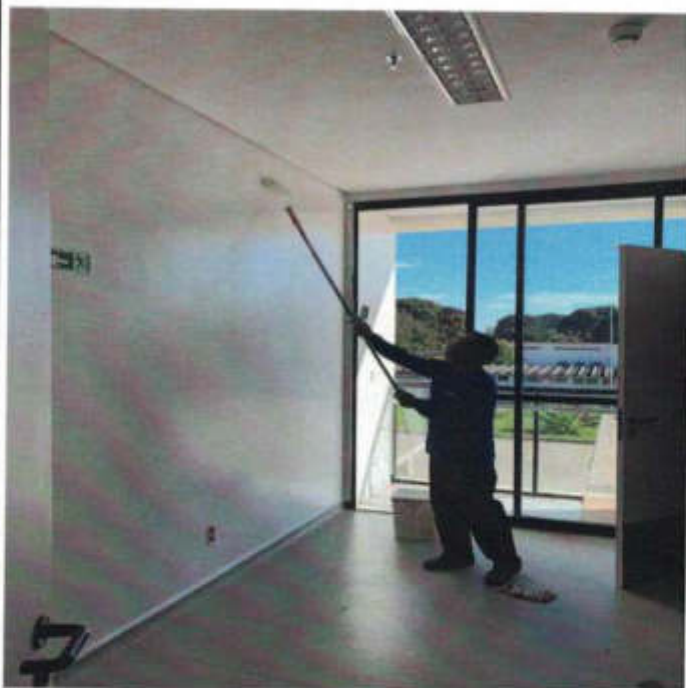

Execução da pintura da ala de internação



Execução da pintura corredores ala internação





REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS



VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO



Análise e verificação do sistema de incêndio

[Handwritten signature]



VERIFICAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS


MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF


Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINPRO/SIS-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATORIO FOTOGRAFICO



Execução da pintura da circulação



Execução da pintura da Corredor – Rota de Fuga






Execução da pintura da Circulação – Banheiros, área de descanso



Execução da pintura da Área dos elevadores e sala de apoio

[Handwritten signature]

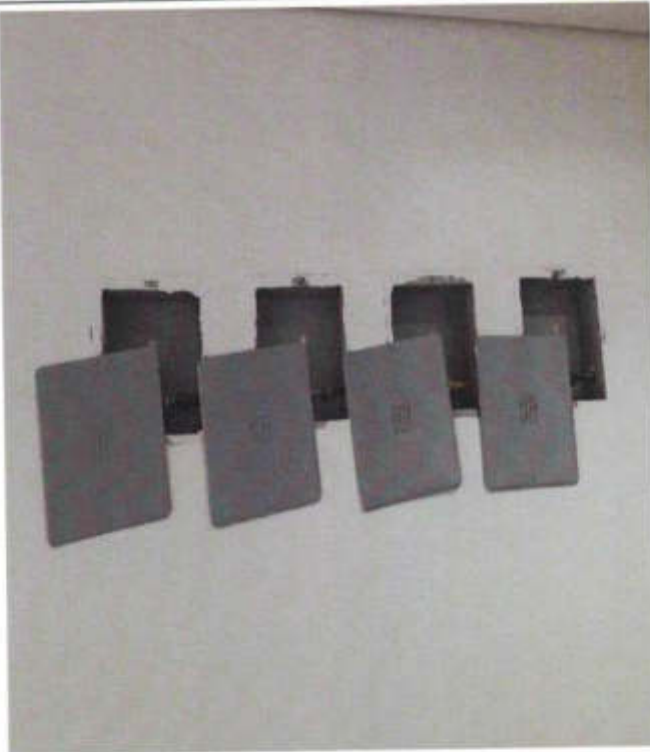

Continuação da verificação e testes do sistema de gases medicinais – substituição de válvulas na ala da Internação



Sistema de gases medicinais – substituição de válvulas na ala da Internação

[Handwritten signature]
MEJATO - Construções e Com. Ltda
Rafael Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF

[Handwritten signature]
Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINPRO/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Execução da pintura em andamento pavimento superior





Execução da pintura em andamento pavimento superior




RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO – PAVIMENTO SUPERIOR



ISOLAMENTO COM DRAYWALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE
– PAIMENTO TÉRREO


MEVATO, Construções e Com. Ltda
Manoel Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF


Isaquias Albuquerque
Subsecretário
Matrícula 1594831-6
SINVERA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Pintura do pavimento superior – Finalizando



Execução dos serviços de marcenaria – Bate Maca



SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS



**ISOLAMENTO COM DRYWALL VEDADAS PARA UTILIZAÇÃO DA ÁREA RESERVADA DA SECRETARIA DE SAÚDE
– PAVIMENTO TÉRREO**





VERIFICAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES

[Handwritten signature]
 MEIATO - Construções e Com. Ltda
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

[Handwritten signature]
 Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula 1694631-0
 SINFRAS/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Pintura do pavimento superior – Finalizando



Execução do isolamento pavimento superior concluído e início do emassamento e pintura






INICIO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ALAMBRADROS

[Handwritten signature]



VERIFICAÇÃO E TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES

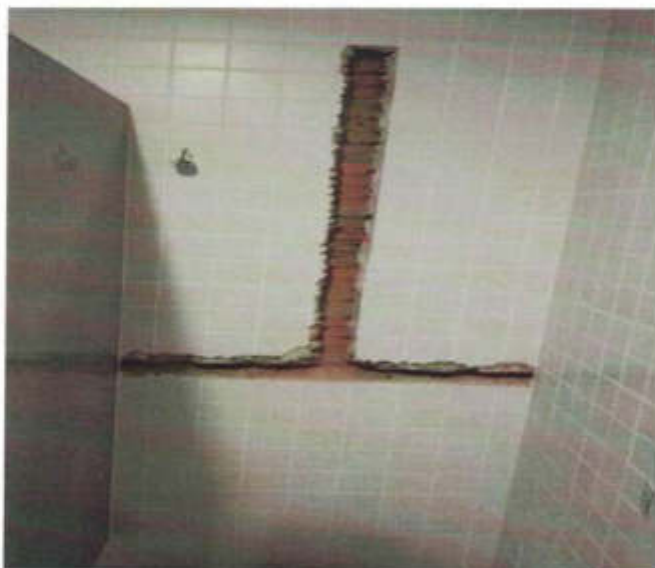

INICIO DE CORTE E ABERTURA DE RASGO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS CHUVEIROS SOLICITADOS NOS BANHEIROS – PAVIMENTO SUPERIOR

[Handwritten signature]



INICIO DE CORTE E ABERTURA DE RASGO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DOS CHUVEIROS SOLICITADOS NOS BANHEIROS – PAVIMENTO SUPERIOR

[Handwritten Signature]
 MEYATO - Construções e Com. Ltda
 André Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19929D-DF

[Handwritten Signature]
 Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula 1694631-8
 SINFRA/SES-DF


OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



REVISÃO E FINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT – PAVIMENTO SUPERIOR

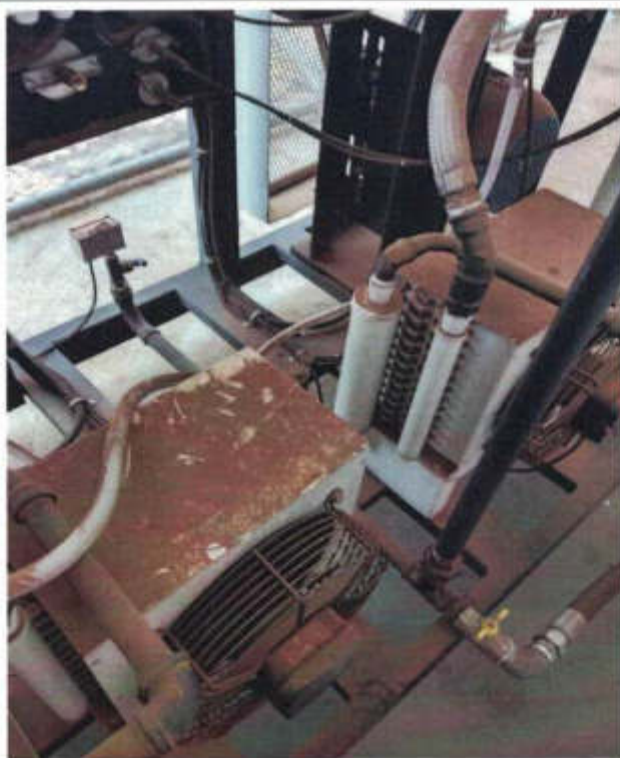

Execução de limpeza e revisão dos sistemas de gases medicinais

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line.



IDENTIFICAÇÃO DOS ABRIGOS DE GASES MEDICINAIS




CONTINUAÇÃO DA CONFEÇÃO DO ALAMBRADO – DIVISÃO COM A ÁREA DE POLICIA MILITAR

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.



RETIRADA DAS MANGUEIRAS PARA TESTE DE RESISTÊNCIA

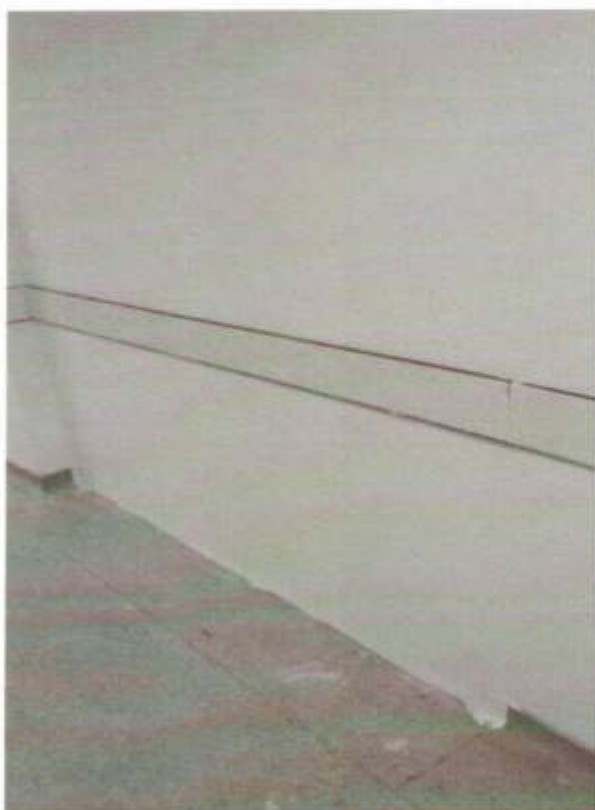

SERVIÇOS DE MARCENARIA – RECUPERAÇÃO DAS FORMICAS DO BATE MACA

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 369.4631-6
 SINFRA/SES-DF

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 369.4631-6
 SINFRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DA PINTURA DO ALAMBRADO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA – SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal line.



INICIO DA RECUPERAÇÃO DO PISO VINILICO



FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DAS ÁREAS DA ÁREA DA SECRETARIA DE SAUDE E DA POLICIA MILITAR

[Handwritten signature]
 MEVATO - Construções e Com. Ltda
 André Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

[Handwritten signature]
 Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694631-6
 SINFRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DA CONFECAÇÃO DO ALAMBRADO – ISOLAMENTO DA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE SAÚDE





EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E FECHAMENTO DA ÁREA SOLICITADA PELO SR. THIAGO - IGEST

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



INICIO DA RECUPERAÇÃO DO PISO VINILICO – PAVIMENTO SUPERIOR



SUBSTITUIÇÃO DOS EXTINTORES DE INDÊNCIO DA ÁREA PERTINENTE A SECRETARIA DE SAÚDE



REVISÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS CORTA FOGO E RECOLOCAÇÃO DAS MANGEIRAS DE INCÊNDIO



[Handwritten signature]



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DE ESGOTO NOS BANHEIROS SUPERIORES


MEIRITO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 199259-D-DF


Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula 1684631-6
SINFRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DA CONFEÇÃO DO ALAMBRADO – ÁREA DO ABRIGO DE RESÍDUOS



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FECHAMENTO DA ÁREA SOLICITADA PELO SR. THIAGO – IGES-DF





SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E PINTURA



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E DE ESGOTO NOS BANHEIROS SUPERIORES

[Handwritten signature]
 MEVATO - Construções e Com. Ltda
 Ruyton Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

[Handwritten signature]
 Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula 1694631-6
 SINPRM/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DA CONFEÇÃO DO ALAMBRADO – ÁREA DO ABRIGO DE RESÍDUOS



INÍCIO DA TERRAPLENAGEM DO ABRIGO DE RESÍDUOS





INÍCIO DA TERRAPLENAGEM DO ESTACIONAMENTO NA ÁREA EXTERNA



PINTURA PAVIMENTO TÉRREO – EM ANDAMENTO



SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELETRICA DOS CHUVEIROS DOS BANHEIROS SUPERIORES



CONCLUSÃO DA REVISÃO DAS PORTAS CORTA FOGO


MEVATO - Construções e Com. Ltda
Manoel Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF


Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694831-6
SINFRA/SES-DF

	M	T	N		M	T	N
Vigilantes				Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores	4	4	
Engenheiro	4	4		Bombeiro Hidráulico	3	3	
Técnico de Segurança	1	1		Montadores			
Auxiliar de Engenharia				Serralheiro	4	4	
Eletricista	2	2		Marceneiro	1	1	
Encarregado	1	1		Pintor	6	6	
Ajudante	4	4		Almoxarife	1	1	



OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATORIO FOTOGRAFICO



EXECUÇÃO DA CONFEÇÃO DO ALAMBRADO – ÁREA LIMITE ENTRE SECRETARIA DE SAUDE E POLICIA MILITAR



CONTINUAÇÃO DA TERRAPLENAGEM DO ABRIGO DE RESÍDUOS



CONTINUAÇÃO DA TERRAPLENAGEM DO ESTACIONAMENTO NA ÁREA EXTERNA




PINTURA PAVIMENTO TÉRREO – EM ANDAMENTO

Handwritten signature in blue ink.




RECUPERAÇÃO DO PISO EM PAVIFLEX PAVIMENTO TÉRREO

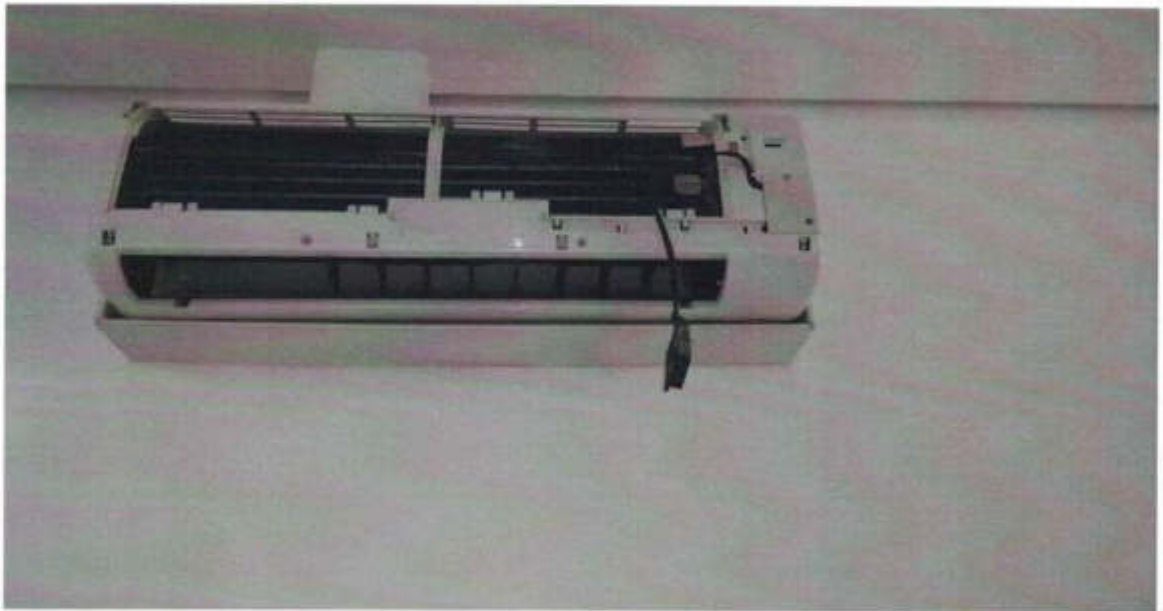



**INÍCIO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO
TÉRREO**


MEYRITO - Construções e Com. Ltda
Ondro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 199290-D-DF


Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF

Encarregado		1	1	Pintor		6	6
Ajudante		4	4	Almoxarife		1	1



OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



SERVIÇOS DE REVISÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E CONFEÇÃO DE PORTA DE ENTRADA



CONTINUAÇÃO DA TERRAPLENAGEM DO ABRIGO DE RESÍDUOS



REVISÃO DO GRUPO GERADOR

[Handwritten signature]



PINTURA PAVIMENTO TÉRREO – EM ANDAMENTO

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.



RECUPERAÇÃO DO PISO EM PAVIFLEX PAVIMENTO TÉRREO



**INÍCIO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO
TÉRREO**





REVISÃO DOS NOBREAK'S



REVISÃO DA CENTRAL DE ALARME E SISTEMA DE BOMBAS DOS SISTEMA DE SPLINKRES

[Handwritten signature]
 MEURTO, Construções e Com. Ltda
 André Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

[Handwritten signature]
 Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694631-6
 SINRA/SIS-DF


Encarregado		1	1	Pintor		4	4
Ajudante		4	4	Almoxarife		1	1



OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATORIO FOTOGRAFICO

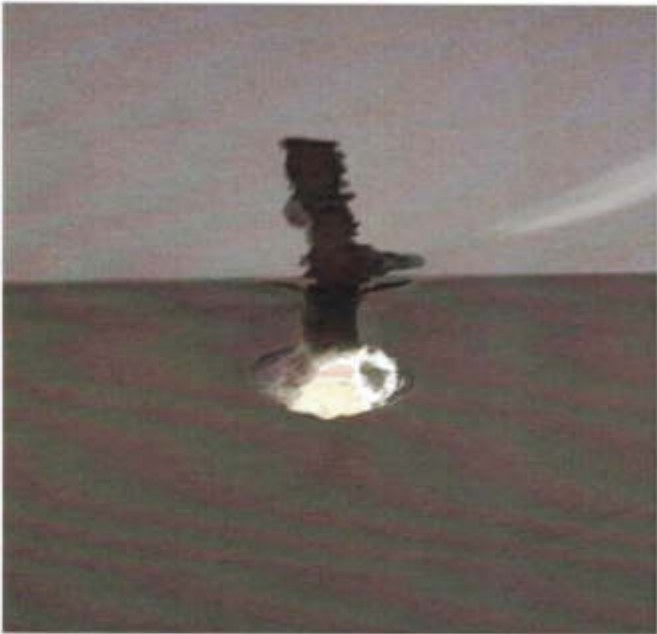

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE REDE HIDRÁULICA E ESGOTO PARA DML – 08 PONTOS PAVIMENTOS SUPERIOR



CONTINUAÇÃO DAS ESCAVAÇÕES DAS FUNDAÇÕES E CINTAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS



FECHAMENTO COM BLINDEX NO PAVIMENTO SUPERIOR



SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM ESTACIONAMENTO EXTERNO - EM ANDAMENTO



**INÍCIO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO
TÉRREO**

[Signature]
 MELATO, Construções e Com. Ltda
 Osório Luiz Delgado Assis
 Eng. Civil CREA 199200-D-DF

[Signature]
 Isaquiel Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694831-6
 SINFRA/SES-DF


Encarregado		1	1	Pintor		2	2	
Ajudante		4	4	Almoxarife		1	1	



OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATORIO FOTOGRAFICO

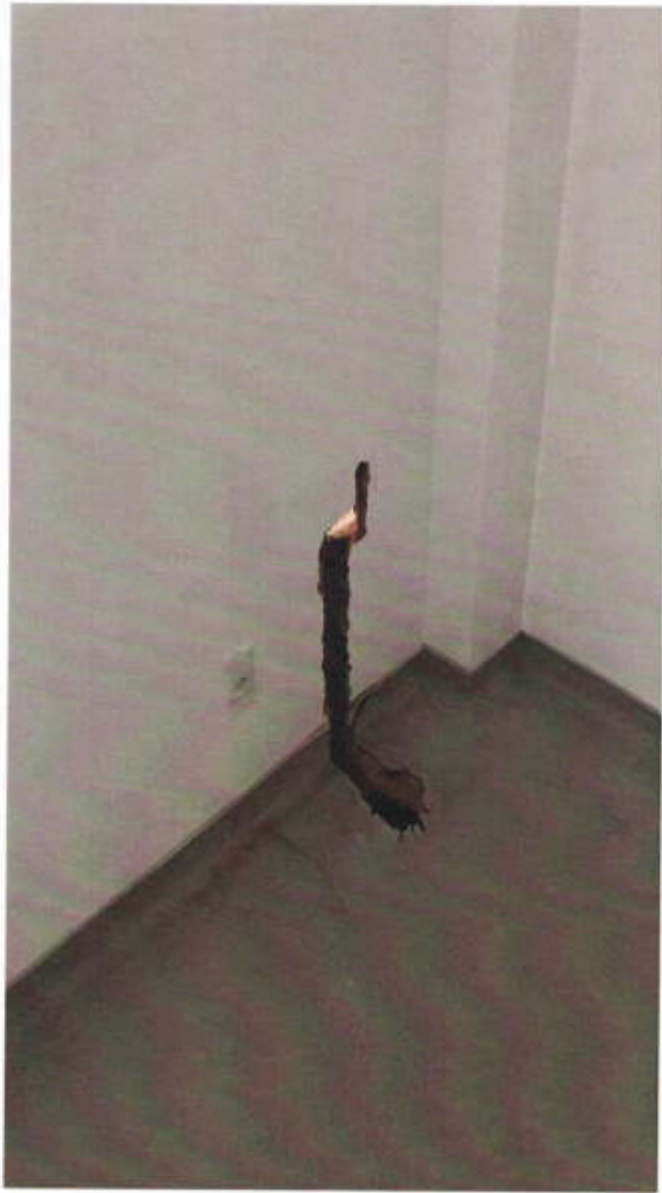

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE REDE HIDRÁULICA E ESGOTO PARA DML – 08 PONTOS PAVIMENTOS SUPERIOR




CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES DO ABRIGO DE RESÍDUOS E EXECUÇÃO DAS FORMAS DAS CINTAS – CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' and a horizontal line.



CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTACIONAMENTO EXTERNO – CHUVAS ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

Handwritten signature in blue ink.

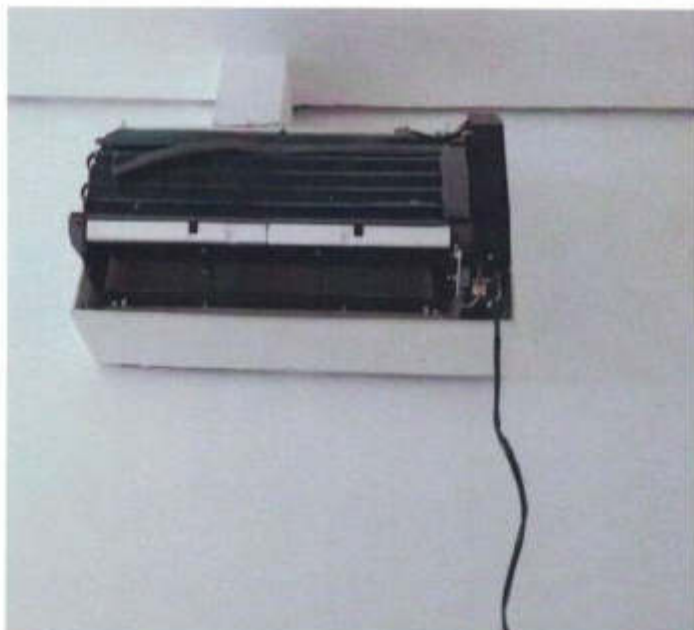

**INÍCIO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO
TÉRREO**



**CONFEÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA ENTRADA DO HOSPITAL – CHUVAS
ATRAPALHARAM O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS**

Isaque Albuquerque
 MEIATO, Construções e Com. Ltda.
 Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1094631-6
 SM/FR/SSES-DF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.611.343/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:47:50 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **40B2.7E02.232A.3588**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.611.343/0001-92

Certidão nº: 192922153/2019

Expedição: 26/12/2019, às 16:21:07

Validade: 22/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.611.343/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

CERTIDÃO Nº: 150026500302020

NOME: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

CIDADE: SCIA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

CF/DF: 0732939900133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 11 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 12/05/2020 às 10:51:07 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.611.343/0001-92

Razão Social: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Endereço: ST SCIA QUADRA 14 CONJ 11 LOTE 05 / ZONA INDUSTRIAL / BRASÍLIA /
DF / 71250-155

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032101192230905765

Informação obtida em 14/04/2020 15:37:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Memorando Nº 184/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 22 de maio de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES

A/C: Executores (as) do **CONTRATO Nº 075/2020- MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, PMDF - COVID-19**

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatório** e documentação pertinente à execução do serviço referente à **Nota Fiscal nº 465 (40620883)**, emitida pela **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em virtude dos serviços do objeto do **CONTRATO Nº 075/2020 – SES/DF**.

Fica estabelecido o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para retorno dos autos à esta Unidade Gestora para prosseguimento da instrução processual de pagamento, conforme regramento presente na Portaria nº 170/2018, publicada DODF nº 71 de 13/04/2018, abaixo transcrito:

Art. 20. Ao executor ou comissão executora compete:

XI - apresentar relatório analítico e notas fiscais atestadas, à Unidade Gestora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da informação sobre o faturamento do serviço ou a entrega do bem, ou sempre que solicitado, utilizando o relatório circunstanciado dos inspetores técnicos, se houver, para seu subsídio;

Ressalto ainda, que conforme dispõe Cláusula Sétima do Contrato, item 7.1 “O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, **liquidada até 30 (trinta) dias corridos de sua apresentação**, devidamente atestada pelo Executor do Contrato”.

Em seguida, os autos deverão ser remetidos à **GACI/DACC/SUAG/SES**, para continuidade do trâmite para pagamento.

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 25/05/2020, às 12:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **40621609** código CRC= **CD7633DC**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 166/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 25 de maio de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 465 (40620883) foram prestados e aceitos, realizados no período de 04.05.2020 a 13.05.2020.

Isaque Costa de Albuquerque

Subsecretário SINFRA/SES

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE - Matr.1694631-6, Subsecretário(a) de Infraestrutura em Saúde**, em 25/05/2020, às 15:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **40673566** código CRC= **4BEC71E3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 40673566



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Relatório SEI-GDF n.º 173/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 25 de maio de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 465

Obra: Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existentes, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19.

Empresa: Mevato Construções e Comércio Ltda

Contrato: 075/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Serviços preliminares;
- Demolição convencional;
- Instalação de forro Tipo Naval;
- Arquitetura e elementos de urbanismo (estacionamento externo, abrigo de resíduos);
- Fundações e estruturas;
- Instalações hidráulicas e sanitárias;
- Instalações elétricas;
- Detecção e alarmes de incêndio;
- Sistema de cabeamento estruturado;
- Instalações mecânicas e de utilidades;
- Instalações de prevenção e combate a incêndio;
- Gases medicinais.

Período: 04/05/2020 a 13/05/2020. - 1ª medição

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

Isaque Costa de Albuquerque

Subsecretário SINFRA/SES

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE - Matr.1694631-6, Subsecretário(a) de Infraestrutura em Saúde**, em 25/05/2020, às 14:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **40673594** código CRC= **AE6BAF23**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 40673594



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde

Despacho - SES/SINFRA

Brasília-DF, 25 de maio de 2020.

À SES/SUAG/DACC/GACI,
Senhor Gerente,

Retornamos os autos a essa Gerência para prosseguimento do feito, conforme solicitado, após a inclusão dos documentos SEI de números 40673566 e 40673594.

Atenciosamente,

ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE

Subsecretário de Infraestrutura em Saúde



Documento assinado eletronicamente por **ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE - Matr.1694631-6, Subsecretário(a) de Infraestrutura em Saúde**, em 25/05/2020, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **40689458** código CRC= **B28482AF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 40689458

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 25 de maio de 2020.

PARA: USCI/CONT**ASSUNTO: AVALIAR PORTARIA Nº 037/2019**

Senhor Chefe,

Encaminhamos os autos solicitando análise prévia pela unidade de controle interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, da nota fiscal abaixo relacionada:

Unidade Orçamentária: 170101				UG / GESTÃO: 17901		
Credor: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA				CNPJ: 00.611.343/0001-92		
Valor da Fatura:						
Processo do Contrato:	Contrato Nº e/ou Ajustes:	Contrato SIGGO:	Fatura Nº:	Fonte de Recursos:	Mês de Referência:	
04016-00030034/2020-62	075/2020	040956	Nº 465 40620883	fonte: 10000000 Nota de Empenho 2020NE03158 40401753	04/05/2020 a 13/05/2020	
Valor Bruto da Fatura:		R\$2.082.551,96	R\$2.082.551,96 (dois milhões, oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)			
Descontos:	Glosa da Fatura:	0,00				
	Multa Contratual:	N/A				
	Multa Atraso:	N/A				
Valor Líquido da Fatura:		R\$2.082.551,96	(dois milhões, oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)			
Descrição do Objeto:		Contratação de empresa para a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.				
Análise da Instrução Processual						
Legenda: S – SIM; N – NÃO; N/A – Não Aplicável.						
Descrição			S	N	Doc. SEI	Obs. / Validade
1. Termo de Ajuste e aditivo firmado, de acordo com os art. 60, 61 e 62 da Lei 8.666/93.			x		39388890	Contrato inicial
2. Nota de Empenho, de acordo com o art. 47, 48, 49 e 50 do Dec. 32.598/2010.			x		40401753	
3. Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo titular responsável do acompanhamento contratual ou autoridade			v		40620883	Atesto (40673566)

competente quando do recebimento de obras, serviços, equipamentos ou quaisquer outros.	X		40673594	Atestado (40673594)
4. Ato de designação do(s) Executor(es) e/ou Comissão para acompanhamento dos contratos.	X		-	NÃO LOCALIZADO
5. Relatório de acompanhamento da execução contratual.	X		40673594	N/A
6. Em caso de material de consumo e material permanente, consta a Nota de Recebimento, de acordo com Inc. II, art. 73, da Lei 8.666/93.		X	-	N/A
7. Em caso de Obras e Serviços, consta atestado de recebimento definitivo ou provisório, de acordo com o Inc. I, art. 73, da Lei 8.666.93.		X	-	

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 25/05/2020, às 18:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **40710313** código CRC= **EC9EE54E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 40710313



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Controladoria Setorial da Saúde
Unidade Setorial de Controle Interno

Nota Técnica N.º 383/2020 - SES/CONT/USCI

Brasília-DF, 26 de maio de 2020.

PROCESSO Nº 00060-00212479/2020-63

ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA USCI/SES-DF PORTARIA CGDF Nºs 37 e 73/2019 – EXERCÍCIO EM CURSO

FORNECEDOR: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.611.343/0001-92

Considerando as competências e funções constitucionais do Controle Interno, na Lei nº 4.488/2009 e, mais especificamente, no art. 7º da Portaria CGDF nº 37/2019, destaca-se que, **no presente momento da instrução processual**, a análise emitida pela Unidade de Controle Interno desta Secretaria de Estado de Saúde do DF é **meramente opinativa e orientativa**, não se imiscuindo na análise de conveniência, oportunidade ou mérito do ato administrativo e na discricionariedade do gestor público, tampouco afastando a necessidade da manifestação da unidade jurídica do Órgão quando a legislação assim o exigir.

Além disso, a presente análise restringe-se a atender os requisitos previstos no *checklist* mínimo constante da Circular SEI nº 02/2019 (19076940) da Controladoria Setorial de Saúde, considerando que os demais pontos são de competência de outras unidades da SES-DF já analisados no processo normal de acompanhamento. Também se exclui dessa análise o procedimento realizado à época da contratação, haja vista restrições de tempo e recursos para tal. Outros pontos que fogem da análise ora realizada podem ser submetidos ao procedimento amplo de auditoria de competência dessa Unidade Setorial de Controle Interno, caso seja o entendimento das autoridades superiores competentes.

Assim, os autos do processo acima descrito vieram a esta Unidade Setorial de Controle Interno-USCI/CONT/SES-DF por força do disposto na Portaria nºs 37 e 73/2019 de 21/01/2019 (DODF nº 14, pag. 6) e 28/02/2019 (DODF nº 42, pag. 18) respectivamente.

I – CONSIDERAÇÕES

Trata-se o presente processo da contratação de empresa para a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do **contrato nº 75/2020 - SES/DF**, celebrado com a **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

O processo ora analisado refere-se ao pagamento da **nota fiscal nº 465/2020** em favor da **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, deriva do contrato supracitado, conforme informações constantes no Despacho SEI-GDF SES/SUAG/DACC/GACI (40710313).

A Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura encaminhou Despacho supracitado no qual consta informação a respeito do pagamento que se pretende fazer referente a

nota fiscal nº 465/2020 da competência de **maio de 2020** (período de execução 04/05/2020 a 13/05/2020) **referente a 1ª medição (35,94%)** no valor de **R\$ 2.082.551,96** (dois milhões, oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos).

II – ANÁLISE

Anexo segue análise dos autos do Processo conforme requisitos constantes do *checklist* (40710313).

III – RECOMENDAÇÕES

Por ocasião da liquidação e pagamento, quando for o caso, **observar**:

- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas;
- **Tomar ciência** do Decreto nº 40.447, de 06 de fevereiro de 2020, que determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal deverão efetuar o cadastramento de todos os contratos vigentes no Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos/DF), de acordo com o § 2º do Art. 4º, in verbis:

(...)

Art. 4º-A O Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos/DF) é de uso obrigatório para órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, bem como para a Defensoria Pública do Distrito Federal, que utilizam o Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGG)

(...)

§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal deverão cadastrar seus contratos administrativos, bem como os respectivos termos aditivos, apostilamentos e termos de rescisão, no e-Contratos/DF até 28 de fevereiro de 2020." (NR)

IV – CONCLUSÃO

Assim, restituímos o presente processo para prosseguimento da instrução com vistas a possível liquidação e pagamento da obrigação contratual ora tratada na presente Nota Técnica, cujas recomendações deverão ser observadas até o final do trâmite.

Por fim, nos termos do Decreto nº 32.598/2010 e do Decreto nº 38.017/2017, compete única e exclusivamente aos setores responsáveis pela liquidação e pagamento de despesa, à luz dos elementos constantes dos autos, a verificação da viabilidade de liquidação e pagamento de despesas.

Sendo assim, esta Nota Técnica não substitui nenhuma das análises necessárias para a liquidação do pagamento.

Atenciosamente,

Leonardo Fernandes Alves Batista

Auditor de Controle Interno

De acordo,

Encaminhe-se à SES/SUAG/DACC/GACI,

Ricardo Rodrigues Lage

Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO FERNANDES ALVES BATISTA - Matr. 0188896-X, Auditor(a) de Controle Interno**, em 26/05/2020, às 13:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RODRIGUES LAGE - Matr.1691088-5, Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno**, em 26/05/2020, às 16:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **40752378** código CRC= **E4006825**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Asa Norte - Bloco B - Bairro Plano Piloto - CEP 70086-900 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 40752378



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios
Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Relatório SEI-GDF n.º 265/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 26 de maio de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

Trata o presente do Contrato nº 075/2020-SES/DF, celebrado entre a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, para a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **15/05/2020**, bem como procedeu à análise administrativa da documentação apresentada pela empresa contratada, em atendimento ao inciso VII, do art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, de 11 de abril de 2018, oportunidade em que fora verificada que estas encontram-se em conformidade com as cláusulas contratuais.

Nessa linha, houve a autuação do presente processo, bem como o encaminhamento deste ao respectivo(a) executor ou comissão executora ou área técnica para conhecimento e providências quanto ao atesto e à elaboração de relatório analítico ou sintético. Por conseguinte, o(a) executor ou comissão executora ou área técnica retornou o presente processo, em **19/05/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: **00.611.343/0001-92**

Nº CONTRATO SES: **075/2020-SES/DF**

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): **40956**

VIGÊNCIA CONTRATUAL: **29/04/2020 à 24/10/2020**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 5.795.298,43 (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)**

OBJETO CONTRATUAL: Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: **R\$ 2.082.551,96 (dois milhões, oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)**

SERVIÇOS										NOTA DE EMPENHO
COMPET./NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	OSS Nº	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
04/05/2020 a 13/05/2020	465 (40620883)	Atesto 166 (40673566)	Relatório 173 (40673594)	06/2020 - DEA (40285850)	nº 038/2020 (40620886)	nº 001/2020 (40620884)	R\$ 2.082.551,96	R\$	R\$ 2.082.551,96	2020NE04198 (40401753)
TOTAL							R\$ 2.082.551,96	R\$	R\$ 2.082.551,96	Página 2

Observação:

1. Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (40620892) e Relatório FOTOGRÁFICO (40620894) do serviço realizado.

2. Informamos que para o cumprimento da Cláusula contratual 17.4 do presente contrato, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura emitiu a Circular n.º 8/2020 - SES/SINFRA/DEA (37758488), bem como o Despacho - SES/SINFRA/DEA (40569998), que versam sobre a ausência da designação da comissão, bem como a forma de supri-la.

3. Em observância a PORTARIA CGDF Nº 37 e 73/2019, constam nos autos Nota Técnica N.º 383/2020 - SES/CONT/USCI (40752378).

4. O Processo ficou aguardando a emissão do reforço na nota de empenho 2020NE04198, conforme NE de reforço 40759235.

Oportuno ressaltar, que compete ao executor ou comissão executora ou área técnica a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do contrato em tela, nos termos do art. 41, do Decreto Distrital n. 32.598/2010, c/c art. 20, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, cabendo a este(s) a responsabilidade quanto à veracidade da documentação atestada, elaborada e incluída pelos mesmos. Ademais, salientamos que o atesto e os relatórios, referentes a execução do serviço contratado, foram elaborados no termos do art. 41, do Decreto supracitado, c/c incisos V e XI, do art. 20 e parágrafo único do art. 21, ambos do Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF.

Por fim, registramos que as informações constantes no presente relatório restringem-se às competências desta Unidade, em atendimento ao que preleciona o art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF.

Pelo exposto, em obediência ao que dispõe o Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF, encaminhamos o presente à **Diretoria Financeira (DIRFI/FSDF)** para conhecimento e providências quanto à análise de conformidade e conferência dos requisitos obrigatórios elencados no art. 63 da Lei Federal n. 4.320/1964 c/c o art 61 do Decreto Distrital n. 32.598/2010, estando apto para instrução de liquidação e pagamento, à empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em razão da prestação do serviço objeto do Contrato nº 075/2020-SES/DF.

EVERSON FERNANDES SILVA
Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura
Gerente

De acordo. Encaminhe-se os autos a **DIRFI/FSDF** para conhecimento e providências quanto à instrução de liquidação e pagamento à empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do Contrato n. 075/2020-SES/DF.

MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretora



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 27/05/2020, às 12:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA - Matr.0189336-X**, **Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios**, em 27/05/2020, às 16:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **40786629** código CRC= **AD136C93**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 40786629



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 02 de junho de 2020.

Ao
FSD/SES

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS - Verificação Instrumental e Solicitação de Autorização de Liquidação e Pagamento

Tratam os autos da execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do contrato 075/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 29/04/2020 à 24/10/2020, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**.

Considerando as obrigações constantes do art. 63 da Lei 4.320/1964, bem como do art. 61 do Decreto 32.598/2010, consolidamos abaixo as informações verificadas nos autos:

CNPJ:	00.611.343/0001-92								CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA							
TIPO:	Contrato Regular								Processo:	00060-00212479/2020-63							
Contrato:	075/2020-SES/DF		Vigência:				29/04/2020 à 24/10/2020		Objeto:	Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal							
SERVIÇOS																	
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS - 3,5%	IRRF - 1% Dec. Nº 310	ISS - 1% Dec. Nº 1567	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte
465	40620883	20/05/2020	20/06/2020	25/05/2020	40673566	04/05/2020 a 13/05/2020	40673594	2.082.551,96	0,00	2.082.551,96	72.889,32	20.825,52	20.825,52	1.968.011,60	2020NE04198 Pag. 02	40401753	138.018.816
Total (Serviços)								2.082.551,96	0,00	2.082.551,96	72.889,32	20.825,52	20.825,52	1.968.011,60	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		40956
Observações: 1. Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (40620892) e Relatório FOTOGRÁFICO (40620894) do serviço realizado. 2. Informamos que para o cumprimento da Cláusula contratual 17.4 do presente contrato, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura emitiu a Circular n.º 8/2020 - SES/SINFRA/DEA (37758488), bem como o Despacho - SES/SINFRA/DEA (40569998), que versam sobre a ausência da designação da comissão, bem como a forma de supri-la. 3. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.																	

As informações constantes do quadro acima, consideram que a responsabilidade pela comprovação da prestação de serviços e conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída concorre à Unidade Gestora, baseada nas competências estabelecidas pela Portaria nº 170/2018, artigo 25, incisos 7º e 8º, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto.

A fim de dar continuidade na instrução do processo de pagamento, conforme análise da Unidade Gestora e da conferência acima, encaminhamos os autos solicitando avaliação e deliberação quanto à **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO** valor total de **R\$ 2.082.551,96 (dois milhões, oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)**.

Analisado por:

Conferência realizada por:

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Marco Antônio Barreto de Lima Guimarães
Diretoria Financeira
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 03/06/2020, às 16:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 04/06/2020, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=41152406 código CRC= 88A9BB87.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 41152406



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Liquidação

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

Tratam os autos da execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do contrato 075/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 29/04/2020 à 24/10/2020, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

Considerando:

1. Que compete aos executores e comissões executoras a comprovação da prestação de serviços, e à Unidade Gestora a responsabilidade pela conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída, baseado no estabelecido pela Portaria SES nº 170/2018, artigo 25, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto;
2. A verificação da regularidade fiscal do credor, a ser realizada pela GEPAG/DIRFI, nos termos do art. 63 do Decreto 32.598/2010;
3. A delegação de competência conferida pela Portaria/SES nº 276/2015, em atendimento ao art. 62 da lei nº 4.320/1964.

Considerando as solicitações das áreas técnicas e demandantes, no sentido do prosseguimento da instrução de liquidação pagamento, após a análise da Unidade Gestora (40786629) e conferência da GELIQ/DIRFI (41152406), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 465, referente à competência de 04/05/2020 a 13/05/2020, no valor total de **R\$ 2.082.551,96 (dois milhões, oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo, *ipsis litteris*:

"[...]

Art. 7º Compete ao Diretor Executivo:

II - administrar os recursos do Fundo de Saúde, sob a orientação e supervisão direta do Secretário de Saúde do Distrito Federal;

"[...]

Art. 8º Os recursos do Fundo de Saúde do Distrito Federal destinam-se a prover, nos termos do [art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal](#), as despesas de custeio e de capital da Secretaria de Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, as transferências para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem executados pelas unidades de saúde e instituições conveniadas com o Sistema Único de Saúde, autorizados pela lei orçamentária anual, em consonância com os planos plurianuais.

"[...]"

Em atenção à Nota Técnica (40752378), reiteramos as recomendações constantes no item III, a seguir:

III – RECOMENDAÇÕES

Por ocasião da liquidação e pagamento, quando for o caso, **observar**:

- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas;
- **Tomar ciência** do Decreto nº 40.447, de 06 de fevereiro de 2020, que determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal deverão efetuar o cadastramento de todos os contratos vigentes no Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos/DF), de acordo com o § 2º do Art. 4º, in verbis:

(...)

Art. 4º-A O Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos/DF) é de uso obrigatório para órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, bem como para a Defensoria Pública do Distrito Federal, que utilizam o Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGG)

(...)

§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal deverão cadastrar seus contratos administrativos, bem como os respectivos termos aditivos, apostilamentos e termos de rescisão, no e-Contratos/DF até 28 de fevereiro de 2020." (NR)

Ronan Pereira Lima
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde
Diretor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **RONAN PEREIRA LIMA - Mat.1694457-7, Diretor(a) do Fundo de Saúde**, em 05/06/2020, às 12:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **41152805** código CRC= **A683D450**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	72.889,32
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	72.889,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	72.889,32
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	72.889,32
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECRETO Nº 25.508 de 19 DE JANEIRO DE 2005

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 1567/2020
1ª Via

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.394.700/0001-08 - CF/DF: 07.329.505/001-89

ENDEREÇO: SAIN - PARQUE RURAL ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Declaramos, para fins de comprovação junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, que retivemos a importância de R\$ 20.825,52 (vinte mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) provenientes dos serviços prestados pela MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com endereço no(a) SOF/NORTE - QUADRA 02 CONJ. E LOJA 11 - SOF - BRASÍLIA/DF, CNPJ Nº 00.611.343/0001-92 E CF Nº 732.939.900.133, NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 13/05/2020.

Fatura(s)/NF(s): 465.

Valor do Serviço: R\$ 2.082.551,96.

Alíquota: 1,00% sobre o valor dos serviços.

Processo de pagamento: 00060-00212479/2020-63



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 02/06/2020, às 14:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=41153909 código CRC= **EE7B11CE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 41153909



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO DE IRRF		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº 0310 / 2020 - 1ª via
R\$ 20.825,52	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Recebedor	
Da MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 00.611.343/0001-92), foi recebida a importância de R\$ 20.825,52 (vinte mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 04/05/2020 a 13/05/2020. NFs: 465. Valor da(s) NF(s): R\$ 2.082.551,96 Alíquota: 1,00% Processo de pagamento: 00060-00212479/2020-63 ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 02/06/2020, às 15:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **41154693** código CRC= **109DF418**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 41154693



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 10/06/2020 **Data de Lançamento** 10/06/2020 **N. Documento** 2020NL08270
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40956 **Fatura/NF** 465 - INSS **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04198	332310602	33903916	138018816	72.889,32
520291 2020NE0419800611343000192	218830103		138018816	72.889,32
521002 2020NE0419800611343000192	218830103		138018816	72.889,32

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EMIÇÃO: 20/05/2020
AUTORIZO: 41152805
PROCESSO SEI: 00060-00212479/2020-63 R26SE

Usuário Lançado em: 10/06/2020 às 13:31 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 10/06/2020 **Data de Vencimento** 10/06/2020 **Nº Documento** 2020PP11145
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001 42005 BANCO **Identificação** 00060-00212479/2020-63
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 72.889,32
Fatura/NF 465 - INSS
NL Referência 2020NL08270 **NE Referência** 2020NE04198 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS 465 MEVATO 20/05/2020 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0419800611343000192		00000000	138018816	72.889,32
701989			00000000		72.889,32

Usuário Lançado em: 10/06/2020 às 18:12:55 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 12/06/2020 **Data de Lançamento** 12/06/2020 **N. Documento** 2020NL08321
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40956 **Fatura/NF** 465. **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516	2020NE04198	332310602	33903916	138018816	2.009.662,64
520052	2020NE04198	213110102	33903916	138018816	1.968.011,60
520261	2020NE0419800611343000192	218820108		138018816	20.825,52
520271	2020NE0419800611343000192	218820104		138018816	20.825,52
521001	2020NE04198	213110102		138018816	1.968.011,60
521002	2020NE0419800611343000192	218820108		138018816	20.825,52
521002	2020NE0419800611343000192	218820104		138018816	20.825,52

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE 86 LEITOS DE
RETAGUARDA
PERÍODO: 04/05/2020 a 13/05/2020
AUTORIZO: 41152805
PROCESSO SEI: 00060-00212479/2020-63 R26SE

Usuário Lançado em: 12/06/2020 às 09:18 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 12/06/2020 **Data de Lançamento** 12/06/2020 **Nº Documento** 2020OB11349
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2020PP11145
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001-42005-BANCO
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 465 - INSS
NL Referência 2020NL08270
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00212479/2020-63 **Valor** 72.889,32
Finalidade INSS 465 MEVATO 20/05/2020 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0419800611343000192			138018816	72.889,32
701989					72.889,32

Usuário Lançado em: 12/06/2020 às 09:51 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.611.343/0001-92
Razão Social: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia: MEVATO CONSTRUÇÕES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/07/2020
FGTS	Validade:	18/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/10/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/07/2019 (*)
Receita Municipal	(Isento)	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2020 (*)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 182038138292020

NOME: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

CIDADE: SCIA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

CF/DF: 0732939900133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 12 de julho de 2020.

Certidão emitida via internet em 12/06/2020 às 17:28:18 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 12/06/2020 **Data de Vencimento** 12/06/2020 **Nº Documento** 2020PP11194
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
Domicílio Bancário 070 00046 000390-9 **Identificação** 00060-00212479/2020-63
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 1.968.011,60
Fatura/NF 465
NL Referência 2020NL08321 **NE Referência** 2020NE04198 **Nº RF / RC**
Finalidade NF 465 04/05/2020 a 13/05/2020 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04198	213110102	33903916	138018816	1.968.011,60
701989			00000000		1.968.011,60

Usuário Lançado em: 12/06/2020 às 17:30:22 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 12/06/2020 **Data de Vencimento** 12/06/2020 **Nº Documento** 2020PP11195
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00212479/2020-63
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 20.825,52
Fatura/NF 465
NL Referência 2020NL08321 **NE Referência** 2020NE04198 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF 465 MEVATO 04/05/2020 a 13/05/2020 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0419800611343000192	411310210	11180231	100000000	20.825,52
701991			00000000		20.825,52
701900	2020NE0419800611343000192	411310210	00000000	100000000	20.825,52
701901	2020NE0419800611343000192	1341130210	00000000	100000000	20.825,52

Usuário Lançado em: 12/06/2020 às 17:31:59 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 12/06/2020 **Data de Vencimento** 12/06/2020 **Nº Documento** 2020PP11196
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00212479/2020-63
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 20.825,52
Fatura/NF 465
NL Referência 2020NL08321 **NE Referência** 2020NE04198 **Nº RF / RC**
Finalidade IRRF NF 465 MEVATO 04/05/2020 a 13/05/2020 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0419800611343000192	411210302	11130211	100000000	20.825,52
701991			00000000		20.825,52
701900	2020NE0419800611343000192	411210302	00000000	100000000	20.825,52
701901	2020NE0419800611343000192	1341280302	00000000	100000000	20.825,52

Usuário Lançado em: 12/06/2020 às 17:32:51 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



GPS (Guia da Previdência Social)

G334152119542529035
15/06/2020 23:17:16

Cliente

Agência do débito	4200-5	
Conta corrente	6877-2	
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Número inscrição		00611343000192
Código do pagamento		2640
Competência	SEI 212479/2020-63	05/2020
Data pagamento	2020OB11349	19/06/2020
Valor contribuição		72.889,32
Valor outros		0,00
Juros/multa		
Valor total		72.889,32

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **874021993**.

Usuário: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

Número do documento: 734
Data do evento: 12/06/2020
Código da agência: 4200-5
Número da conta: 6877-2
Valor do evento R\$: 4.711.551,35

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11343	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 80.286,45
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11344	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 2.621,12
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11345	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 896,01
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11346	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 3.338,74
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11347	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 10.286,62
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11348	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 5.474,22
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11349	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 72.889,32
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11352	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.529,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11353	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.080,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11354	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.646,96
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11355	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 982,24
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11356	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.918,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11360	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.585,80
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11362	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.406,74
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11363	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 101,59
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11364	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.780,82
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11365	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 93,73
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11366	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.383,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11367	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 72,82

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11368	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.969,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11369	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 103,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11370	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.955,27
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11371	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.518,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11372	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.244,49
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11373	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 118,13
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11374	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 342.364,06
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11375	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.198,47
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11376	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 33.100,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11377	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.000,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11378	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 44.200,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11379	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 422.013,08
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11381	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 322.715,89
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11383	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 142.121,76
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11384	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.480,10
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11385	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 214.675,45
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11386	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 80.852,41
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11387	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 61.828,31
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11388	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.145,34
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11390	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.780,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11391	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 329.657,98
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11392	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 252.091,42
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11393	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.028,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11395	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 52.669,36

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11396	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 40.276,57
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11397	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.951,84
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11398	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 99.600,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11399	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 156.660,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11400	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 69.370,04
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11401	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 307.758,40
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11402	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 235.344,65
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11403	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 99.600,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11404	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 90.714,68
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11405	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 1.694,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11406	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 7.999,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11407	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 1.246,28
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11408	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 7.562,86
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11409	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 148.808,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11410	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.627,28
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11411	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 769,86
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11412	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 614,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11413	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.179,33
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11414	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 460,64
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11418	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 197.358,75
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11419	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 552.635,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11420	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.491,66
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11421	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.618,75

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 15/06/2020 **Data de Lançamento** 15/06/2020 **Nº Documento** 2020OB11458
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2020PP11194
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Domicílio Bancário 070-00046-000390-9
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 465
NL Referência 2020NL08321
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00212479/2020-63 **Valor** 1.968.011,60
Finalidade NF 465 04/05/2020 a 13/05/2020 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04198	213110102	33903916	138018816	1.968.011,60
701989					1.968.011,60

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL08321 UG 170101 GESTÃO 17901 : Estamos seguindo a Ordem Cronológica da lista R26SE - 2020.06.08 - Planilha Maio - Serviço (Dias 29/05).

Usuário Lançado em: 15/06/2020 às 11:38 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 15/06/2020 **Data de Lançamento** 15/06/2020 **Nº Documento** 2020OB11459
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2020PP11195
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 465
NL Referência 2020NL08321
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00212479/2020-63 **Valor** 20.825,52
Finalidade ISS NF 465 MEVATO 04/05/2020 a 13/05/2020 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0419800611343000192	411310210	11180231	100000000	20.825,52
701900	2020NE0419800611343000192	411310210		100000000	20.825,52
701901	2020NE0419800611343000192 138018816	411310210		100000000	20.825,52
701991					20.825,52

Usuário Lançado em: 15/06/2020 às 11:39 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 15/06/2020 **Data de Lançamento** 15/06/2020 **Nº Documento** 2020OB11460
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2020PP11196
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 465
NL Referência 2020NL08321
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00212479/2020-63 **Valor** 20.825,52
Finalidade IRRF NF 465 MEVATO 04/05/2020 a 13/05/2020 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0419800611343000192	411210302	11130211	100000000	20.825,52
701900	2020NE0419800611343000192	411210302		100000000	20.825,52
701901	2020NE0419800611343000192 138018816	411210302		100000000	20.825,52
701991					20.825,52

Usuário Lançado em: 15/06/2020 às 11:39 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

**Emissão de comprovantes**G3372113380899201
21/06/2020 18:45:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.07
4200504200 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

**SEI 212479/2020-63
2020OB11349**

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	72.889,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	72.889,32

=====

DOCUMENTO: 061934

AUTENTICACAO SISBB: E.448.E4B.BB1.08C.553

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.07
4200504200 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	72.889,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	72.889,32

=====

DOCUMENTO: 061934

AUTENTICACAO SISBB: E.448.E4B.BB1.08C.553

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

Número do documento: 735
 Data do evento: 15/06/2020
 Código da agência: 4200-5
 Número da conta: 6877-2
 Valor do evento R\$: 5.871.924,21

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11424	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.538,40
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11425	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 133,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11426	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.855,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11427	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 15.602,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11428	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 362,18
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11429	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.483,46
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11430	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.753,38
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11431	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.918,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11432	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.645,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11433	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.054,99
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11434	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.271,29
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11435	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.249,24
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11436	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.136,31
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11438	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.750,12

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11439	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.646,96
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11440	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.272,62
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11444	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 61.189,64
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11445	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.307,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11446	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 542,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11447	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36.695,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11450	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 90.146,11
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11451	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 953,93
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11452	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 953,93
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11455	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 277.738,62
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11456	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.939,03
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11457	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.939,03
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11458	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.968.011,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11459	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 20.825,52
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11460	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 20.825,52
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11464	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 24.192,37
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11465	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 256,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11466	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 256,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11467	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 147.803,82

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11468	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.564,06
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11469	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.564,06
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11473	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.673,64
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11475	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 70.770,21
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11476	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 748,89
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11477	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 748,89
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11478	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 8.333,30
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11479	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 6.768,81
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11480	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 610,95
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11481	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 213,58
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11482	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 838,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11483	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 1.366,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11484	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 2.835,42
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11485	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 4.192,40
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11486	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 773,76
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11487	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 18.363,01
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11489	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.167.734,13
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11490	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.938,99
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11491	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.882,35

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11494	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 687,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11495	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.741,02
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11496	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.813,49
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11497	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 203,18
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11498	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.037,63
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11499	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 54,61
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11500	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 302,15
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11501	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 864,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11502	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 45,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11505	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 285.600,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11507	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.400,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11513	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 2.384,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11514	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 35.990,29
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11515	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 745,91
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11516	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 559,43
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11517	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.031,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11518	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 148.835,93
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11519	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.176,59
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11520	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.382,44

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11521	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.592,65
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11522	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 53,73
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11523	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 85.582,37
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11524	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 40,30
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11525	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.773,73
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11526	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.330,30
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11527	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.723,07
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11529	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 56,44
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11532	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42,33
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11533	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 110.479,07
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11534	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.289,72
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11535	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.717,29
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11536	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.985,36
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11538	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.394,01
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11539	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.295,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11545	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 540,80



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 01 de julho de 2020.

A SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (40786629), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (42565430 e 42570435), **para conhecimento**.

CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA						
	00.611.343/0001-92						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
465	2.082.551,96	0,00	2.082.551,96	72.889,32	20.825,52	20.825,52	1.968.011,60
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB11349	2020OB11460	2020OB11459	2020OB11458
Link OB(s)				41708911	42015337	42015327	42015310

Solicitamos ainda que, caso sejam identificadas divergências nos pagamentos informados, retornem os autos à SES/FSDF/DIRFI para análise e saneamento.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 01/07/2020, às 15:00, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **42762388** código CRC= **DBC424F0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 01 de julho de 2020.

Para: **SES/SINFRA/DEA**

Senhor(a) Executor(a) ou responsável pela despesa,

Encaminhamos os autos para **ciência** dos pagamentos ocorridos nos autos, conforme Despacho SES/FSDF/DIRFI/GELIQ (42762388) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB11458 (42015310).

Informamos que após o pagamento, não foram identificados pendências a serem sanadas no presente processo, contudo visando evitar erros, sugerimos última verificação por este executor.

Caso não seja evidenciado alguma pendência, **sugerimos a conclusão dos autos**, haja vista não terem mais providências a serem tomadas.

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 01/07/2020, às 18:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **42791083** código CRC= **069FC0C5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 02 de julho de 2020.

Ao Executor do Contrato

Sr Executor,

Encaminhamos o presente para ciência e conclusão do processo.



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO DONIZETE DA SILVA - Matr.0139398-7, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 02/07/2020, às 08:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **42824186** código CRC= **96E286BF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00212479/2020-63

Doc. SEI/GDF 42824186
