



EF-334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE - FIOL

Brasília, 08/08/17

**MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL**



INFORMAÇÕES GERAIS (JUN/17)


MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



- **Extensão:** 1.022km, atravessando 41 municípios
- **Obra dividida em nove lotes:**
 - FIOL I - Trecho Ilhéus–Caetité: Lotes 1, 2, 2A (Túnel em Jequié), 3 e 4 – com extensão de 537km
 - FIOL II - Trecho Caetité–Barreiras: Lotes 5, 5A (Ponte Rio São Francisco), 6 e 7 – com extensão de 485km
- **Execução física global:** 49%
 - FIOL I : 72%
 - FIOL II : 18%
 - Equipamentos: 610 / Mão-de-Obra: 1.738
- **Valor atual (obra):** R\$ 6,4 bilhões (Aprovado no GPAC em novembro de 2015)
- **Data de início:** Dez/10

LOCALIZAÇÃO DA FERROVIA

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL

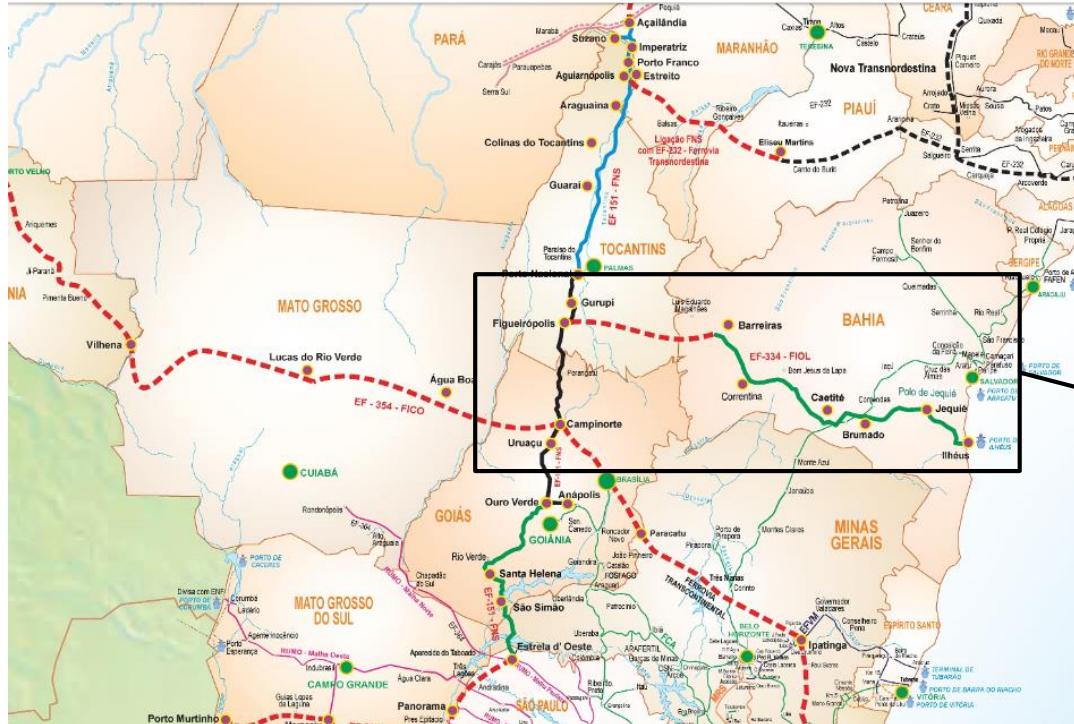

INFORMAÇÕES GERAIS

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



- A ferrovia se constituirá em um vital corredor de escoamento de minério do sul do Estado (Caetité e Tanhaçu) e de grãos do oeste baiano. Numa segunda etapa, será expandida até a Ferrovia Norte Sul, possibilitando a agregação de carga do centro-oeste brasileiro.
- O escoamento da carga ocorrerá pelo Porto Sul, importante complexo portuário a ser construído pelo Governo do Estado da Bahia, nas imediações da cidade de Ilhéus.
- A construção da ferrovia está em andamento, com obras iniciadas em todos os 9 Lotes:
 - 53 pontes (destaque para Ponte sobre o Rio São Francisco, com 2,9km de extensão)
 - 1 Túnel em Jequié com 780m de extensão (concluído).
 - 32 viadutos
 - 147.055 toneladas de trilhos (84.538 toneladas entregues)

DETALHAMENTO POR LOTE

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



	LOTE	EXTENSÃO (km)	VALOR (R\$ mi)	EXECUÇÃO Jun/17 (%)	QUANTIDADE DE OPERÁRIOS	QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS	PRAZO CONTRATUAL	PRAZO ESTIMADO DE CONCLUSÃO (***)
Caetité-Ilhéus	LOTE 01F TRAIL / PAVOTEC	125	614,9	36	9	0	Out/17	Dez/19 (**)
	LOTE 02F GALVÃO	118	792,4	81	138	41	Dez/18	Dez/18
	LOTE 02FA (TÚNEL) GALVÃO	0,8	60,7	100	-	-	Out/16	Concluído em Set/16
	LOTE 03F TORC / IVAI / CAVANI	115	486,8	91	375	132	Mar/18	Dez/17
	LOTE 04F (*) A LICITAR	178	733,5	77	0	0	-	Dez/19
Barreiras-Caetité	LOTE 05F PAVOTEC / TRAIL	162	776,6	21	388	145	Dez/17	Dez/19
	LOTE 05FA (PONTE) LOCTEC/SANCHES TRIPOLONI/SOBRENCO	2,9	138,2	67	465	91	Fev/18	Abr/18
	LOTE 06F CONSTRAN	159	549,9	5	132	64	Nov/18	Dez/19
	LOTE 07F TIISA / COWAN / PELICANO	161	539,6	15	231	137	Ago/18	Dez/19
	TOTAL	1.022	4.692,6	49	1.738	610	-	-

(*) Lote 4F com 77% das obras executadas pelo Consórcio Andrade Gutierrez/Barbosa Melo/Serveng, cujo contrato foi rescindido em Mar/16. Obras remanescentes à licitar.

(**) Lote 1F está com contrato suspenso até Set/17.

(***) Prazo estimado de conclusão conforme está na PPA.

EVOLUÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATOS

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Valores em Reais

Contrato	Lote	Valor Atual Ref. Jun/17	Pago até Dez/16	Pago até Jun/17	Pago Total	Orçamento 2017 (LOA)	Saldo Atual
007/14	01	820.091.743,16	213.035.142,38	172.676,47	213.207.818,85	2.010.002,90	606.883.924,31
054/10	02	962.406.955,37	751.696.564,48	21.226.989,82	772.923.554,30	16.085.924,38	189.483.401,07
026/13	02A	62.628.470,16	62.628.470,16	-	62.628.470,16	-	-
062/10	03	586.550.630,75	506.238.965,24	17.145.117,26	523.384.082,50	23.166.670,31	63.166.548,25
055/10	04	817.518.054,53	538.382.537,73	-	538.382.537,73	-	279.135.516,80
006/14	05	1.069.750.087,73	251.538.759,73	20.172.279,30	271.711.039,03	8.532.250,59	798.039.048,70
085/10	05A	176.551.179,81	68.019.129,53	54.140.751,03	122.159.880,56	51.352.584,16	54.391.299,25
059/10	06	741.013.106,81	26.602.821,55	8.057.639,88	34.660.461,43	-	706.352.645,38
060/10	07	727.671.409,09	72.450.056,53	18.726.738,94	91.176.795,47	-	636.494.613,62
Total	-	5.964.181.637,41	2.490.592.447,33	139.642.192,70	2.630.234.640,03	101.147.432,34	3.333.946.997,38

OBS.:

- Empenhado da LOA 2017 em Supervisão, Gerenciamento, Desapropriação, Meio Ambiente = **R\$ 68.293.276,95**;
- Saldo de RAP: Lote 06F (CT 059/2010) = **R\$ 73.269.553,93** e Lote 07F (CT 060/2010) = **R\$ 22.330.473,30** (sem financeiro);
- Saldo de RAP demais contratos de Obra, Supervisão, Gerenciamento, Desapropriação, Meio Ambiente e Suprimentos = **R\$ 90.991.373,86**;
- Saldo Total de RAP = **R\$ 186.591.401,09**;
- Contido **R\$ 55.649.290,71** (Sem Limite para empenho).

Obrigado!

MÁRIO MONDOLFO
VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A
