

Transposição do Rio São Francisco



Projeto de Integração do Rio São Francisco
com Bacia Hidrográficas do Nordeste Setentrional


RESUMO

- CCASF contratado para a execução dos Lotes 1 e 2
– Eixo Norte
- Gerenciadora: Logos – Concremat
- Supervisão: Sondotécnica (até dez. 2011);
Ministério da Integração (jan. 2012 a fev. 2013) e
Engevix (fev. 2013)


DIFICULDADES ENFRENTADAS

- Projeto básico inconsistente, o que gerou planilhas orçamentárias discrepantes com a realidade da obra;
- Ausência de preços na planilha orçamentária, não permitindo a remuneração dos serviços constantes nos projetos executivos;
- Atraso na liberação dos Projetos executivos;
- Pendências de ordem fundiária, limitando ou fracionando a execução da obra (o que persiste);
- Pendências de ordem ambiental, falta de ASV, limitando ou fracionando a execução da obra;
- Interferências com concessionárias, limitando ou fracionando a execução da obra (o que persiste).


Cronologia – Exemplos de Intercorrências de 2008

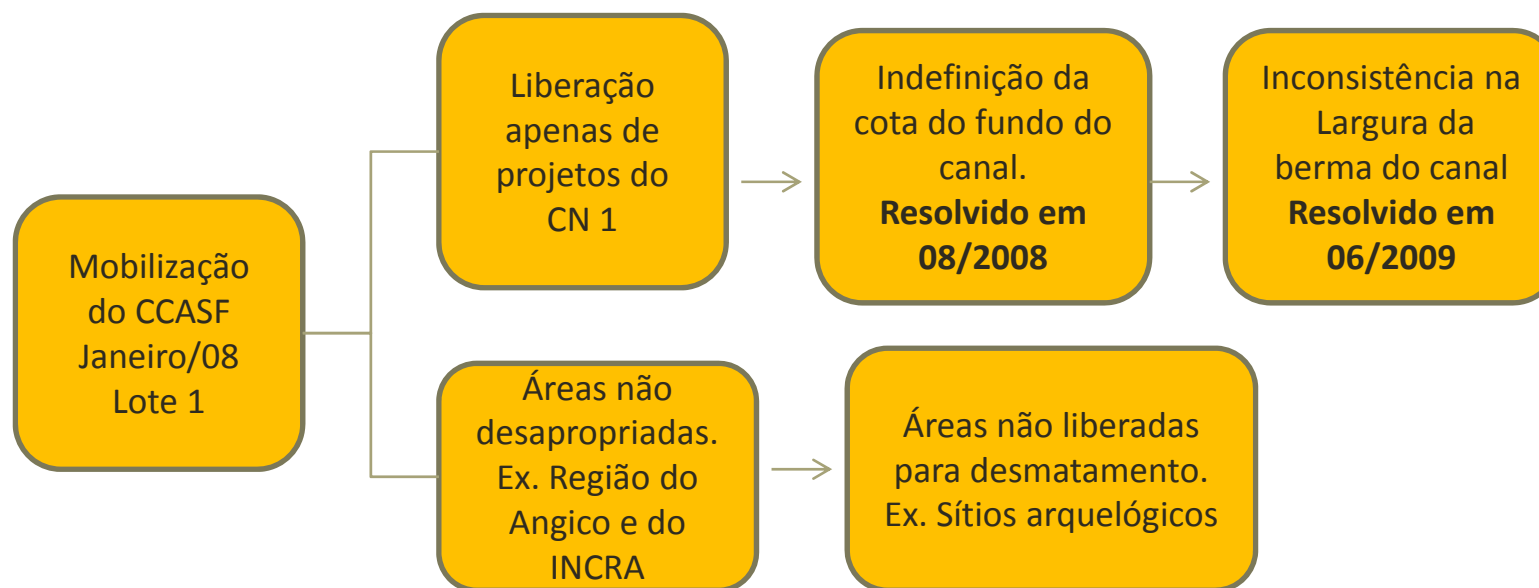


Cronologia – Exemplos de Intercorrências de 2009

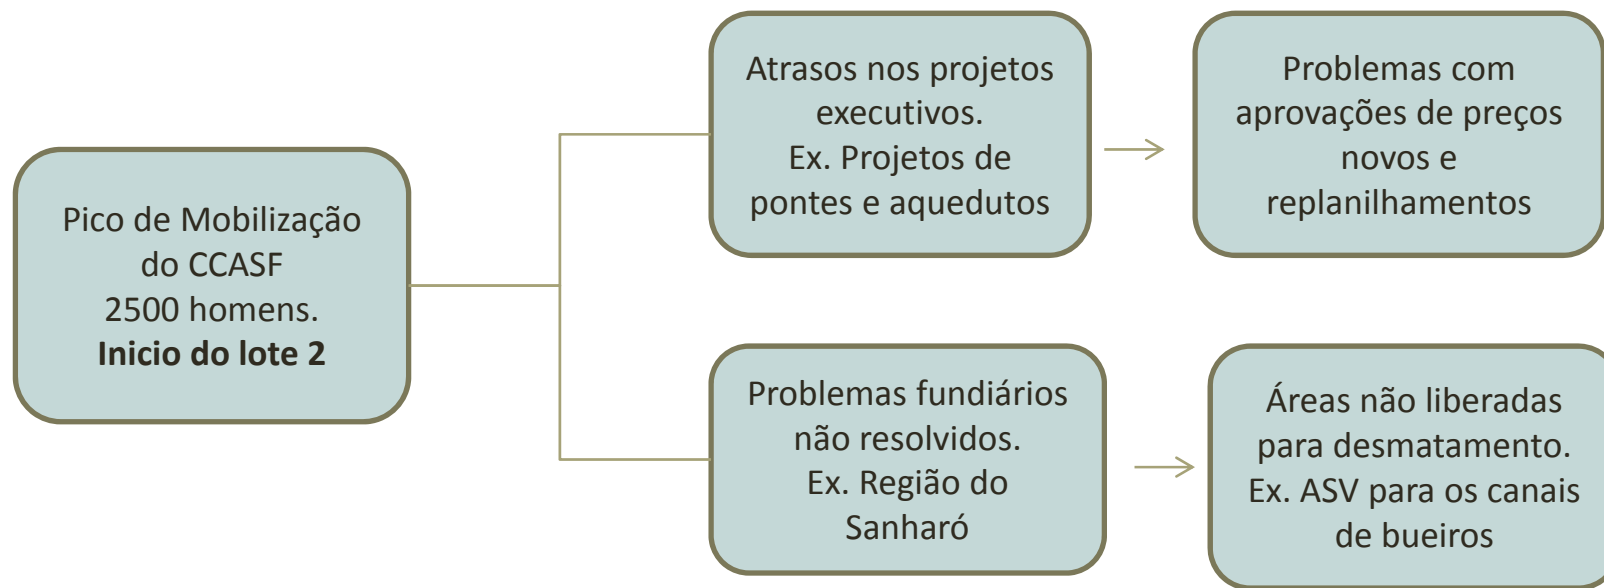

Cronologia – Exemplos de Intercorrências de 2010 e 2011

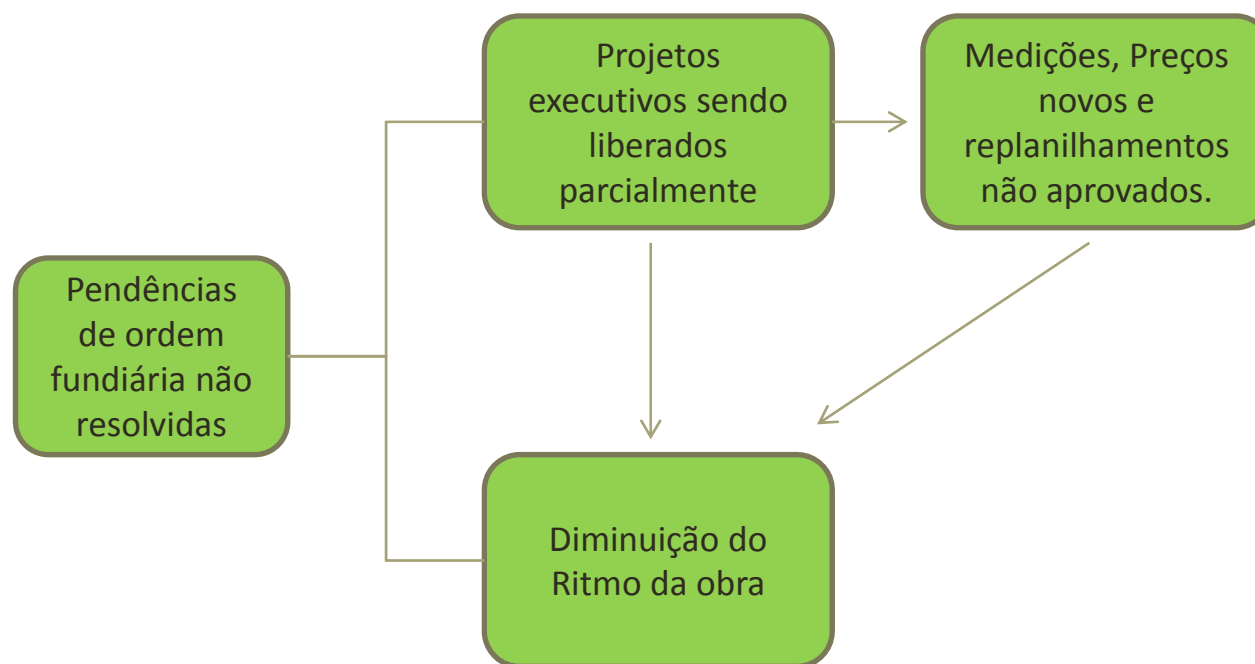

Cronologia – Exemplos de Intercorrências de 2012

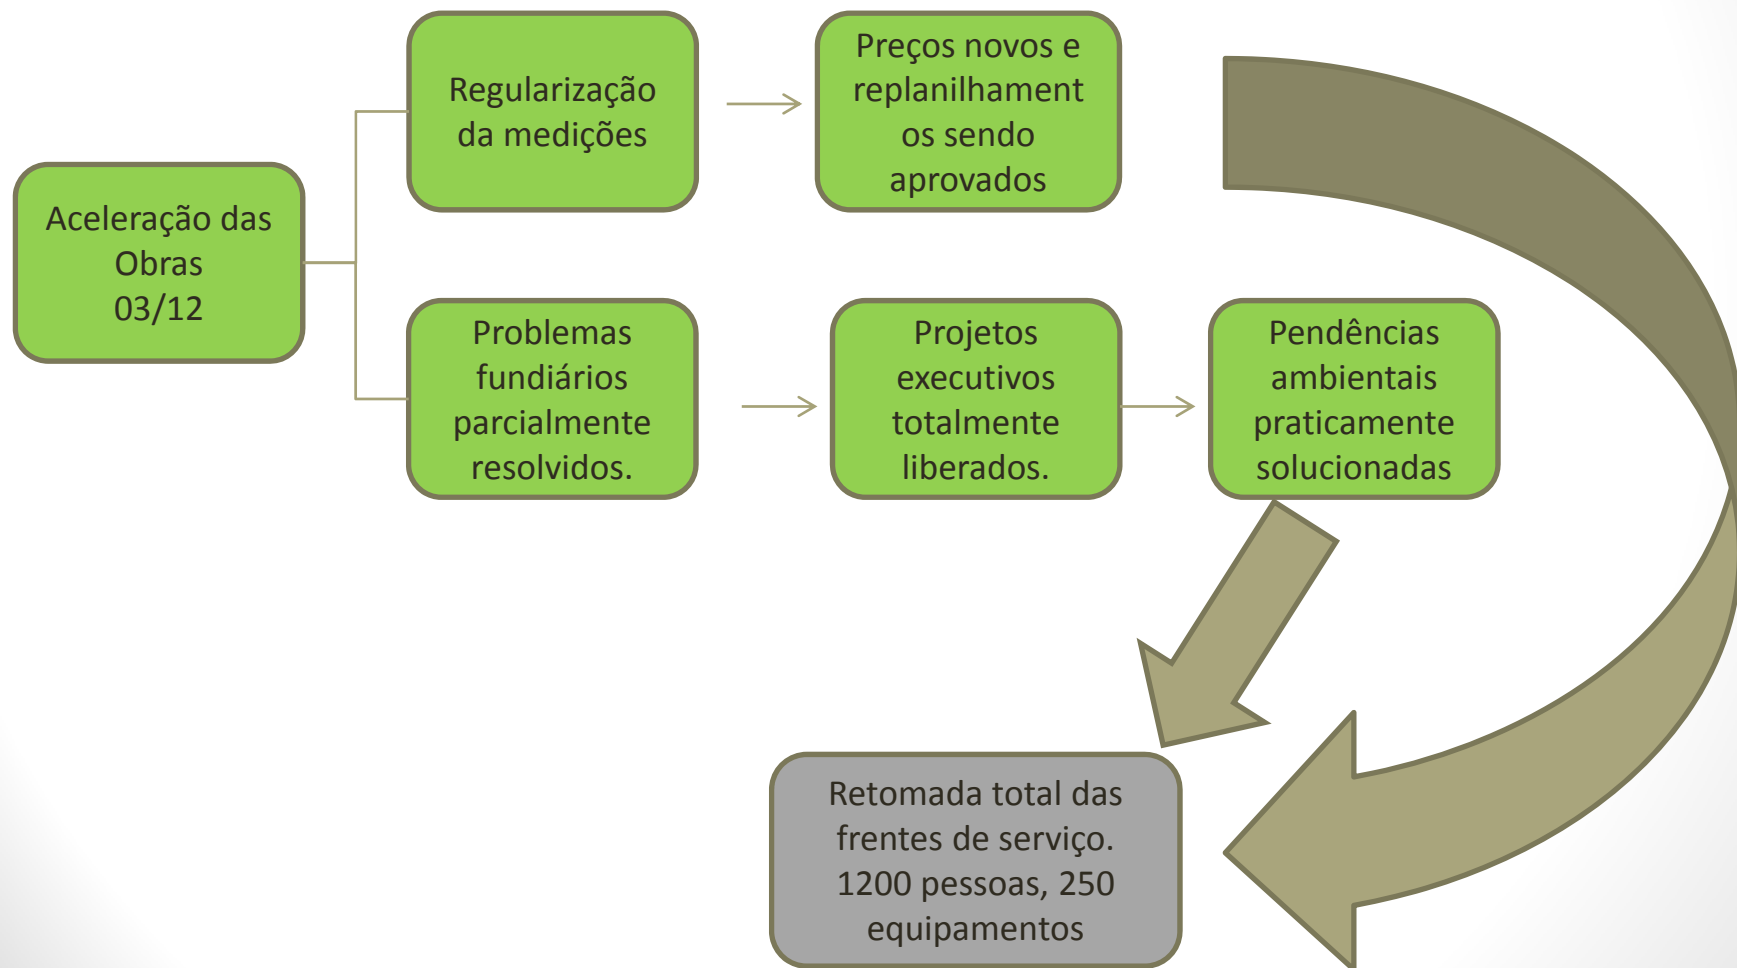

LOTE 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

Valor Original	Valor Atual	Valor já Recebido	Saldo a Executar*
238.595.399,50	297.885.973,77	220.497.458,10	77.388.515,67

* Serviços a Executar

Ponte BR-428; Transições Aquedutos; Aqueduto Mari; Aqueduto Terra Nova; 5 km de Canal

Prazo Original	Prazo Atual	Prazo já Transcorrido	Prazo para Conclusão
40 meses	76 meses	61 meses	15 meses

INFORMAÇÕES GERAIS - LOTE 1

- Contrato celebrado em: 31/12/2007
- Ordem de serviço inicial: 21/01/2008
- 8 Aditivos celebrados, sendo:
 - 3 de ajustes no prazo contratual;
 - 2 de alteração de forma de reajuste e de medição;
 - 2 revisão de quantitativos e de preço, no percentual de 24,84%;
 - 1 revisão de quantitativos sem alteração de valor.

LOTE 2 – INFORMAÇÕES GERAIS

Valor Original	Valor Atual	Valor já Recebido	Saldo a Executar*
212.146.219,06	263.969.221,16	129.448.688,13	134.520.533,03

* Serviços a Executar

B. Serra Livramento; B. Mangueira; Aqueduto Salgueiro; Bueiros; 7km de Canal

Prazo Original	Prazo Atual	Prazo já Transcorrido	Prazo para Conclusão
40 meses	76 meses	55 meses	21 meses

INFORMAÇÕES GERAIS - LOTE 2

- Contrato celebrado em: 01/08/2008
- Ordem de serviço inicial: (16/01/2009 – iniciados os serviços; 20/03/2009 – liberação dos serviços restantes)
- 5 Aditivos celebrados, sendo:
 - 2 de ajustes no prazo contratual;
 - 1 de alteração de forma de reajuste;
 - 2 revisão de quantitativos e de preço, no percentual aproximado de 24,42%;

FOTOS – OBRA EM ANDAMENTO







15.02.2013 10:19





15.02.2013 10:47





