


Situação das Captações dos Perímetros de Irrigação



SITUAÇÃO DOS PERÍMETROS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO

- 15 Perímetros apresentaram situação preocupante devido a grave crise hídrica de atinge a Bacia do Rio São Francisco.

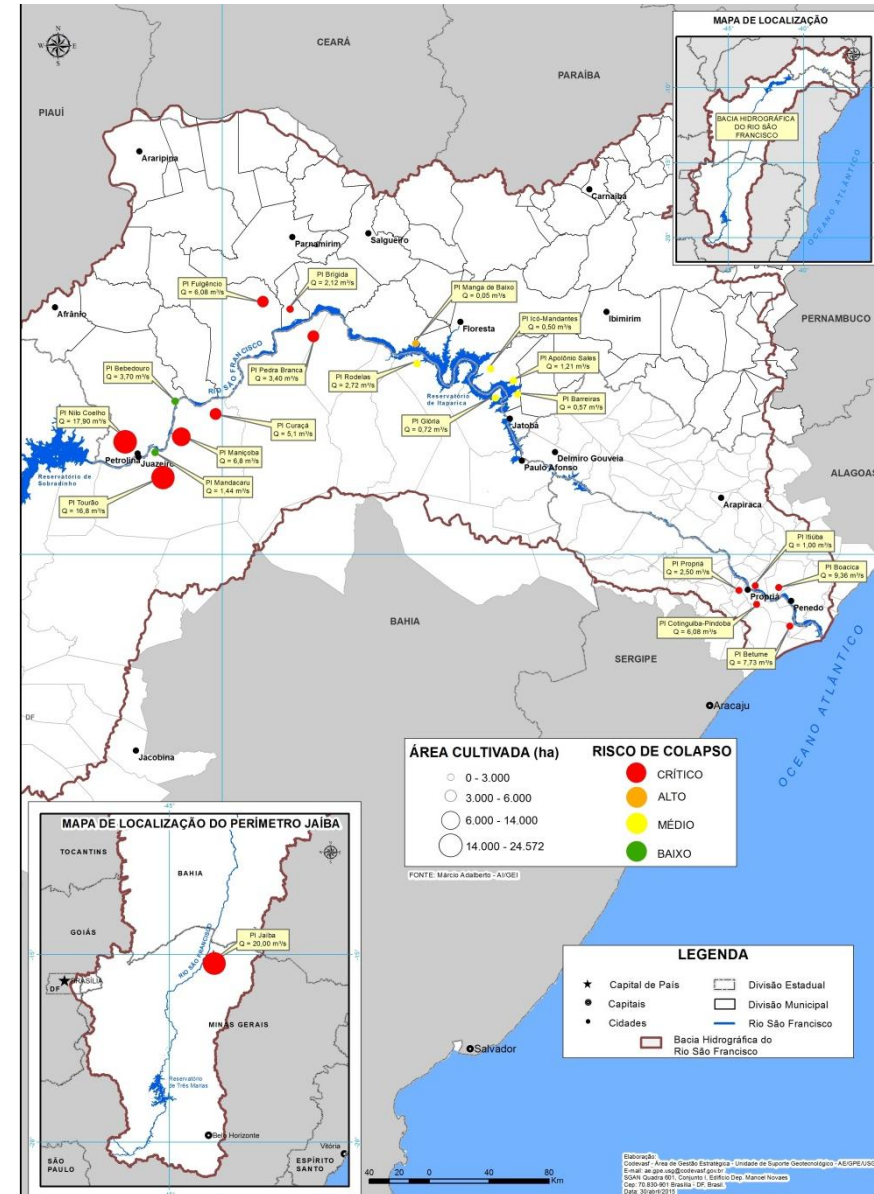

AÇÕES DESENVOLVIDAS

- CODEVASF COM RECURSOS REPASSADOS EM JULHO PELA SEDEC/MI INICIOU OS PROCESSOS PARA A LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA CRISE HÍDRICA:
 - DESASSOREAMENTO
 - ENSECADEIRAS
 - AQUISIÇÃO DE FLUTUANTES
 - CONSTRUÇÃO DE CANAL DE ADUÇÃO (PNC)
 - BOMBAS COMPLEMENTARES

Síntese dos Investimentos Programados pela Codevasf/MI

SR	UF	Perímetro	Solução adotada	Valor
3ª	PE	Nilo Coelho	Canal	R\$ 15.998.833,92
			Flutuantes	R\$ 17.486.238,23
			Tubulação	R\$ 8.513.612,52
		Brígida	Ensecadeira	R\$ 60.000,00
		Fulgêncio	Flutuantes	R\$ 1.976.554,24
		Manga de Baixo	Flutuantes	R\$ 188.354,26
		Icó-Mandantes	Desassoreamento	R\$ 1.100.000,00
4ª	SE	Betume	Flutuantes	R\$ 1.824.089,90
		Cotinguiba-Pindoba	Flutuantes	R\$ 879.471,92
		Propriá	Flutuantes	R\$ 553.741,58
		Propriá, Cotinguiba-Pindoba e Betume	Aquisição de 04 conjuntos motobombas montadas em carretas	R\$ 169.028,04
5ª	AL	Itiúba	Flutuantes	R\$ 1.752.664,82
6ª	BA	Curaçá	Flutuantes	R\$ 1.890.164,46
		Manicoba	Flutuantes	R\$ 1.774.172,22
		Pedra Branca	Flutuantes	R\$ 962.695,76
				R\$ 38.243.587,84

• Perímetro Irrigado Maniçoba

Intervenção em Andamento: Instalação de 02 (dois) flutuantes, que já estão contratados, com 40% dos serviços realizados e previsão de conclusão até 30/12/2015.

Valor do Investimento: R\$ 1.030.340,98 (um milhão, trinta mil, trezentos e quarenta reais e noventa e oito centavos).



Bombedor em fabricação - OPEMACS



Fabricação dos flutuadores - OPEMACS

• Perímetro Irrigado Curaçá I e II

Intervenção em Andamento: Fornecimento e instalação de 03(três) flutuantes. Os serviços se encontram em andamento com 30% realizado, e com previsão de conclusão até 15/12/2015.

Valor do Investimento: R\$ 1.726.342,64 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).



Bombeador em teste

• **Perímetro Irrigado Pedra Branca**

Intervenção em Andamento: Fornecimento e instalação de 01(um) flutuante. Os serviços se encontram em andamento, com 40% dos serviços realizados e com previsão de conclusão até 15/12/2015.

Valor do Investimento: R\$ 880.547,98 (oitocentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta sete reais e noventa e oito centavos).



Bombeador em fabricação

• Perímetro Irrigado Fulgêncio

Intervenção em Andamento: Fornecimento e instalação de 02(dois) flutuantes. Os serviços se encontram em andamento com 35% executados, e tem previsão de conclusão até 31/12/2015.

Valor do Investimento: R\$ R\$ 1.095.000,00 (um milhão e noventa e cinco mil reais).




Flutuadores na Fábrica

• **Perímetro Irrigado Manga de Baixo**

Intervenção em Andamento: Fornecimento e instalação de 01(um) flutuante. Os serviços se encontram em fase de conclusão com 95% realizados. O equipamento encontra-se operando em caráter provisório e tem previsão de conclusão até 25/11/2015.

Valor do Investimento: R\$ R\$ 187.413,84 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos).

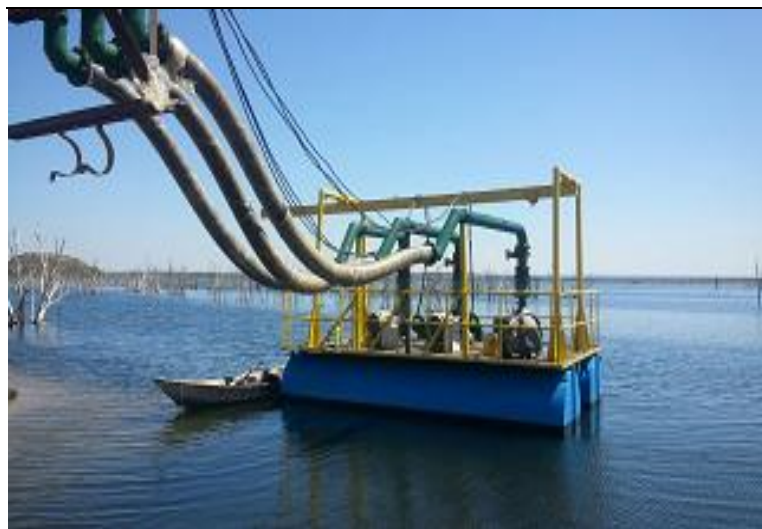

Flutuante em operação



Flutuante em operação

• **Perímetro Irrigado Apolônio Sales, Barreiras e Icó Mandantes**

Intervenção em Andamento: Desassoreamento dos canais de aproximação, com aproximadamente 85% dos serviços concluídos, com previsão de término em 30/11/2015.

Valor do Investimento: R\$ 583.557,95 (quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco).



Desassoreamento do canal de aproximação - ÉTICA



Profundidade do desassoreamento 2,20m

• **Perímetro Irrigado Betume, Cotinguiba/Pindoba e Propriá.**

Intervenção em Andamento: Fornecimento e instalação de 06 (seis) flutuantes. Os serviços se encontram em andamento, com 30% realizados, e tem previsão de conclusão até 15/01/2016.

Valor do Investimento: R\$ 1.257.837,03 (um milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e três centavos).



Bombedor em fabricação

• Perímetro Irrigado Itiúba

Intervenção em Andamento: Fornecimento e instalação de 02(dois) flutuantes. Os serviços se encontram em andamento com 35% realizado e tem previsão de conclusão até 15/12/2015.

Valor do Investimento: R\$ 1.704.618,99 (um milhão, setecentos e quatro mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e nove centavos).



Bombeador em fabricação - KSB



Rotores na fundição da contratada - KSB

• **Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho**

Intervenção em Andamento: Aquisição e Instalação de conjuntos motobombas abrigados em estruturas Flutuantes. Os serviços se encontram em andamento e a previsão é finalização até 10/12/2015.

Valor do Investimento: R\$ 26.264.508,94 (vinte e seis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oito reais e noventa e quatro centavos).

Dentre as ações desenvolvidas citamos: Construção de canal com aproximadamente 2,4 km de extensão, diques de contenção, com 90% dos serviços executados; Fornecimento e instalação de tubulação de PEAD, **com 100% realizados**; e fornecimento e instalação de motobombas montadas sobre flutuantes, com 70% concluídos.

**DESENHO ESQUEMÁTICO DA CAPTAÇÃO AUXILIAR
DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO**

Estação de
bombeamento
principal



Google

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CANAL DE ADUÇÃO PARA O PERÍMETRO SENADOR NILO



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO PARA O PERÍMETRO SENADOR NILO



ACOMPANHAMENTO DO BOMBEAMENTO PARA O PERÍMETRO SENADOR NILO COELHO



Síntese da Intervenção PNC



OBRIGADO

Luis Napoleão Casado Arnaud Neto

Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação

Tel (61) 2028-4810 ou 2028-4809

e-mail: luis.napoleao@codevasf.gov.br
