




MODERNIZAÇÃO DOS AEROPORTOS NACIONAIS

Setembro/2013

AEROPORTOS

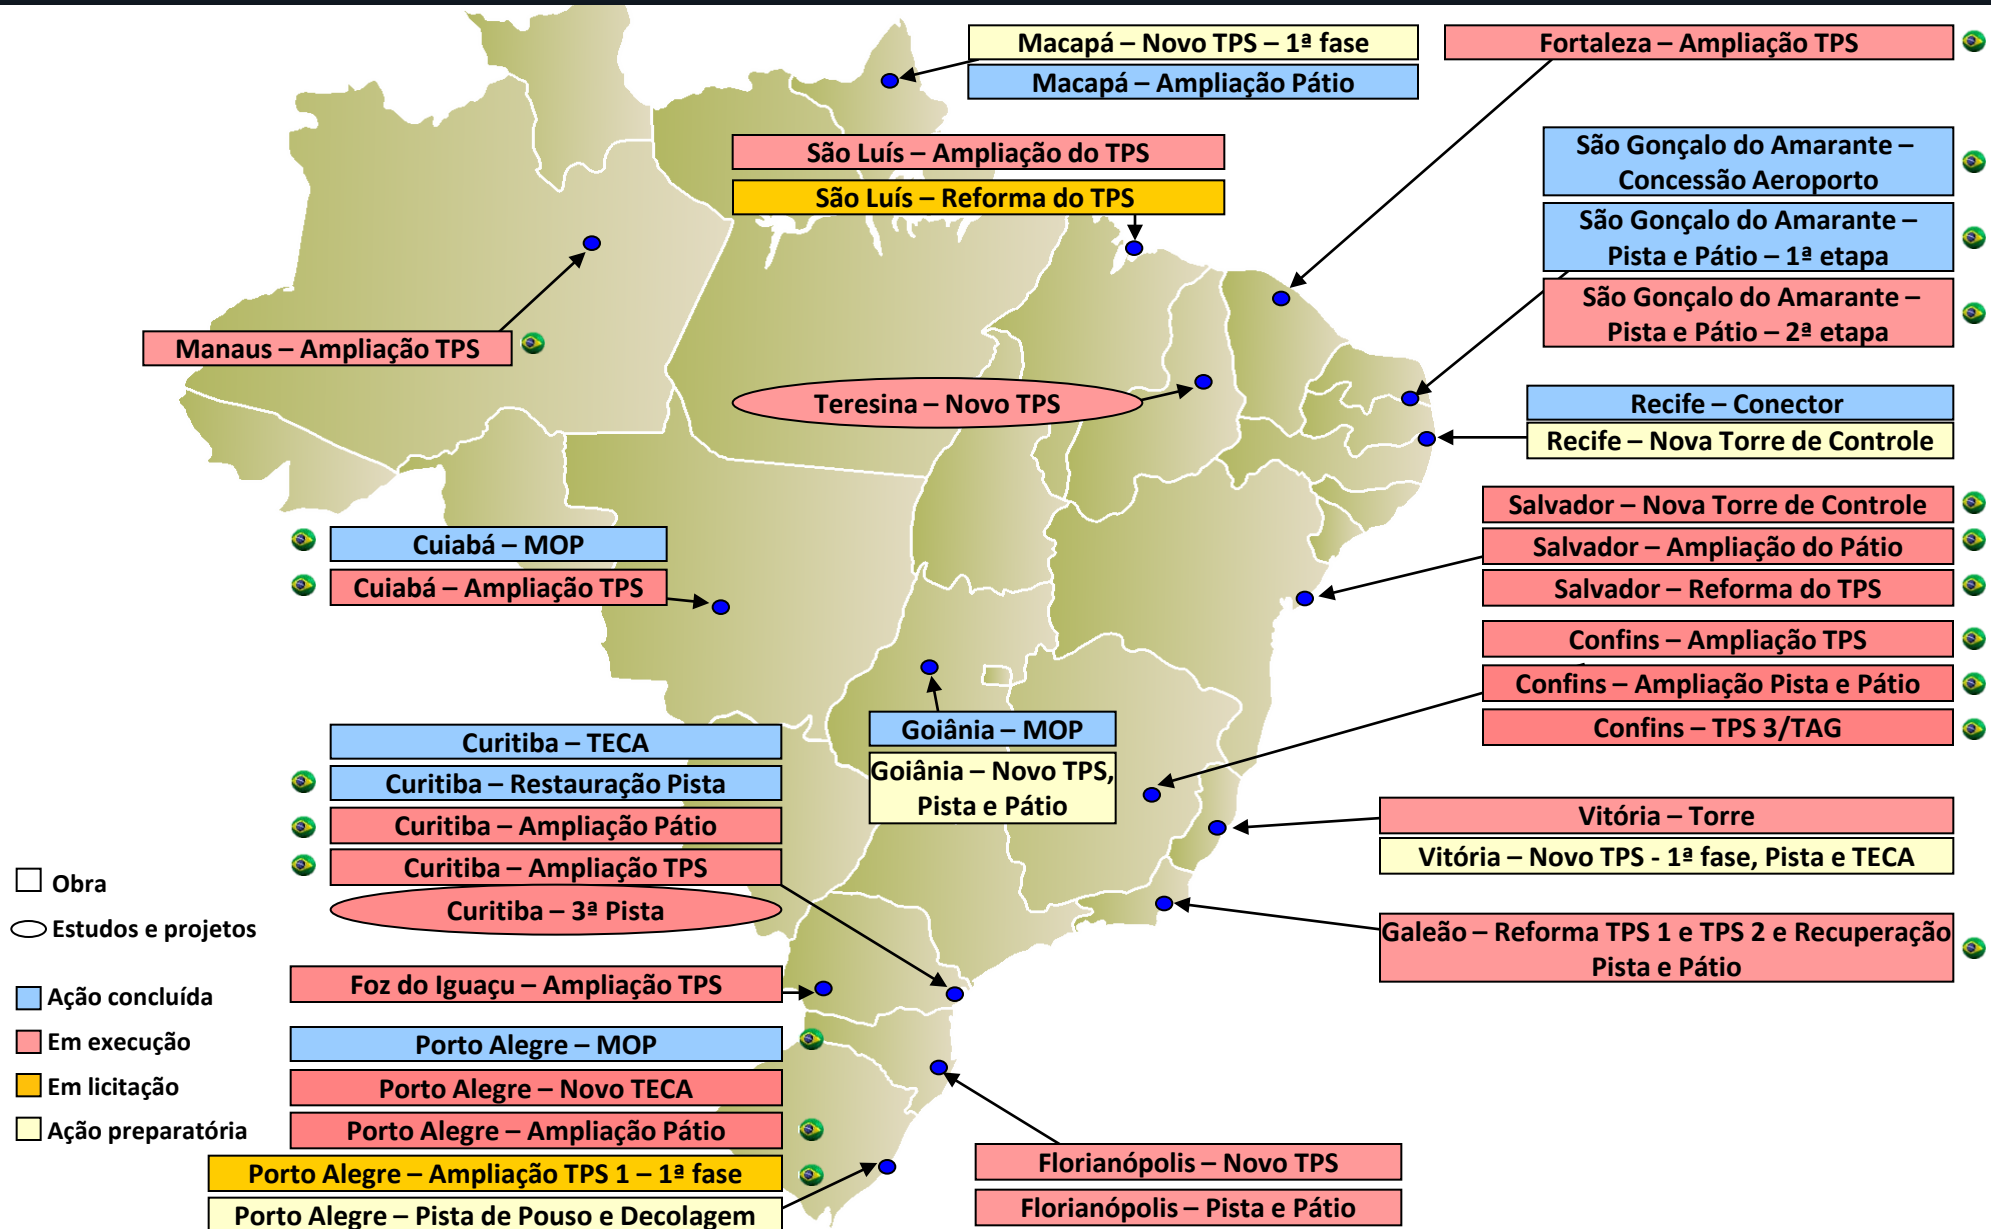

MANAUS



Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	6,4	13,5
Demanda (milhões)	3,0	4,0

1

MANAUS

TPS e Sistema Viário



Descrição: Reforma, Modernização e Ampliação do Terminal de Passageiros e Adequação do Sistema Viário

Intervenção: TPS e Sistema Viário

Investimento PAC 2: R\$ 444,46 mi

Meta: TPS 54.258m² **Capacidade:** 7,1 milhões pax/ano

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído					Concluído		* 28/jun/2011	16/nov/2011	05/dez/2013

 Etapa atual



4

MACAPÁ TPS



Descrição: Novo Terminal de Passageiros, Sistema Viário, Edificações de Apoio e Obras Complementares (1ª etapa)

Intervenção: TPS, Sistema Viário

Investimento PAC 2: R\$ 114,95 mi

Meta: TPS 19.400m² (1ª etapa) / Estacionamento 20.388m²

Capacidade: 4,5 milhões pax/ano

Situação: Ação Preparatória

Projeto (complementação)				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Licitação Concluída		L 30/ago/2013	L 28/nov/2013	Dispensada	15/out/2013	15/jan/2014	05/12/2012	01/fev/2014	30/jun/2015
E 27/abr/2012	E 20/set/2013	E 26/dez/2013	E 21/mai/2015						

 Etapa atual



MACAPÁ

Pátio de Aeronaves



Descrição: Ampliação das Pistas de Táxi e Pátio de Aeronaves

Intervenção: Pátio e Pista

Investimento PAC 2: R\$ 7,92 mi

Meta: Pátio 10.976m² / Taxiway 27.114m²

Situação: Concluído

Projeto (complementação)				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído				Dispensada	Concluído		05/12/2012	Concluído em 25/jul/2013	

 Etapa atual



SALVADOR



1 TPS

2 Pátio de Aeronaves

3 Torre de Controle

Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	13,0	13,0
Demanda (milhões)	8,3	10,8

SALVADOR

TPS



Descrição: Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros

Intervenção: TPS

Investimento PAC 2: R\$ 93,53 mi

Meta: 69.750m²

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído		30/jul/2012	30/set/2013	Dispensada	Concluída		Dispensada	21/jan/2013	15/jan/2014

 Etapa atual



SALVADOR

Pátio de Aeronaves



Descrição: Ampliação do Pátio de Aeronaves

Intervenção: Pátio

Investimento PAC 2: R\$ 17,56 mi

Meta: 11.750m²

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído				Dispensada	Concluído		Dispensada	25/set/2012	15/set/2013

 Etapa atual



SALVADOR

Torre de Controle



Descrição: Construção da Torre de Controle

Intervenção: Torre de Controle

Investimento PAC 2: R\$ 16,14 mi

Meta: 440m²

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído				Dispensada	Concluído		Dispensada	18/jun/2012	09/dez/2013

Etapa atual



FORTALEZA



Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	6,2	8,6
Demanda (milhões)	5,6	7,4

1

FORTALEZA

TPS e Sistema Viário



Descrição: Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves e Adequação do Sistema Viário
Intervenção: TPS, Pátio e Sistema Viário

Investimento PAC 2: R\$ 311,32 mi

Investimento Pós 2014: R\$ 143,00 mi

Capacidade: 2,4 milhões pax/ano


Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído		L Concluída		Dispensada	Concluída		26/jul/2013	Concluída	
		E 04/jun/2012	E 31/mar/2014					TPS 04/jun/2012	TPS 31/mar/2014

 Etapa atual



RECIFE

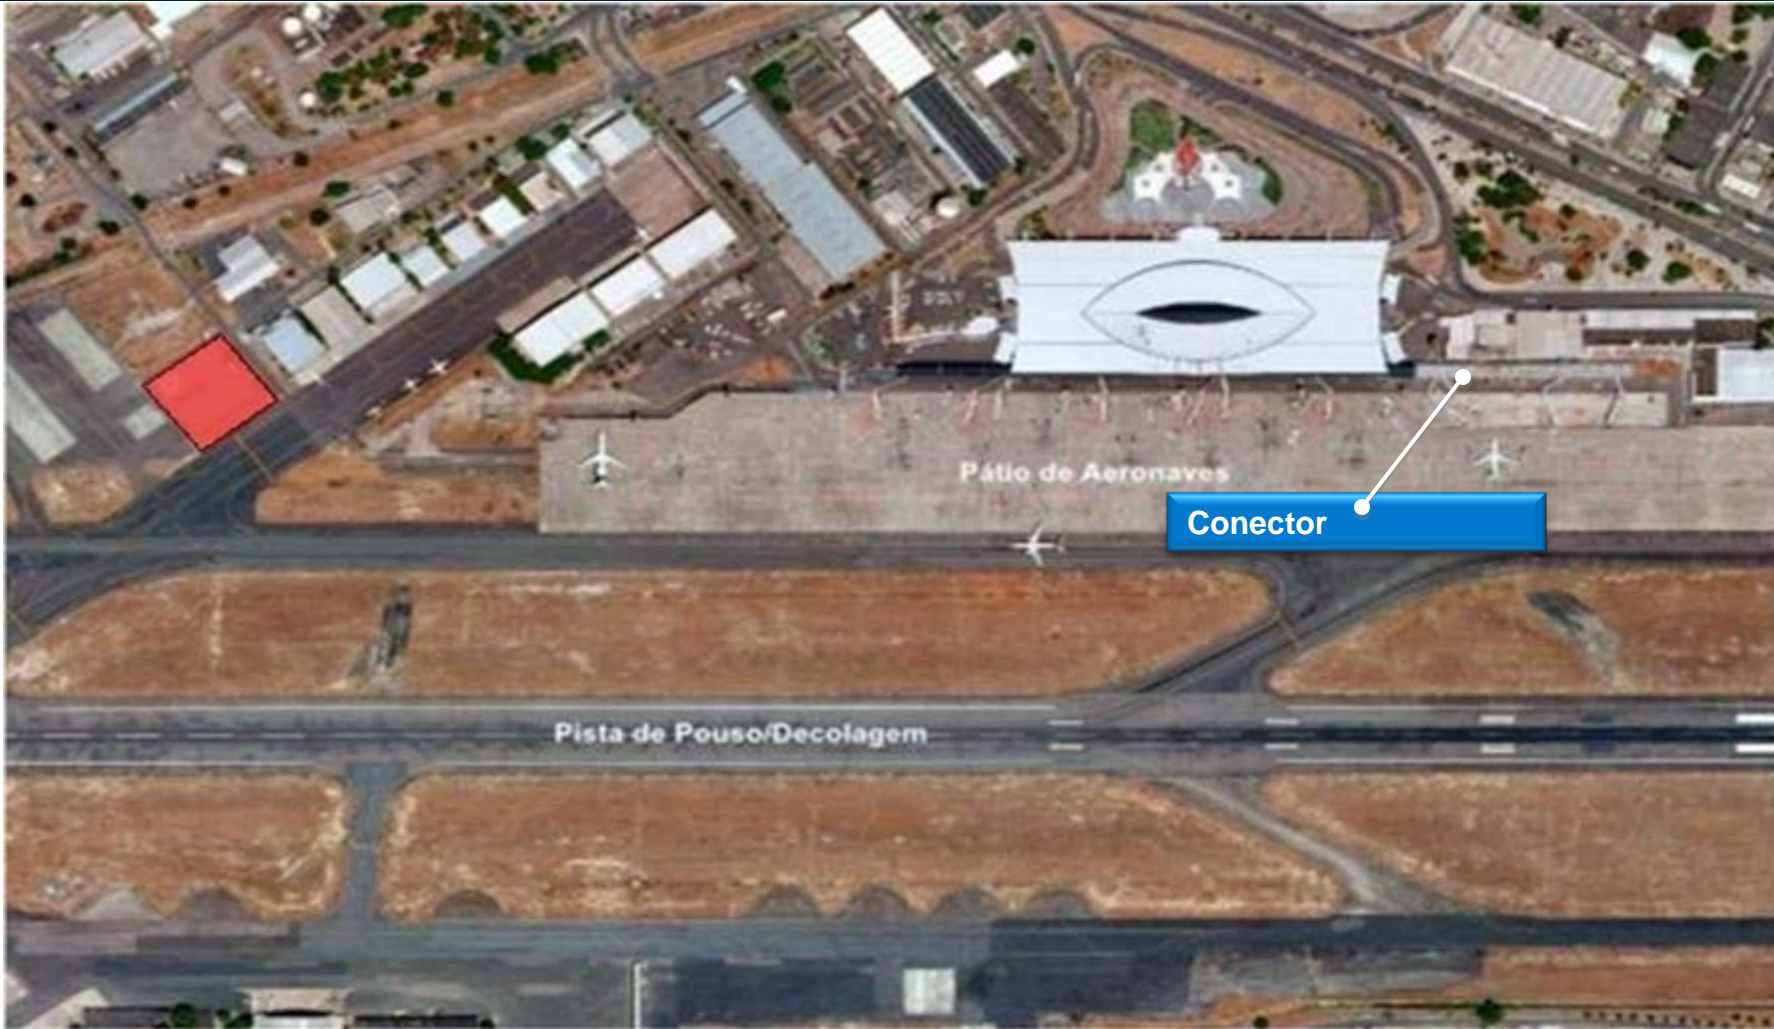

Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	16,5	16,5
Demanda (milhões)	6,3	8,7

RECIFE

Conector



Descrição: Construção e Instalação de Conector

Intervenção: Conector

Investimento PAC 2: R\$ 4,88 mi

Meta: 2.600m²

Situação: Concluído

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
								Concluído	

 Etapa atual



NATAL SÃO GONÇALO DO AMARANTE



- 1 PISTA E PÁTIO
- 2 TPS - CONCESSÃO

- PAC
- Concessão

Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	-	5,8
Demanda (milhões)	-	4,1

1

NATAL

SÃO GONÇALO DO AMARANTE - Pista e Pátio



Descrição: Execução dos Serviços de Terraplanagem das Pistas de Taxiamento e do Pátio de Aeronaves, Execução de Canaletas do Sistema de Drenagem do Lado Ar, CBUQ (Binder) das Pistas de Taxiamento, CBUQ (Capa) da Pista de Pouso e Infraestrutura de Balizamento nas Bordas Internas das Pistas

Intervenção : Pista e Pátio

Investimento PAC 2: R\$ 113,03 mi

Situação: Em Obras


Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra (2ª etapa)	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
				09/dez/2004			* 31/jul/2009	02/mai/2011	02/nov/2013

 Etapa atual



TERESINA

1 Projeto do novo TPS, Acesso Viário e Estacionamento de Veículos




Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	1,2	2,0
Demanda (milhões)	1,0	1,5

1

TERESINA

Projetos do Novo TPS

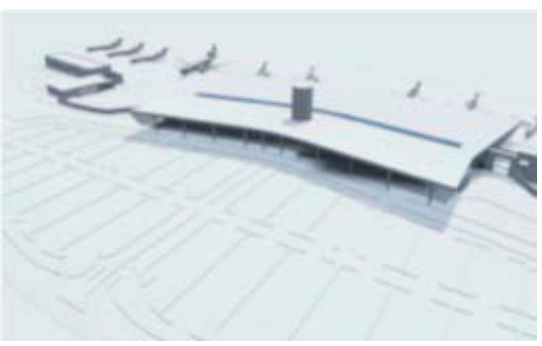


Descrição: Projetos do Novo TPS, acesso viário, estacionamento de veículos e edificações complementares

Intervenção: Projeto

Investimento PAC 2: R\$ 3,13 mi

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Estudo de alternativas ao projeto do Novo TPS concluído em 29/Jul/2013				* 08/mar/2012					


 Etapa atual



SÃO LUÍS

1 Ampliação do Terminal de Passageiros

2 Reforma do Terminal de Passageiros



Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	3,4	5,9
Demanda (milhões)	1,8	4,0

1

SÃO LUÍS

Ampliação do TPS



Descrição: Ampliação do Terminal de Passageiros com Módulos Operacionais de Desembarque, Embarque e Saguão.

Intervenção: TPS

Atual: 6.200m² **Ampliação:** 4.980m²

Investimento PAC 2: R\$ 25 mi

Situação: Em Obras

Projetos				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
06/mai/2013	06/set/2013	06/mai/2013	06/set/2013		Concluída		10/mai/2013	05/ago/2013	30/jul/2014

Etapa atual



SÃO LUÍS

Reforma do TPS



Descrição: Instalação do Forro no Saguão e Construção de Segunda Via Frontal ao Terminal, Ampliação do Estacionamento e Implantação de Duas Novas Pontes de Embarque.

Intervenção: TPS e Estacionamento

Investimento PAC 2: R\$ 9,85 mi

Situação: Em licitação

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluir a elaboração dos projetos até 20/set/2013					Forro 25/jul/2013	Forro 30/set/2013	Dispensada	Forro 30/out/2013	Forro 30/mai/2014
					Estacionamento e Via TPS 30/set/2013	Estacionamento e Via TPS 31/out/2013		Estacionamento e Via TPS 29/nov/2013	Estacionamento e Via TPS 31/jul/2014
Conclusão dos estudos para implantação da pontes de embarque até 10/out/2013					Pontes de Embarque	Pontes de Embarque		Pontes de Embarque	Pontes de Embarque

 Etapa atual



CUIABÁ

1 Reforma e Ampliação do TPS , Adequação do Sistema Viário e Estacionamento

2 Módulo Operacional



Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	2,5	5,7
Demanda (milhões)	2,6	3,3

CUIABÁ

TPS, Sistema Viário e Estacionamento



Descrição: Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros, Adequação do Sistema Viário e Construção de Estacionamento

Intervenção: TPS, Sistema Viário e Estacionamento

Investimento PAC 2: R\$ 98,68 mi

Meta: TPS 7.740m² / Estacionamento 4.335m²

Situação: Em Obras (2ª Fase)

Capacidade: 3,2 milhões pax/ano

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo			Início	Término		Concessão	Início
Início	Término	Início	Término	Concessão			Início		
Concluído (1ª Fase)				25/out/2010	Concluída (1ª Fase)		23/mar/2012	1ª fase Concluída em 30/nov/2012	
Concluído (2ª Fase)					Concluída (2ª Fase)			13/dez/2012 (2ª Fase)	TPS 30/dez/2013 Setor C 24/abr/2014 (2ª Fase)

 Etapa atual



CUIABÁ

Módulo Operacional



Descrição: Implantação do Módulo Operacional

Intervenção: MOP (Sala de Desembarque)

Investimento PAC 2: R\$ 2,53 mi

Meta: 675m²

Capacidade: 480 mil pax/ano


Situação: Concluído

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído								Concluído	

 Etapa atual



GOIÂNIA

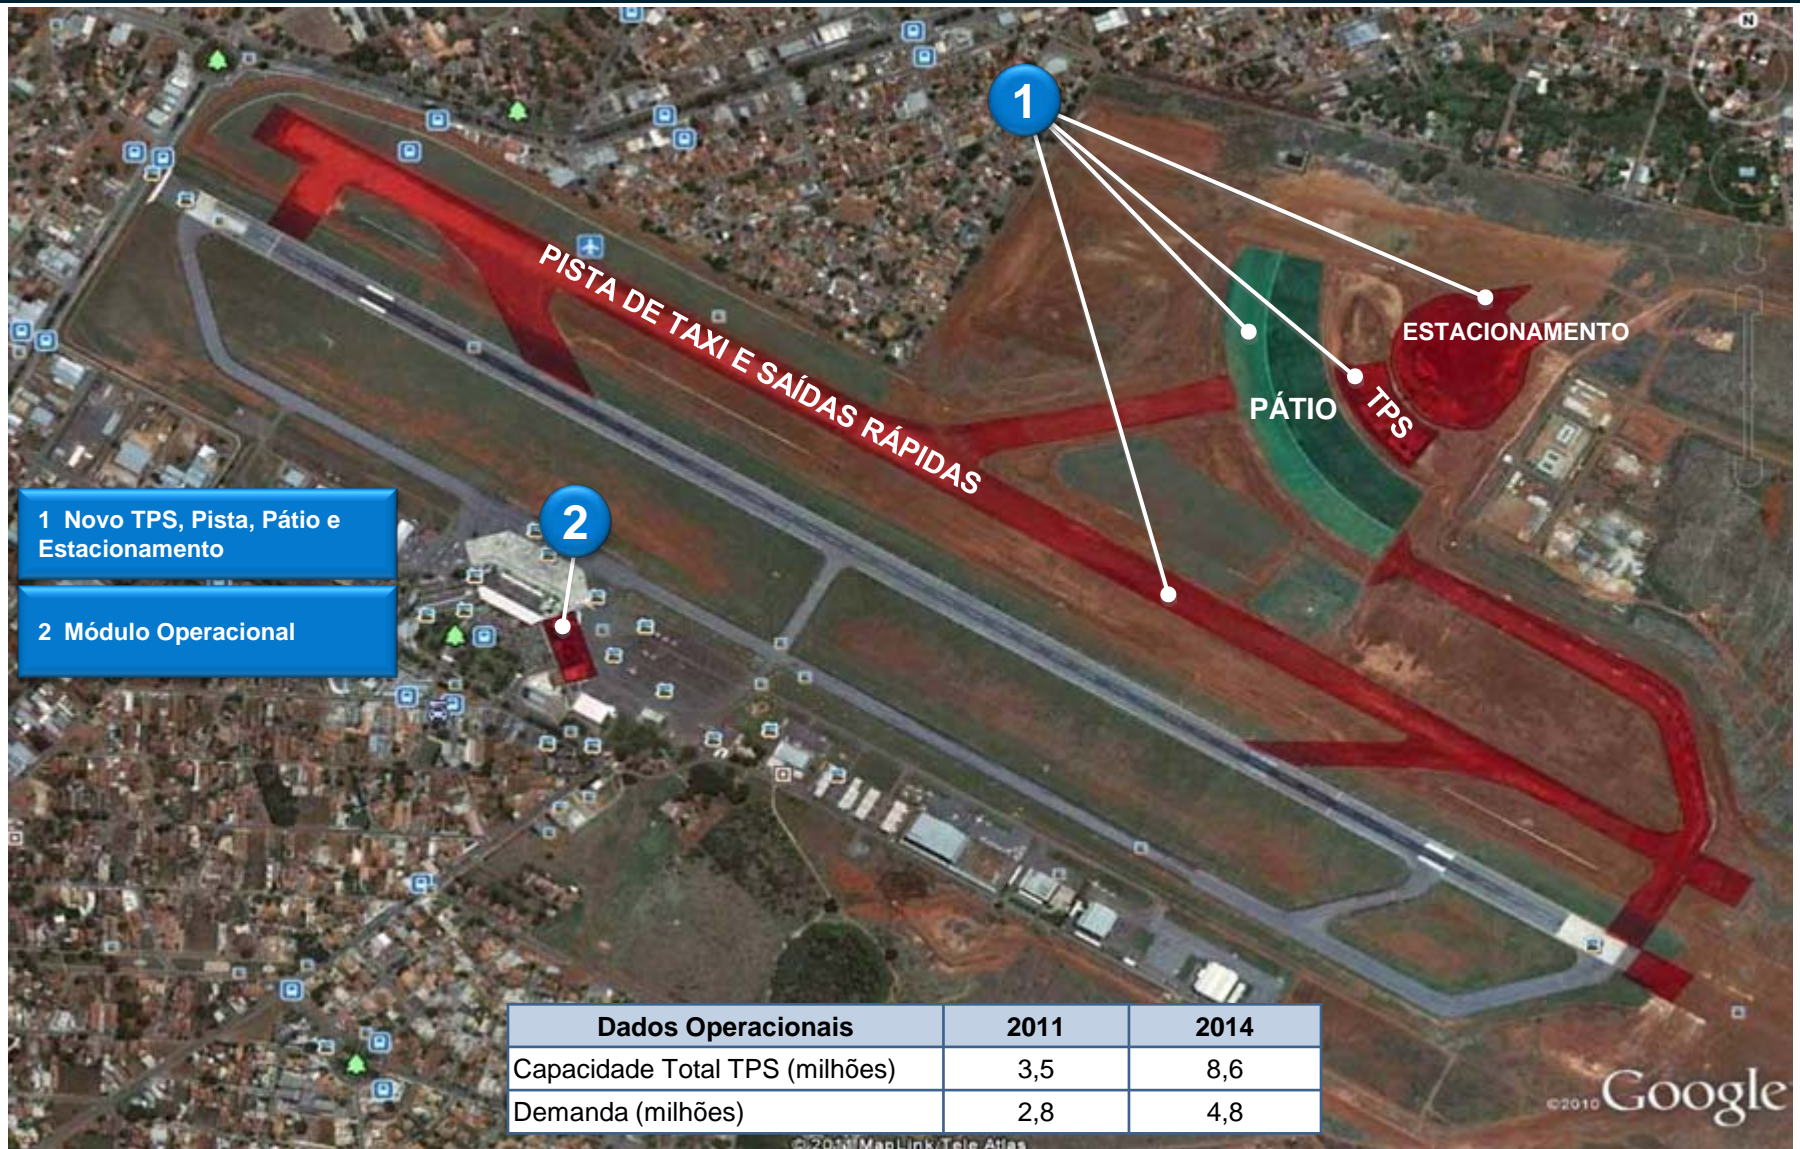

1

GOIÂNIA

Novo Complexo Aeroportuário



Descrição: Novo Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves, Pistas de Táxi, Estacionamento de Veículos, Sistema Viário e Infraestrutura de Utilidades

Intervenção: TPS, Pátio, Pistas, Estacionamento e Sistema Viário

Investimento PAC 2: R\$ 284,94 mi

Meta: TPS 26.000m² / Estacionamento 66.050m² / Pátio 58.660m² / Taxiway 34.704m²

Capacidade: 5,1 milhões pax/ano

Situação: Ação Preparatória

Projeto (revisão e complementação)				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra (TPS)	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído (elaborado pelo Consórcio)		Infra E 17/jul/2013	Infra E 30/out/2013	Dispensada	Retomada pelo Consórcio		25/jul/2013	TPS 18/set/2013	TPS 12/mar/2015
		TPS Concluído						INFRA 17/fev/2014	INFRA 30/dez/2014

 Etapa atual



GOIÂNIA

Módulo Operacional



Descrição: Implantação do Módulo Operacional

Intervenção: MOP

Investimento PAC 2: R\$ 2,57 mi

Meta: 1.200m²

Situação: Concluído

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
								Concluído	

 Etapa atual



RIO DE JANEIRO GALEÃO



Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	17,4	43,2
Demanda (milhões)	14,9	20,2

1

RIO DE JANEIRO

GALEÃO - Reforma do TPS 1



Descrição: Reforma do Terminal de Passageiros 1 e Obras Complementares


Intervenção: TPS 1

Investimento PAC 2: R\$ 198,36 mi

Meta: 147.834m² **Capacidade:** 12,8 milhões pax/ano

Situação: Em Obras


Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo (Setores A,B e C)							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Obra TPS 1 Concluído		02/mai/201220/set/2013		Dispensada	Concluída		Dispensada	20/ago/2012	Setor A 27/set/2013 Setor B 23/abr/2014 Setor C 28/nov/2014
								Obras Complementares (14 lotes)	

 Etapa atual



RIO DE JANEIRO

GALEÃO - Reforma do TPS 2

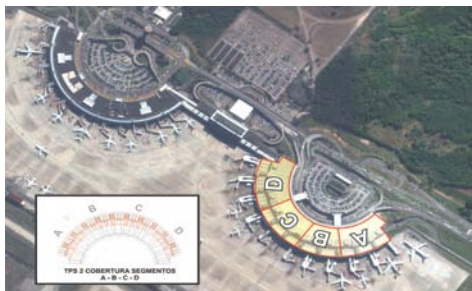

Descrição: Reforma do Terminal de Passageiros 2

Intervenção: TPS 2

Investimento PAC2: R\$ 156,39 mi

Investimento Pós 2014: R\$ 7,27 mi

Meta: TPS 2 48.078m²

Situação: Em Obras

Capacidade: 13 milhões pax/ano

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
30/mar/2009	30/nov/2011	30/mar/2009	30/nov/2011	Dispensada	1ª Etapa Concluída		Dispensada	1ª Etapa Concluída	
					1ª Etapa (Complementação) Concluída			1ª Etapa (Complementação) Obra Civil 03/jul/2013 Esquadrias 01/jul/2013	1ª Etapa (Complementação) Obra civil 25/abr/2014 Esquadrias 26/abr/2014
					2ª Etapa A (Ar Condicionado) Concluída			2ª Etapa A 17/ago/2012	2ª Etapa A 14/out/2013
					2ª Etapa B (Instalações Elétricas) Concluída			2ª Etapa B 29/nov/2012	2ª Etapa B 25/set/2013
					3ª Etapa (Sistemas Eletrônicos) Concluída			3ª Etapa 02/jan/2013	3ª Etapa 28/out/2013
					4ª Etapa (Sistema de Transporte de Bagagens) Concluída			4ª etapa 19/jul/2012	4ª etapa 10/jul/2014
					Forro Metálico, Luminárias e Acessórios			03/jun/2013	02/jun/2014

Etapa atual



RIO DE JANEIRO

GALEÃO - Sistemas de Pistas e Pátios



Descrição: Recuperação e Revitalização dos Sistemas de Pistas e Pátios

Intervenção: Alargamento das interseções

Investimento PAC 2: R\$ 85,10 mi

Meta: 4.000m²

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
		Concluído		Dispensada	Concluído		Dispensada	29/out/2011	17/out/2013

 Etapa atual



BELO HORIZONTE CONFINES



1

BELO HORIZONTE

CONFINs - TPS e Sistema Viário



Descrição: Reforma, Modernização e Ampliação do Terminal de Passageiros e Adequação do Sistema Viário

Intervenção: TPS e Sistema Viário

Investimento PAC 2: R\$ 260,04 mi

Meta: TPS 7.370m²

Capacidade: 1,4 milhões pax/ano

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído		Concluído		Dispensada	Concluído		Dispensada	15/set/2011	94%
		Concluído							31/dez/2013 100% 27/abr/2014



BELO HORIZONTE

CONFINES - TPS 3/TAG



Descrição: Ampliação do TAG, Estacionamento de Veículos e Adequação do Sistema Viário

Intervenção: TPS 3/TAG

Investimento PAC 2: R\$ 26,82 mi

Capacidade: 3,9 milhões pax/ano

Situação: Em Obras

Projetos				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
L 12/mar/2013 E 28/jun/2013	L 21/jun/2013 E 26/set/2013	L 12/mar/2013 E 28/jun/2013	L 21/jun/2013 E 26/set/2013	09/jul/2012	Concluída		* 30/abr/2013	12/ago/2013	28/mar/2014

 Etapa atual



BELO HORIZONTE

CONFINs - Pista de Pouso e Sistema de Pátios

2



Descrição: Reforma e Ampliação da Pista de Pouso e do Sistema de Pátios

Intervenção: Pista e Pátio

Investimento PAC 2: R\$ 222,77 mi

Meta: Pista 600m / Pátio 256.039m²

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído				05/dez/2011	Concluída		05/dez/2011	26/fev/2013	Sistema de Pátios/Pista 30/abr2014

 Etapa atual



VITÓRIA



Dados Operacionais	2011	2014	2015
Capacidade Total TPS (milhões)	3,3	4,2	9,7
Demanda (milhões)	3,1	5,4	5,7

VITÓRIA

Torre de Controle e Seção de Combate à Incêndio



Descrição: Construção da Torre de Controle e Seção de Combate à Incêndio

Intervenção: TWR e SCI

Investimento PAC 2: R\$ 25,39 mi

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído				29/out/2004	SCI Concluído		26/set/2011	SCI Concluído em 26/abr/2013	
					TWR Concluído			TWR Concluído em 22/05/2013	

 Etapa atual



VITÓRIA

Novo TPS



Descrição: Construção do Novo Terminal de Passageiros (1ª Fase)

Intervenção: Novo TPS

Investimento PAC 2: R\$ 122,60 mi

Meta: TPS 28.000m²

Capacidade: 5,5 milhões pax/ano

Situação: Ação Preparatória

Projeto Executivo (TPS)		Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
22/fev/2013 (Consórcio)	25/out/2013 1ª etapa	29/out/2004	Cenário 1 Retomada pelo Consórcio		26/set/2011	Cenário 1 15/jan/2014	Cenário 1 15/nov/2015

 Etapa atual



VITÓRIA

Pista de Pouso e Pátio de Aeronaves

Descrição: Construção da Pista de Pouso e Decolagem 01/19 e Pátio de Aeronaves

Intervenção: Pista e Pátio

Investimento PAC 2: R\$ 189,55 mi

Meta: Pátio 92.800m² / Pista 2.058 x 45m

Situação: Ação Preparatória



Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
-	-	02/jul/2013 * Infraestrutura (Consórcio)	29/out/2013 Infraestrutura (Consórcio)	29/out/2004	Cenário 1 Retomada		26/set/2011	Cenário 1 15/jan/2014	Cenário 1 15/nov/2015

Etapa atual



VITÓRIA

Novo Terminal de Cargas



Descrição: Construção do novo terminal de cargas, pátio de aeronaves, acesso viário, aterro de sobrecarga na área do TECA e pátio de aeronaves, galpão de armazenagem, edifício administrativo, edificações de apoio, reservatório elevado, utilidades, áreas de estacionamento.

Intervenção: Teca

Investimento PAC 2: R\$ 54,75 mi **Meta:** 18.198m²

Situação: Ação Preparatória

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído		L Concluído			10/jan/2014	10/abr/2014	26/set/2011	10/mai/2014	09/mai/2016
		E 01/abr/2013	E 27/dez/2013						

 Etapa atual



CURITIBA



Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	7,9	10,4
Demanda (milhões)	6,9	8,4

1

CURITIBA

Ampliação do Pátio



Descrição: Obra de Ampliação do Pátio, Infraestrutura, Macrodrenagem e Obras Complementares.

Intervenção: Pátio

Investimento PAC 2: R\$ 27,21 mi

Meta: Pátio 59.879m²

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído					Concluído		29/ago/2013	05/jul/2011	10/out/2013

 Etapa atual



CURITIBA

Restauração da Pista de Pouso



Descrição: Restauração da Pista de Pouso e Decolagem e de Táxi e Obras Complementares

Intervenção: Pista

Investimento PAC 2: R\$ 19,06 mi

Meta: Pista de pouso: 2.215 x 45 m

Situação: Concluído

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído					Concluído		Dispensada	Concluída	

 Etapa atual



CURITIBA

TPS e Sistema Viário



Descrição: Ampliação do Terminal de Passageiros e Sistema Viário

Intervenção: TPS e Sistema Viário

Investimento PAC 2: R\$ 239,14 mi

Investimento Pós 2014: R\$ 34,71 mi

Meta: TPS 18.800m²

Capacidade: 2,6 milhões pax/ano

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
PB Reforma e Ampliação 12/mar/2013	PB Reforma 22/set/2013 PB Ampliação 25/nov/2013	PE Reforma e Ampliação 12/mar/2013	PE Reforma 04/out/2013 PE Ampliação 15/dez/2013	Dispensada	Concluída		29/ago/2013	Reforma e Ampliação 10/mai/2013	Reforma e Ampliação 30/mai/2014 40%

100% da Obra – março/2016

 Etapa atual



CURITIBA

Terminal de Cargas



Descrição: Reforma e Ampliação do Terminal de Cargas

Intervenção: Terminal de Cargas

Investimento PAC 2: R\$ 20,72 mi

Meta: 17.000m² (Ampliação 5.000m²)

Situação: Concluído

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído		Concluído			Concluído		19/set/2007	Concluído	

 Etapa atual



CURITIBA

Projeto 3ª Pista



Descrição: Projeto de Construção da 3ª Pista de Pouso

Intervenção: Projeto

Investimento PAC 2: R\$ 14,28 mi

Meta: Projeto

Situação: Em Execução - Estudo Preliminar

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
EP L 24/jan/2013 E 05/jun/2013	EP L 17/abr/2013 E 31/dez/2013								
L 14/dez/2013	L 03/fev/2014	L 14/dez/2013	L 03/fev/2014	*					
E 03/mar/2014	E 18/dez/2014	E 03/mar/2014	E 18/dez/2014						

 Etapa atual



PORTO ALEGRE



Dados Operacionais	2011	2014
Capacidade Total TPS (milhões)	13,1	18,9
Demanda (milhões)	7,8	11,7

1

PORTO ALEGRE

TPS 1



Descrição: Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros 1 (1ª Fase)

Intervenção: TPS

Investimento PAC 2: R\$ 246,3 mi

Meta: 60.300m²

Capacidade: 3,5 milhões pax/ano

Situação: Em Licitação

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Licitação Concluída				Dispensada	10/jun/2013	29/ago/2013	19/ago/2013	16/set/2013	30/mai/2014 30%
Concluído									

100% da Obra – agosto/2016

Etapa atual



PORTO ALEGRE

Sistema de Pátios e Pistas de Táxi



Descrição: Ampliação do Sistema de Pátios e Pistas de Táxi

Intervenção: Pátio e Pista de Táxi

Investimento PAC 2: R\$ 89,31 mi

Meta: Pátio 21.400m² Pistas de Táxi 28.600m²

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído				Dispensada	Concluída		19/ago/2013	19/set/2013	14 meses



PORTO ALEGRE

Pista de Pouso e Decolagem



Descrição: Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem

Intervenção: Pista

Investimento PAC 2: R\$ 223,20 mi

Meta: 920m

Situação: Ação Preparatória

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
31/dez/2013	31/jul/2015	31/dez/2013	31/jul/2015	30/jan/2009	22/set/2013	29/nov/2013	21/jan/2013	31/dez/2013	25/jul/2017

 Etapa atual



PORTO ALEGRE

Terminal de Cargas



Descrição: Novo Terminal de Cargas

Intervenção: Terminal de Cargas

Investimento PAC 2: R\$ 137,15 mi

Meta: 29.682m²

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído		13/mar/2013	20/set/2013	-	Edificações 03/nov/2013	Edificações 22/jan/2014	22/jan/2013	Edificações 01/mar/2014	Edificações 23/fev/2015
					Infraestrutura 06/out/2013	Infraestrutura 26/dez/2013		Infraestrutura 01/fev/2014	Infraestrutura 26/jan/2015

 Etapa atual



PORTO ALEGRE

Módulo Operacional



Descrição: Implantação do Módulo Operacional

Intervenção: MOP

Investimento PAC 2: R\$ 4,95 mi

Meta: 1.460m²

Capacidade: 2,3 milhão pax/ano

Situação: Concluído

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído					Concluído			Concluído	

 Etapa atual



FLORIANÓPOLIS



FLORIANÓPOLIS

Infraestrutura



Descrição: Infraestrutura para Construção do Novo Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves, Pista de Táxi, Estacionamento e Acesso Viário.

Intervenção: Infraestrutura

Investimento PAC 2: R\$ 174,00 mi

Meta(Pátio): 85.000m² (Ampliação 64.813m²)

Situação: Em obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Lotes 1 e 3 Concluído				27/dez/2006	Lotes 1 e 3 Concluído		26/nov/2012	Lotes 1 e 3 11/jun/2012	Lotes 1 e 3 30/mar/2014

 Etapa atual



FLORIANÓPOLIS

Novo Complexo Aeroportuário



Descrição: Construção do Novo Terminal de Passageiros, Edificações Complementares, CUT e Estação de Produção de água e reuso.

Intervenção: Novo Complexo Aeroportuário

Investimento PAC 2: R\$ 213,14 mi

Investimento Pós 2014: R\$ 25,77 mi

Meta: TPS 33.800m²

Capacidade: 6,7 milhões pax/ano

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo			Início	Término		Início	Término
Início	Término	Início	Término	Concessão			Início		
Concluído				27/dez/2006	Lotes 2 e 5 Concluída		26/nov/2012	Lotes 2 e 5 27/dez/2012	Lotes 2 e 5 17/dez/2014
					Lote 4 Pontes Embarque 25/jan/2013	Lote 4 Pontes Embarque 16/abr/2013		Lote 4 Pontes Embarque 27/mai/2013	Lote 4 Pontes Embarque 20/ago/2014
					Lote 4 Esteiras Concluída	Lote 4 Esteiras Concluída		Lote 4 Esteiras 07/ago/2013	Lote 4 Esteiras 31/jul/2014
					Lote 4 Elevadores e Escadas 10/jul/2013	Lote 4 Elevadores e Escadas 25/nov/2013		Lote 4 Elevadores e Escadas 09/dez/2013	Lote 4 Elevadores e Escadas 11/dez/2014

 Etapa atual



FOZ DO IGUAÇU



1

FOZ DO IGUAÇU

Reforma e Ampliação do TPS



Descrição: Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros

Intervenção: TPS

Investimento PAC 2: R\$ 59,68 mi

Meta: TPS - Reforma 9.900m²
Ampliação 4.200m²

Capacidade: 1,2 milhões pax/ano

Situação: Em Obras

Projeto				Licença Prévia	Licitação da Obra		Licença de Instalação	Execução da Obra	
Básico		Executivo							
Início	Término	Início	Término	Concessão	Início	Término	Concessão	Início	Término
Concluído		Concluído			Concluído		Dispensada	13/mar/2012	12/nov/2013

Etapa atual

