

SENADO FEDERAL

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

RELATÓRIO FINAL

Brasília, novembro de 1995

SUMÁRIO

	Pág.
1. Introdução	5
2. Apresentação	7
3. Constituição da Comissão	10
4. Objetivos	11
5. Desenvolvimento dos Trabalhos	13
6. Resultados das Inspeções Realizadas e Definição das Obras Prioritárias em Cada Unidade da Federação	21
6.1 - Estado do Acre	23
6.2 - Estado de Alagoas	23
6.3 - Estado do Amapá	26
6.4 - Estado do Amazonas	28
6.5 - Estado da Bahia	28
6.6 - Estado do Ceará	30
6.7 - Distrito Federal	30
6.8 - Estado do Espírito Santo	33
6.9 - Estado de Goiás	35
6.10 - Estado do Maranhão	35
6.11 - Estado do Mato Grosso	38
6.12 - Estado do Mato Grosso do Sul	40
6.13 - Estado de Minas Gerais	40
6.14 - Estado do Pará	43
6.15 - Estado da Paraíba	43
6.16 - Estado do Paraná	46
6.17 - Estado de Pernambuco	47
6.18 - Estado do Piauí	49
6.19 - Estado do Rio Grande do Norte	49
6.20 - Estado do Rio Grande do Sul	51
6.21 - Estado do Rio de Janeiro	53
6.22 - Estado de Rondônia	54
6.23 - Estado de Roraima	54
6.24 - Estado de Santa Catarina	57
6.25 - Estado de São Paulo	59
6.26 - Estado de Sergipe	61
6.27 - Estado do Tocantins	63
7. Considerações Gerais	66
8. Recomendações	70
9. Proposições Finais	74
10. Encaminhamento	75
Anexo "A" - Inventário das Obras Inacabadas	(77 a 392)
Anexo "B" - Listagem das Obras Registradas no TCU com Índícios de Irregularidades	393
Anexo "C" - Quadros de Consolidação e Análise	399

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0)$.

2. In the second part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to $f(0)$.

3. The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0)$.

4. In the fourth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to $f(0)$.

5. The fifth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0)$.

6. In the sixth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to $f(0)$.

7. The seventh part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0)$.

8. In the eighth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to $f(0)$.

9. The ninth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0)$.

10. In the tenth part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to $f(0)$.

1. INTRODUÇÃO

Uma das funções mais importantes do Poder Legislativo nos países democráticos, senão a mais importante, é definir, com base em proposta do Poder Executivo, a correta e adequada alocação dos recursos públicos, fiscalizar a sua aplicação e avaliar os seus resultados, como forma de exercer a vontade popular, delegada aos Parlamentares por meio do voto.

A ação fiscalizadora do Congresso Nacional é exercida por diversas formas, e uma delas é, exatamente, acompanhar a aplicação dos recursos alocados aos diversos programas de trabalho na Lei Orçamentária e verificar se estão sendo devidamente respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, derivadas dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Nesse sentido, uma obra paralisada representa um claro desrespeito ao princípio da moralidade pública, em razão do desperdício de recursos sabidamente escassos, sem falar na possibilidade de manipulação político-eleitoral da obra inacabada, com a promessa de busca de novos recursos para sua conclusão. Acresce-se que inúmeras dessas obras são financiadas com recursos externos, cujos contratos exigem a alocação de contrapartidas nacionais em prazos certos, sob pena de imposição de taxas e comissões de permanência.

Assim, o Senado Federal, diante da constatação da existência de milhares de obras que foram iniciadas, absorveram grande soma de recursos, e não estão cumprindo a sua finalidade, decidiu criar a presente Comissão com o objetivo básico de realizar um inventário dessas obras, analisar as causas de suas paralisações, avaliar as suas situações e propor soluções.

A Comissão entende que também é dever do Senado Federal identificar eventuais indícios de irregularidades na aplicação dos recursos liberados para obras públicas, quer diretamente pela União, quer por intermédio de convênios, ajustes e termos similares firmados com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Os casos identificados devem ser comunicados ao Tribunal de Contas da União para a realização de auditorias específicas, com o objetivo de definir responsabilidades e avaliar o dano causado ao Erário, para os fins de

ressarcimento ao Tesouro Nacional, como também ao Ministério Público da União, para proposição das ações cíveis e criminais que porventura sejam cabíveis.

Registre-se, por oportuno, que a corrupção não é um problema exclusivo do Brasil, mas ocorre em todas os países; o que nos difere é a impunidade. Mas também é bom notar que o combate à corrupção vem ganhando força em várias partes do mundo, do qual a Operação Mãos Limpas, que se desenrola na Itália, é um bom exemplo.

Em recente visita àquele País, tivemos a oportunidade de nos encontrar, no Tribunal de Milão, com os Procuradores encarregados de conduzir aquela operação, Dr. Greco, Dr. D'Ambrozio e Dr. Borelli, dentre outros, ocasião em que nos foram transmitidas as experiências adquiridas ao longo do processo e entregue vasto material contendo propostas para combater a corrupção, centradas nos seguintes pontos: a) um decisivo endurecimento das penalidades por corrupção e concussão; b) medidas de abrandamento de penas para aqueles que, espontaneamente, denunciem fatos delituosos dos quais fazem parte; e c) medidas patrimoniais destinadas a confiscar os bens resultantes dos delitos cometidos contra o patrimônio público.¹

Vale acentuar, por fim, que, no Brasil, também o Tribunal de Contas da União tem-se preocupado com o problema das obras inacabadas, como se depreende do oportuno alerta contido nos Itens 8.4.1 e 8.4.2, da Decisão nº 66/95 - TCU - Plenário, datada de 22/02/95², bem como do levantamento das obras inacabadas na Região Nordeste, adiante referido.

¹ O material entregue à comissão de Senadores será encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle para a adoção das medidas que julgar pertinentes.

² É a seguinte a redação dos itens da decisão do TCU acima referida: "8.4 - dar conhecimento deste Relatório.....aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para a adoção das medidas que entenderem cabíveis, no âmbito de suas atribuições, alertando-os, outrossim, para os seguintes aspectos:

8.4.1 - os efeitos maléficos, observados pela Equipe quando de sua inspeção no DNOCS, oriundos da aprovação de emendas ao orçamento sem o necessário amparo em prévio projeto básico de viabilidade técnica e análise de custo/benefício; e

8.4.2 - o prejuízo causado aos cofres públicos em função da liberação de recursos orçamentários para novas obras/ações em detrimento da conclusão de obras já iniciadas e posteriormente paralisadas.

2. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório consiste, além deste texto, de um inventário das obras inacabadas que a Comissão pôde identificar e cadastrar ao longo de seus trabalhos, complementados com as inspeções realizadas em todas as Unidades da Federação, de acordo com a metodologia adiante explicitada.

Seria cabível indagar sobre o montante de recursos que o Brasil desperdiçou nessas obras. A Comissão também fez essa pergunta às autoridades responsáveis, mas não conseguiu respostas satisfatórias em razão da falta de controle, agravada pelas constantes mudanças de nossa moeda ocorridas nos últimos anos. Através de artifícios matemáticos, pudemos estimar que, em 1.213 das 2.214 obras cadastradas pela Comissão, foram aplicados mais de R\$ 10,17 bilhões, permitindo concluir que tenham sido gastos mais de R\$ 15,00 bilhões no total.

Por outro lado, sabemos que esse inventário está incompleto, pois existem obras inacabadas que não pudemos registrar em razão de não termos recebido, das autoridades competentes, as respectivas informações. Por isso, nosso propósito é que o Senado Federal dê continuidade a esse trabalho, até que se consiga relacionar todas as obras paralisadas no País.

Tivemos oportunidade de testemunhar, nas mais de cem obras vistoriadas, quanto dinheiro o Brasil já desperdiçou - ou em projetos megalômanos, ou em milhares de pequenas obras iniciadas - não em função do real interesse da sociedade, mas de grupos que visam exclusivamente aos interesses particulares, ou mesmo, em obras efetivamente necessárias à população, mas que não puderam ser concluídas por falta de recursos orçamentários.

Encontramos obras inacabadas de todas as idades e em diversos estágios de abandono. A Ferrovia Transnordestina, por exemplo, deve ser considerada a obra inacabada mais antiga do País, pois sua construção teve início ainda no Império e continua inconclusa, a desafiar administrações e gerações.

O prédio da Justiça Estadual do Amazonas, em Manaus, está há tanto tempo abandonado - quase 20 anos - que sua eventual retomada deverá ser precedida de uma avaliação técnica, para que sejam determinadas as possibilidades de aproveitamento de sua

estrutura, e a readequação do projeto às atuais necessidades da Justiça e suas Varas.

Outro exemplo que vale ressaltar é o da ponte do Barracão, sobre o Rio Uruguai, na BR-470, divisa dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, cuja falta de conclusão telmosamente impede que uma ponta do asfalto, na beira do rio, comunique-se à outra margem a poucos metros.

É o caso, também, da Urbanização do Canal do Beírol, em Macapá/AP, onde foram consumidos quase cinco milhões de dólares, sendo que a obra que lá se encontra não vale um décimo desse valor, o que denota a existência de desvio de recursos. Desperdício semelhante constatou-se em relação ao Canal da Maternidade, em Rio Branco, no Acre.

Também a rodovia BR-282, que permitirá a ligação de Florianópolis à Argentina, permanece com um trecho de cerca de 100km sem asfaltamento, há mais de trinta anos. O 1º Batalhão Ferroviário do Exército, sediado em Lages/SC, propõe-se a concluir, de imediato, um trecho de 32,8km, ao preço de R\$ 6.800.000,00, o que significa um custo médio de R\$ 210.000,00 por quilômetro, valor sensivelmente menor do que os de mercado, e até os da tabela do DNER. Assim, parece-nos falta de bom senso, não aproveitar essa estrutura já instalada, paga e disponível.

A chamada "Ponte da Amizade", sobre o Rio Parnaíba, entre as cidades de Teresina/PI e Timon no Maranhão, é um monumento ao desperdício e à malversação de recursos públicos, ostentando um "esqueleto", que custou quase US\$ 14,0 milhões e afronta diuturnamente a população local.

Para não nos alongarmos demasiadamente, registramos as obras do Hospital Geral de Tocantins, em Palmas, em que foram aplicados milhões de reais, não obstante ser mínima a parcela física executada. Ademais, o contrato ajustado com a empresa vencedora da licitação foi sub-rogado a outra empreiteira, escolhida não se sabe como, num procedimento administrativo que deve ser investigado.

No Anexo A estão relacionadas as obras inacabadas em cada Unidade da Federação, com informações obtidas de duas fontes diferentes: dos Ministérios e órgãos equivalentes do Poder Executivo e dos Poderes Judiciário e Legislativo da União e dos Governos Estaduais e das Prefeituras Municipais. Em alguns casos, as informações

recebidas pela Comissão foram complementadas pelas visitas e inspeções realizadas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Nos casos em que a Comissão recebeu informações de Ministério e de Governo Estadual ou Prefeitura Municipal sobre uma mesma obra, procedemos ao registro de ambas, de modo a possibilitar a oportuna comparação dos dados fornecidos.

Do Anexo B consta uma relação das obras sobre as quais o Tribunal de Contas da União registrou indícios de irregularidade, alguns dos quais já comprovados e julgados, outros ainda em tramitação.

No Anexo C estão inseridos alguns quadros contendo consolidação e análise das informações contidas no Inventário.

Esclarecemos, finalmente, que os relatórios parciais elaborados pela Senadora Emília Fernandes e pelo Senador Gerson Camata, na qualidade de relatores eventuais das 8ª e 9ª etapas de viagens da Comissão, sob a Presidência dos Senadores Edison Lobão e Arlindo Porto respectivamente, e suas informações, foram consolidadas e incluídas no presente relatório.

Agradecemos a esses colegas pelo judicioso trabalho realizado nessas viagens, durante o afastamento do Presidente e Relator titulares, por se encontrarem em viagem oficial ao exterior.

3. CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A Comissão Temporária do Senado Federal, destinada a inventariar as obras não concluídas, custeadas pela União, foi criada segundo o Requerimento nº 651, de 1995, do Senador Carlos Wilson, com fundamento nos artigos 71 e 74 do Regimento Interno desta Casa. É composta de sete membros titulares e igual número de suplentes, estando assim constituída:

PRESIDENTE: Senador CARLOS WILSON

VICE-PRESIDENTE: Senador EDISON LOBÃO

RELATOR: Senador CASILDO MALDANER

Senadores Titulares

Fernando Bezerra - PMDB/RN

Casildo Maldaner - PMDB/SC

Edison Lobão - PFL/MA

Waldeck Ornelas - PFL/BA

Carlos Wilson - PSDB/PE

Arlindo Porto - PTB/MG

Esperidião Amin - PPB/SC

Senadores Suplentes

Flaviano Melo - PMDB/AC

Gerson Camata - PMDB/ES

Joel de Hollanda - PFL/PE

Hugo Napoleão - PFL/PI

Lúcio Alcântara - PSDB/CE

Emília Fernandes - PTB/RS

José Roberto Arruda - PSDB/DF

Quanto aos prazos da Comissão, faz-se mister anotar que o Requerimento que deu ensejo à sua criação foi lido na Sessão do dia 28 de abril do corrente ano e aprovado na Sessão de 9 de maio seguinte. Os membros que a compõem foram designados no dia 18 de maio, instalando-se a Comissão logo a seguir, no dia 25 do mesmo mês, tendo sido fixado como prazo inicial de duração noventa dias. Esgotado tal período e, em razão da complexidade dos trabalhos e da necessidade de concluir o roteiro de visitas e Inspeções, a sua vigência foi prorrogada até o dia 15 de dezembro. Todavia, foi possível encerrar os trabalhos nesta data.

4. OBJETIVOS

Como já exposto, a finalidade básica desta Comissão consistiu em "inventariar as obras não concluídas de responsabilidade da União e examinar sua situação, bem como para apresentar sugestões tendentes à solução do problema".

Dentro deste escopo geral, a Comissão propôs-se a:

4.1 - Inventariar as obras inacabadas em todo o País, financiadas total ou parcialmente com recursos da União, com vistas à instituição de um Cadastro Geral de Obras do Governo Federal, para posterior acompanhamento da sua execução e avaliação pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União.

4.2 - Analisar a situação dessas obras, a data de contratação, o estágio de edificação, as razões da paralisação, preços praticados e outros dados, de maneira a permitir a elaboração de uma espécie de "Mapa do Desperdício" no qual figurarão os casos mais representativos, tudo no intuito de levar à conscientização da sociedade brasileira sobre a gravidade do problema.

4.3 - Estabelecer uma escala de prioridades para a retomada dessas obras, em conjunto com as autoridades locais e as respectivas bancadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, de forma que os Parlamentares possam melhor atuar no processo de apresentação de emendas à proposta do Orçamento Geral da União, priorizando as emendas coletivas de bancadas ou regionais. **Destaque-se que muitas dessas obras são financiadas com recursos externos, do Banco Interamericano do Desenvolvimento - BID, Banco Mundial - BIRD, Eximbank, Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW, e outras instituições internacionais, cujos empréstimos têm forte repercussão na dívida externa do País. Além disso, os contratos de empréstimos internacionais exigem contrapartidas em recursos nacionais, que devem ser alocados em prazos previamente determinados, sob pena da cobrança de taxas e comissões de permanência.**

4.4 - Apontar eventuais indícios de irregularidades na execução dessas obras, como também na gestão dos recursos liberados ao longo dos anos, para solicitação de auditorias ao Tribunal de Contas da União, a fim de que sejam definidos as causas e os responsáveis pela paralisação, o volume de recursos aplicados e/ou desviados e os

responsáveis pelos desvios, visando à propositura de ações de ressarcimento ao Erário e de outras cominações cabíveis.

4.5 - Propor legislação moralizadora na execução de obras públicas, mediante a qual se restrinja o início de uma obra caso não haja garantia dos recursos suficientes para a sua execução total, com a eliminação da chamada "janela orçamentária".

4.6 - Propor a instituição de mecanismos de acompanhamento pelo Poder Legislativo, da retomada dessas obras, e também daquelas que vierem a ser iniciadas, tanto em termos de liberação de recursos financeiros, como de execução física e avaliação dos seus efeitos sobre a população beneficiada.

4.7 - Contribuir para o aperfeiçoamento do processo orçamentário, conferindo mais consistência e credibilidade à participação dos Parlamentares. Não é razoável que o Congresso Nacional, pelo meio legítimo de emendas à proposta orçamentária, defina certas alocações de recursos e o Poder Executivo venha a vetá-las em sua quase totalidade, contingenciando o restante. Dessa forma, a Comissão entende ser necessário, iniciar-se uma nova fase da Democracia no Brasil, caracterizada pelo fortalecimento do Poder Legislativo, centrado na elaboração de um Orçamento-verdade, em lugar da "peça de ficção" hoje produzida.

Em conclusão, cumpre salientar que a modernização do Estado brasileiro envolve a ação coordenada das autoridades dos três Poderes, em todos os níveis de Governo e até da sociedade, de forma que sejam privilegiados a Ética e o interesse público em todas as suas decisões, desde as ações mais simples da rotina diária, até as mais complexas, de maior envergadura e alcance estratégico.

5. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

5.1 - Reuniões e visitas realizadas no âmbito da União

Inicialmente, foram feitas algumas reuniões internas da Comissão, com o propósito de definir a metodologia a ser empregada no desenvolvimento dos seus trabalhos. Em seguida, a Comissão reuniu-se com os Senhores Ministros de Estado titulares das Pastas onde se concentra o maior número de obras paralisadas, ou com atribuições de planejamento e orçamento, dentre as quais podemos citar:

- a) Saúde;
- b) Transportes;
- c) Planejamento e Orçamento;
- d) Educação.

Nessas audiências foram expostos os objetivos gerais da Comissão e solicitado o apoio dos Senhores Ministros, no sentido de fornecer à Comissão, em tempo hábil, as informações requeridas.

Todas as autoridades visitadas foram unânimes em reconhecer a importância da Comissão, principalmente quanto à possibilidade de o Senado Federal vir a colaborar com as autoridades federais no processo de discussão e elaboração do Orçamento Geral da União, bem como fiscalizar e avaliar a sua aplicação.

5.2 - Metodologia Utilizada

Empregou-se como metodologia básica o levantamento das informações sobre as obras paralisadas junto às autoridades responsáveis por sua execução nos três níveis de governo, mediante o encaminhamento de formulários que foram preenchidos e restituídos à Comissão.

No âmbito da União, foram consultados os Ministros de Estados e autoridades equivalentes do Poder Executivo e os Presidentes dos Tribunais Superiores do Poder Judiciário. Em relação aos Estados, consultaram-se os Senhores Governadores e, nos Municípios, os Senhores Prefeitos. De maneira geral o índice de respostas pode ser considerado muito positivo, não obstante o ineditismo da consulta, a crônica falta de informações no Setor Público e até a inexperiência das suas equipes técnicas.

Ainda no que concerne às autoridades consultadas, todas atenderam prontamente à Comissão, ressalvando-se que o Ministério da Saúde encaminhou suas informações usando de procedimento diverso do solicitado, sem fazer constar, na maioria dos casos, o estágio da obra e o valor necessário à sua conclusão, o que prejudicou sobremaneira a qualidade do levantamento naquela área. Da mesma forma, os dados recebidos do Ministério da Educação estão incompletos, mas, de acordo com o Quadro Resumo Global de Escolas Inacabadas entregue pelo titular daquela Pasta à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, desta Casa, no dia 09/11/95, existem hoje 523 escolas inacabadas, sendo 225 escolas do ensino fundamental, 128 escolas agrícolas de primeiro grau e 170 CAICs.

Cabe esclarecer que não foi objeto de pesquisa desta Comissão as obras a cargo das Empresas Estatais, cujo financiamento não figura no Orçamento Fiscal ou da Seguridade, a despeito das vultosas somas nelas dispendidas, como por exemplo, as Usinas Nucleares.

Com base nas informações recebidas, foram gerados dois arquivos de dados, um sobre as informações recebidas dos órgãos e das entidades da União, e outro relativo aos Estados e Municípios, contendo informações nem sempre coincidentes. Para a elaboração do relatório final, esses dois arquivos foram consolidados, formando o Inventário das Obras Inacabadas, constante do Anexo A.

Cabe destacar que a Comissão utilizou-se também do Relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União e encaminhado ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização³, subdivido no "Relatório consolidado referente ao exame dos subprojetos relativos às obras e investimentos constantes do Projeto de Lei Orçamentária para 1996" e na "Relação de obras e investimentos nos quais foram constatadas irregularidades ou ilegalidades, e que não estão incluídas no referido projeto de lei orçamentária".

Também serviu de base para nossos trabalhos o Relatório e Voto daquela Corte de Contas, sobre as obras paralisadas no

³ O Relatório do TCU foi encaminhado mediante o Aviso nº 755-GP/TCU, de 19 de outubro de 1995, e distribuído na forma de avulso pela Comissão Mista de Orçamento, e será doravante citado como "Relatório do TCU sobre as obras irregulares".

Nordeste⁴, no qual faz-se registro da existência de quinhentos e três obras paralisadas naquela Região

5.3 - Visitas e inspeções realizadas nas Unidades da Federação

A definição sobre as obras prioritárias de cada Unidade da Federação foi acordada com os Governadores dos Estados por ocasião das visitas e inspeções realizadas pela Comissão, aproveitando-se ainda a oportunidade para complementar as informações já recebidas.

Encontra-se, a seguir, a síntese das atividades desenvolvidas pela Comissão, onde constam as viagens realizadas no período de 31 de agosto a 1º de novembro de 1995.⁵

SENADO FEDERAL

COMISSÃO TEMPORÁRIA DO SENADO FEDERAL, CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 651, DE 1995, DESTINADA A INVENTARIAR AS OBRAS NÃO CONCLUÍDAS CUSTEADAS PELA UNIÃO E EXAMINAR SUA SITUAÇÃO.

EM 18.05.95 - Designação dos membros da Comissão.

EM 22.05.95 - Recebimento do Ofício nº 153/95, da Liderança do PP, indicando o Senador João França para integrar como Suplente a Comissão.

EM 25.05.95 - 1ª REUNIÃO

Reunião de Instalação:

Presidente: Senador CARLOS WILSON

Vice-Presidente: Senador EDISON LOBÃO

Relator: Senador CASILDO MALDANER

EM 29.05.95 - A partir desta data foi encaminhado aos Governadores de Estado, Presidentes das Assembléias Legislativas Estaduais e Prefeituras Municipais brasileiras, Ofício e Circular de autoria da Comissão, solicitando informações sobre as obras inacabadas naqueles municípios e em que estágio se encontram.

EM 30.05.95 - 2ª REUNIÃO

Reunião de Trabalho.

⁴ Decisão Nº 397/95-TCU-Plenário, de 16/08/95, DOU de 4 de setembro de 1995, elaborado para atender a solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, das obras paralisadas no Nordeste.

⁵ Trabalho elaborado pelo Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito, da Secretaria Legislativa

EM 01.06.95 - Ofício do GLPP nº 0180/95, indicando o Senador José Roberto Arruda, como suplente, em substituição ao Senador João França.

EM 06.06.95 - 3ª REUNIÃO
Reunião de Trabalho.

EM 12.06.95 - Publicação das Atas da 1ª e 2ª Reuniões e respectivas notas taquigráficas (DCN - Seção II - nº 96, de 09.06.95, págs. 10165/10172).

EM 14.06.95 - Recebimento do Ofício nº 065/95, da Liderança do PT, indicando a Senadora Emília Fernandes para ocupar a vaga de Suplente.

EM 29.08.95 - É lido e aprovado o RQS 1145/95, de prorrogação do prazo dos trabalhos da Comissão por mais 60 dias (até 07.11.95).

EM 31.08.95 - 1ª Etapa de Viagens da Comissão:
Visita ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul e às obras da Termelétrica de Jacuí.

EM 01.09.95 - Visita às obras da BR-282 em Lages-SC, com a presença do Vice-Governador do Estado. Audiência com o Governador do Estado do Paraná e visita às obras do Anel Rodoviário de Curitiba.
Participantes: Senadores Carlos Wilson e Casildo Maldaner.

EM 07.09.95 - 2ª Etapa de Viagens da Comissão:
Visita ao Governador do Estado da Bahia, Paulo Souto, que entregou a relação das obras inacabadas no Estado.

EM 08.09.95 - Visita ao Vice-Governador do Estado de Alagoas, Manoel Gomes de Barros, e às seguintes obras: Hospital Regional de Maceló e duplicação da rodovia de acesso ao aeroporto.

Audiência com o Governador do Estado de Pernambuco, Miguel Arraes, e visita às seguintes obras: duplicação da BR-101 e ao Hospital de Olinda.

Participantes: Senadores Carlos Wilson, Casildo Maldaner, Renan Calheiros, Waldeck Ornelas, Joel de Hollanda e Teotônio Vilela Filho.

EM 14.09.95 - Publicação da Ata da 3ª Reunião e respectivas notas taquigráficas (DCN - Seção II - nº 147 - de 14.09.95 - pág. 15815).

EM 14.09.95 - 3ª Etapa de Viagens da Comissão:
Audiência com o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Wilson Martins, e visita às seguintes obras: Hospital Geral Rosa Pedrossian e CAIC de Campo Grande.

EM 15.09.95 - Audiência com o Vice-Governador de Mato Grosso, Márcio Lacerda, e visita às seguintes obras: Hospital Regional de

Culabá, Hospital do Câncer, duplicação de trecho da BR-364 e à Estação de Tratamento de Esgoto.

Participantes: Senadores Carlos Wilson, Casildo Maldaner, Arlindo Porto, Ramez Tebet e Lúdio Coelho.

EM 21.09.95 - 4ª Etapa de Viagens da Comissão:

Audiência com o Governador do Estado do Amapá, João Capiberibe, e visita às seguintes obras: Penitenciária Agrícola do Amapá, Canal do Beírol e drenagem e pavimentação da Baixada do Adonias.

EM 22.09.95 - Audiência com o Vice-Governador do Estado do Maranhão, José Reinaldo Tavares, e visita às seguintes obras: Pier Petroleiro do Itaqui, duplicação da rodovia BR-135 e a ponte da Amizade ligando a cidade de Teresina à de Timon-MA.

Audiência com o Governador do Estado do Piauí, Francisco Moraes, e às seguintes obras: Ponte da Amizade, Anel Viário na saída sul de Teresina, Hospital Universitário de Teresina e Pronto-Socorro da mesma cidade.

Participantes: Senadores Edison Lobão, Casildo Maldaner, Arlindo Porto e Hugo Napoleão.

EM 28.09.95 - 5ª Etapa de Viagens da Comissão

Audiência com o Governador do Estado de Sergipe, Albano Franco, e visita às seguintes obras: Centro Habitacional Marcos Freire e Recuperação do Molhe da Coroa do Melo, em Aracaju.

Audiência com o Governador do Estado da Paraíba, José Targino Maranhão, e visita às obras de Duplicação da BR-230 e ao Pronto Socorro de João Pessoa.

EM 29.09.95 - Visita a Cidade de Mossoró (RN), e audiência com o Governador do Estado do Rio Grande do Norte, Garibaldi Alves Filho.

Audiência com o Vice-Governador do Estado do Ceará, Moroni Torgan, e visita às obras do Hospital das Clínicas de Fortaleza.

Participantes: Senadores Carlos Wilson, Casildo Maldaner, Arlindo Porto, Geraldo Mello e Lúcio Alcântara.

EM 05.10.95 - 6ª Etapa de Viagens da Comissão

Audiência com o Governador do Estado de Minas Gerais, Eduardo Brandão de Azeredo, e visita às seguintes obras: Instituto do Coração - CARDIOMINAS - e ao Pronto-Socorro de Venda Nova, na Grande Belo Horizonte.

EM 06.10.95 - Audiência com o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, e visita às seguintes obras: Hospital de Saracuruna e Queimados.

Audiência com o Governador do Estado de São Paulo, Mário Covas, e visita às seguintes obras: Hospital Pirajussara, em Taboão da Serra e ao Hospital de Itapevicirica da Serra.

Participantes: Senadores Carlos Wilson, Arlindo Porto, Emília Fernandes, Junia Marise e José Roberto Arruda

EM 10.10.95 - 7ª Etapa de Viagens da Comissão

Audiência com o Governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, e visita às obras do Metrô de Brasília.

Participantes: Senadores Carlos Wilson, Casildo Maldaner, Edison Lobão, Arlindo Porto, Emília Fernandes, José Roberto Arruda e Gerson Camata.

EM 11.10.95 - 4ª REUNIAO

Nesta oportunidade é lido e aprovado, por unanimidade, o Relatório parcial apresentado pelo Relator, Senador Casildo Maldaner.

EM 12.10.95 - Publicação do Relatório Preliminar e Parcial apresentado na Comissão (DSF nº 008, de 12.10.95, pág. 00842).

EM 19.10.95 - 8ª Etapa de Viagens da Comissão

Audiência com o Governador do Estado do Acre, Orlair Messias Camell, e visita às obras do Canal da Maternidade e Estação de Tratamento de Águas (ETA II)

Audiência com o Governador do Estado de Rondônia, Valdir Raupp, e visita às obras da Casa de Detenção de Porto Velho, Escola do Jardim Eldorado e Universidade Federal de Rondônia.

EM 20.10.95 - Audiência com o Governador do Estado de Roraima, Neudo Campos. Audiência com a Prefeita de Boa Vista, Teresa Jucá, e visita às obras do Hospital Geral de Urgência de Boa Vista e ao Centro de Saúde do Pricumã.

Audiência com o Governador do Estado do Amazonas, Amazonino Mendes.

EM 21.10.95 - Visita às obras do Fórum de Justiça - Vara Cíveis e Criminais e Hospital Geral "Dona Francisca Mendes".

Participantes: Senadores Edison Lobão, Emília Fernandes, Marluce Pinto, João França, José Blanco, Ernandes Amorim e Jefferson Peres.

EM 26.10.95 - Publicação da Ata da 4ª Reunião e respectivas notas taquigráficas (DSF - nº 17 - de 26.10.95 - pág. 01759).

EM 26.10.95 - 9ª Etapa de Viagens da Comissão

Audiência com o Vice-Governador do Estado de Goiás, Naphtali Alves de Souza e visita às obras do Hospital Geral de Goiânia.

Audiência com o Governador do Estado do Tocantins, Siqueira Campos, e visita às obras do Hospital Geral de Palmas e do Laboratório Central de Palmas (LACEN).

Audiência com o Governador do Estado do Pará, Almir Gabriel.

EM 27.10.95 - Visita às obras das Eclusas do Tocantins, em Tucuruí (PA).

Participantes: Senadores Arlindo Porto, Gerson Camata, Ademir Andrade, Carlos Patrocínio, Mauro Miranda e Leomar Quintanilha.

EM 01.11.95 - É lido e aprovado o Requerimento nº 1.411, de 1995, de prorrogação do prazo da Comissão até o dia 15.12.95.

EM 01.11.95 - 10ª Etapa de Viagens da Comissão

Audiência com o Governador do Estado do Espírito Santo, Vítor Buaiz e visita às obras do Hospital de Vila Velha.

Participantes: Senadores Carlos Wilson, Casildo Maldaner, Arlindo Porto e Gerson Camata.

5.4 - Assessoramento Técnico e Administrativo

O assessoramento técnico e administrativo à Comissão foi prestado pelos seguintes órgãos e pessoas:

a) Consultoria de Orçamentos do Senado Federal;

- Jeferson Vaz Morgado, Consultor de Orçamentos/Economista;

- Carlos Mello Marshall, Consultor de Orçamentos/Engenheiro Civil;

- Hipólito Gadelha Remígio, Consultor de Orçamentos/Contador.

b) Tribunal de Contas da União:

- Lúcia Helena Serejo Galeotti, Analista de Finanças e Controle Externo/Engenheira Civil;

- Christiano Caldeira Paiva, Analista de Finanças e Controle Externo/Engenheiro Civil;

c) Serviço de Apoio a Comissões Temporárias, da Secretaria Legislativa do Senado Federal:

- Luiz Cláudio de Brito, Analista Legislativo, Chefe do Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito;

d) Serviço de Divulgação

- Manoel Lúcio de Jesus Leal, Técnico Legislativo/Jornalista;e

- Márcia Latife Eluan Kalume, Analista Legislativo/Fotógrafa.

e) Serviço de Processamento de Dados do Senado - PRODASEN:

- Cristóvão Araújo Costa;

- Affonso Celso de H. Cavalcanti Junior

f) Centro Gráfico do Senado - CEGRAF:

- Vanildo Batista da Silva.

5.5 - Agradecimentos

Além dos técnicos, a quem coube a elaboração deste trabalho, agradecemos ao Tribunal de Contas da União, que colocou à inteira disposição da Comissão dois técnicos especializados na área que, além colaborar com os trabalhos de natureza técnica, possibilitarão o estabelecimento de uma atuação conjunta TCU/Senado.

Agradecemos também ao Ministério da Aeronáutica cuja colaboração em colocar à nossa disposição suas aeronaves, destinadas à realização das viagens de inspeção aos Estados, foi essencial para que a Comissão atingisse seus objetivos.

6. RESULTADOS DAS INSPEÇÕES REALIZADAS E DEFINIÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

Durante mais de dois meses, percorrendo quase trinta mil quilômetros e cerca de cem horas de voo, a Comissão pôde vislumbrar o quadro caótico retratado pelas mais de duas mil obras inacabadas em todo o País, constituindo, por assim dizer, um verdadeiro "mapa do desperdício", que afronta o bom senso e os mínimos princípios éticos.

Ao depararmos com a estrutura do que seria um hospital, uma escola, uma ponte ou outro bem público qualquer, os primeiros sentimentos que nos assaltam são de espanto e indignação. Espanto pela magnitude do desperdício e indignação pela indiferença e irresponsabilidade com que esse problema vem sendo tratado ao longo do tempo pelas autoridades públicas, principalmente pela não-alocação dos recursos orçamentários necessários à sua conclusão, enquanto outras obras são iniciadas.

Revolta-nos, igualmente, verificar que ainda perdura a chamada "cultura política brasileira", caracterizada pela busca do proveito pessoal em detrimento do interesse público, que resvala para o nepotismo, o empregulismo, o proselitismo, a ineficiência, quando não para a corrupção pura e simples, representada pelo pagamento de comissões, o que leva necessariamente ao superfaturamento das obras.

Assim, faz-se necessário mudar essa "cultura", buscando-se mais justiça social, e preparando o Brasil para a inauguração de um novo milênio.

Como resultado das inspeções feitas localmente, das discussões levadas a efeito com as autoridades estaduais e com algumas bancadas no Senado Federal, elaboramos uma listagem das principais obras paralisadas em cada Unidade da Federação, em ordem de prioridade, sobre as quais devem recair as preocupações dos Parlamentares por ocasião da apreciação do Projeto da Lei Orçamentária da União para 1996 e para os exercícios seguintes.

Ressalte-se que a indicação para retomada de obras que contenham registro de irregularidade ou ilegalidade pelo Tribunal de Contas da União não implica que o passado deva ser olvidado. Pelo contrário, a Comissão considera condição indispensável a apuração

dos fatos, a identificação das responsabilidades, o ressarcimento ao Erário e a punição exemplar dos culpados.

Contudo, esse processo de investigação pelo TCU não significa, necessariamente, que a obra deva permanecer paralisada, porquanto, na maioria dos casos, afigura-se como de suma importância para a população. Além disso, a ninguém passa despercebido que a parte já executada ao longo do tempo acaba sendo destruída em decorrência das intempéries, depredações e outros fatores.

A propósito, é oportuno transcrever trecho da assertiva do Dr. Homero de Souza Júnior, Assessor de Orçamento e Fiscalização da Câmara dos Deputados: *"Considerando a notória dificuldade que tem o estado brasileiro de apurar e punir o chamado crime do 'colarinho branco', assim como os crimes contra o erário, podemos chegar ao absurdo de punir duplamente a população destinatária da obra (pela ausência da própria obra e pelo desperdício dos impostos pagos por ela mesma e aplicados na obra), enquanto os verdadeiros culpados não são atingidos pela Lei"*⁶. (grifo do original).

A Comissão entende que a retomada dessas obras, seja precedida da avaliação técnica das etapas já executadas, com o objetivo de definir as possibilidades e condições do seu aproveitamento e eventual readequação dos projetos, a renegociação ou cancelamento dos contratos e a realização de novo processo licitatório.

Esclarecemos, mais uma vez, que a responsabilidade pela indicação das obras prioritárias não cabe à Comissão, mas aos Governos e bancadas estaduais.

Registre-se, mais, que as diferenças existentes entre as descrições das diversas obras resultam do nível de detalhe das informações recebidas pela Comissão. Assim, eventuais falhas ou omissões devem ser comunicada à assessoria técnica da Comissão, para as devidas correções.

São as seguintes as obras indicadas como prioritárias em cada Unidade da Federação:

⁶ Homero de Souza Júnior, Assessor de Orçamento e Fiscalização Financeira, in Estudo "Alternativas de tratamento a ser dispensado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização às obras sobre as quais existam suspeitas de irregularidades", datado de 24 de outubro de 1991

6.1 - ESTADO DO ACRE

- **Urbanização e Drenagem do Canal da Maternidade**, que consiste na urbanização e drenagem do canal do Igarapé da Maternidade, fundamental para o saneamento de Rio Branco. A obra foi iniciada em 16/10/91, financiada pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS, pelo valor de Cr\$ 39.012.683.159,96, correspondentes a US\$ 106.400.161,00⁷, ou 5.850.478,17 UPF, de acordo com planilha fornecida à Comissão, pelo Governo do Acre. A obra foi paralisada em abril do ano seguinte, com apenas 4,82% executados, correspondentes a serviços preliminares;

- **Estação de Tratamento de Água - ETA II**, constantes de obras civis e montagens hidromecânicas e elétricas de captação, elevatórias, adutoras de água bruta e tratada e estação de tratamento de água de Rio Branco. Obra de fundamental importância para a Capital do Acre, foi iniciada em 16/10/91, também financiada com recursos do FGTS, e contratada pelo valor de Cr\$ 24.836.792.066,00, preços de Julho/91, equivalentes a 9.880.728,525 UPF.⁸ Consta que a obra esteja com cerca de um terço executada, tendo sido aplicado o equivalente a R\$ 8.021.878,65 (719.451,00 UPF);

- **Hospital Regional de Cruzeiro do Sul**, com 12.500 m², para 150 leitos, hospital de referência da região, destinado ao atendimento das populações de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Valter Marechal Taumaturgo, Tarauacá e Feijó, além dos amazonenses de Guajará e Ipixuna, abrangendo um total de aproximadamente 200.000 pessoas. Suas obras foram iniciadas em 15/07/90 e paralisadas em setembro de 1992, com cerca de 26% executadas. Os valores necessários à conclusão das obras civis são estimados em R\$ 12.500.000,00 mais R\$ 3.500.000,00 para equipamentos.


6.2 - ESTADO DE ALAGOAS

- **Hospital Geral de Maceió**. Obra iniciada em 1989, encontra-se paralisada desde 1993, com cerca de 20,5% executados. Os recursos necessários à conclusão do hospital estão orçados em R\$ 23.848.200,00;


- **Restauração da BR-316**, trecho da divisa PE/AL a

⁷ Informações constantes do Relatório da CPI da Assembleia Legislativa do Acre sobre as duas obras, entregue à Comissão, durante a visita ao Estado

⁸ Valores fornecidos à Comissão, por ocasião da visita ao Estado do Acre

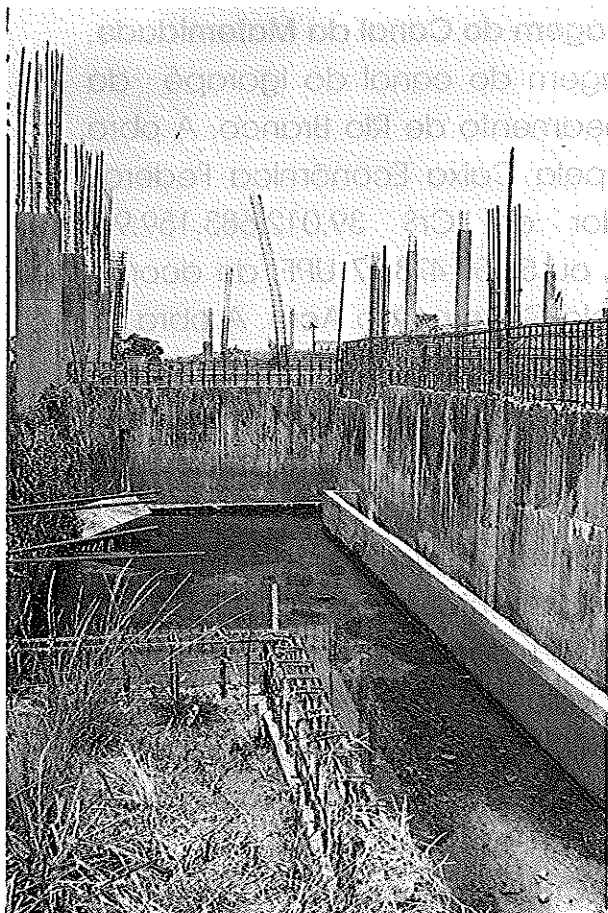

***Obras do serviço de tratamento de água e
esgoto de Rio Branco - AC***



***Urbanização e drenagem
do Canal da Maternidade,
em Rio Branco - AC***



Hospital Geral de Maceió - AL

Santana do Ipanema, com 50 quilômetros de extensão. A obra foi iniciada em janeiro de 1993 e paralisada em setembro do mesmo ano, com 90% concluída. O valor inicialmente contratado foi de R\$ 9.627.310,00, financiados com recursos do BIRD, restando a parcela de R\$ 3.500.000,00 para a conclusão, e cujo montante aplicado corresponde a R\$ 33.500.000,00;

- **Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Macaé.** Já foram investidos na obra cerca de R\$ 30.000.000,00, estando orçados em R\$ 3.000.000,00 os recursos necessários à dragagem da baía, o que permitirá a atracação de um maior número de navios, aumentando sua capacidade em cerca de 25%.

6.3 - ESTADO DO AMAPÁ


- **Reforma e Adaptação da Penitenciária Agrícola de Macapá,** constituindo-se na construção de um pavilhão, reforma e adaptação do pavilhão de segurança máxima, reparo na subestação, passarelas externas e obras de acabamento. A penitenciária tem capacidade para 120 detentos, mas abriga 280; A obra foi iniciada em outubro de 1993 e paralisada em abril do ano seguinte e os custos estimados para sua conclusão é de R\$ 1.947.987,00;

- **Revestimento do Canal do Belrol e Pavimentação das Vias Laterais.** A obra consiste na regularização e revestimento do leito e laterais do canal, numa extensão de 2.850 metros e pavimentação das vias laterais. A obra foi iniciada em 1992 e paralisada em outubro de 1994, tendo sido executados 13,82%, no valor de R\$ 3.444.447,84. O valor contratual da obra é de R\$ 24.923.645,00;

- **Drenagem e Pavimentação da Baixada do Adonias,** que consiste na drenagem de uma baixada, construção de proteção contra as marés e pavimentação de uma via que atravessa a baixada. A obra foi iniciada em junho de 1992 e paralisada em dezembro de 1994, tendo sido executados 30,81% e paga parcela na mesma proporção. O valor necessário à conclusão é de R\$ 683.300,00.

Projeto de Justiça Estadual, iniciado em 1975 e concluído em 1976. Considerando que esta obra já encontra-se em fase de execução, tanto a avaliação técnica da obra já executada, para definir as condições de seu aproveitamento, como uma reavaliação do projeto, em função das atuais exigências da Justiça Estadual. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 16.800.000,00.

Hospital Geral Dora Franco Mendes, construção com capacidade para 100 leitos, iniciado em 1987, está concluído em 1992, com cerca de 75% executado. Há uma demanda de cerca de 100 leitos, o que exige a construção de um novo hospital, com capacidade para 200 leitos, com cerca de 75% executado. Há uma demanda de cerca de 100 leitos, o que exige a construção de um novo hospital, com capacidade para 200 leitos, com cerca de 75% executado.

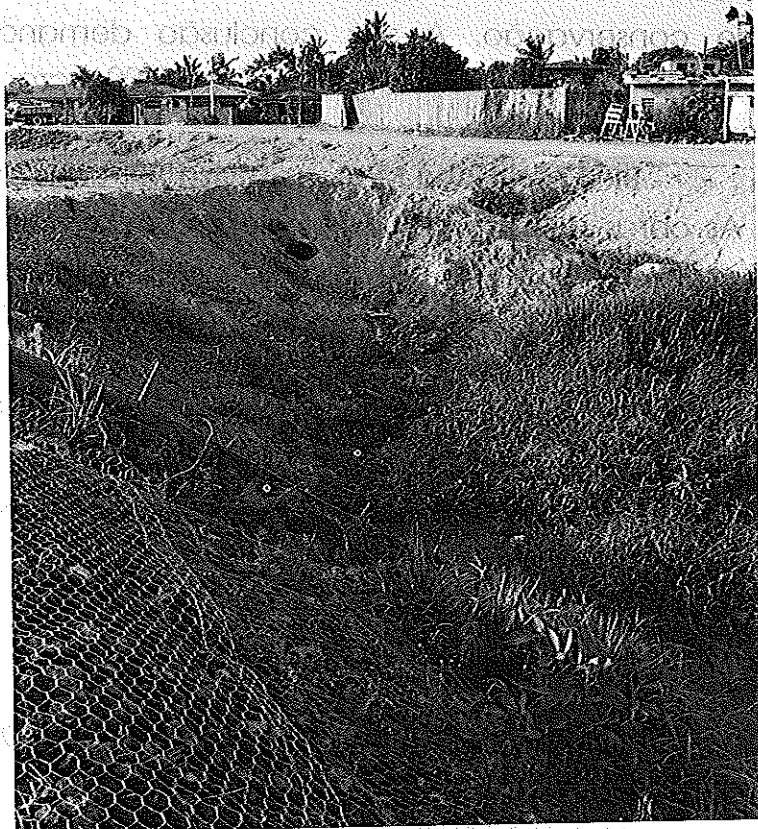

Revestimento do Canal de Beírol e pavimentação das vias laterais em Macapá - AP.

Projeto de Justiça Estadual, iniciado em 1975 e concluído em 1976. Considerando que esta obra já encontra-se em fase de execução, tanto a avaliação técnica da obra já executada, para definir as condições de seu aproveitamento, como uma reavaliação do projeto, em função das atuais exigências da Justiça Estadual. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 16.800.000,00.

Hospital Geral Dora Franco Mendes, construção com capacidade para 100 leitos, iniciado em 1987, está concluído em 1992, com cerca de 75% executado. Há uma demanda de cerca de 100 leitos, o que exige a construção de um novo hospital, com capacidade para 200 leitos, com cerca de 75% executado. Há uma demanda de cerca de 100 leitos, o que exige a construção de um novo hospital, com capacidade para 200 leitos, com cerca de 75% executado.

6.4 - ESTADO DO AMAZONAS

- **Prédio da Justiça Estadual**, iniciada em 1975 e paralisada em 1976. Considerando que esta obra está paralisada há quase vinte anos, tornam-se necessárias, tanto a avaliação técnica da parcela da obra já executada, para definir as condições de seu aproveitamento, como uma readequação do projeto, em função das atuais exigências da Justiça estadual. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 16.500.000,00;

- **Hospital Geral Dona Francisca Mendes**, construção com capacidade para 100 leitos, iniciado em 1987, está paralisada desde outubro de 1992, com cerca de 75% executada, em boas condições de conservação. A sua conclusão demanda a soma aproximada de R\$ 2.000.000,00 mais R\$ 2.500.000,00 para a aquisição dos equipamentos;

- **BR-174, trecho Manaus-Divisa RR**, com cerca de 160 quilômetros. As obras de pavimentação desse trecho foram iniciadas em 23.07.95 com recursos do Tesouro Estadual, e encontra-se em andamento, com 12% executada, estimando-se em R\$ 42.771.480,00 os recursos necessários à sua conclusão;


- **Penitenciária Anísio Jobim**, cuja construção teve início em 22/02/88 e foi paralisada em 18/02/94, com metade das obras executadas. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 4.100.000,00.

6.5 - ESTADO DA BAHIA


- **BR-116, trecho Euclides da Cunha-BR-235**. Consiste na implantação e pavimentação do trecho, com 62km, cujos custos estão orçados em R\$ 6.200.000,00. Esta obra está incluída na proposta do OGU para 1996, com R\$ 7.689.611,00;

- **Barragem do Zabumbão**, com 50% executada e uma estimativa para concluir de R\$ 10.000.000,00;

- **Projeto de Irrigação do Brumado** - conclusão do último bloco de irrigação, no Município de Livramento Nossa Senhora, iniciado em 1978, sofrendo constantes interrupções, até chegar a 90% das obras. O custo previsto para sua conclusão é de R\$ 2.500.000,00. Consta da proposta para o OGU/96, com R\$ 904.477,00

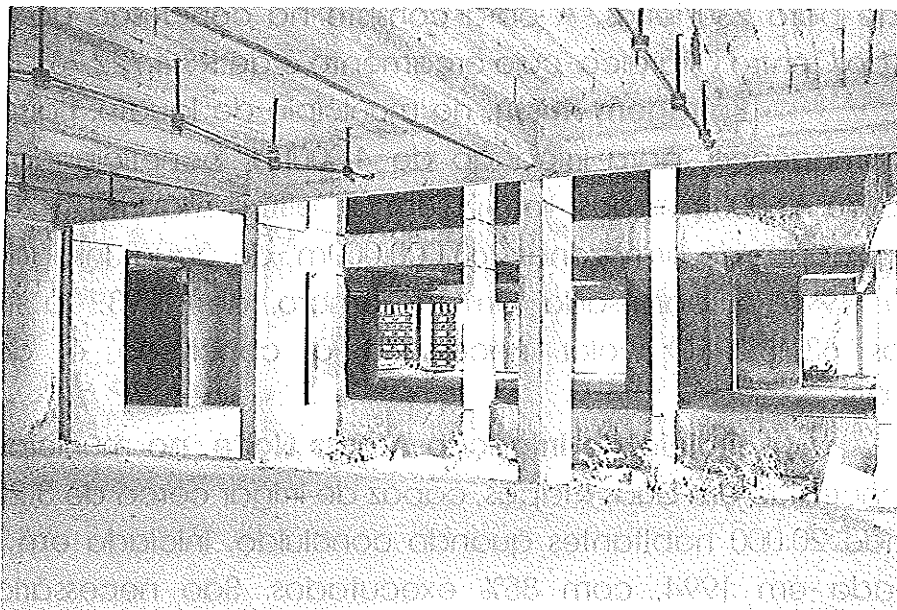

Prédio da Justiça Estadual, em Manaus - AM

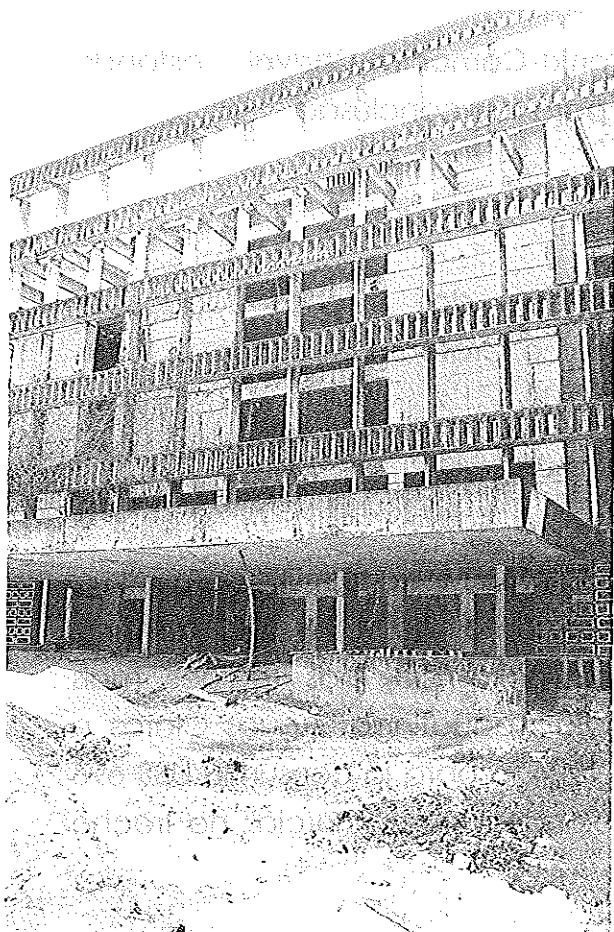

*Prédio da Justiça
Estadual, em
Manaus - AM*

6.6 - ESTADO DO CEARÁ

- **Hospital Universitário Walter Cantídio da UFC**, obras de modernização da estrutura funcional e organizacional, com capacidade para 230 leitos. A obra consiste na conclusão do bloco destinado ao Centro Cirúrgico, cujo orçamento é de R\$ 4.722.739,00;

- **Barragem Trussu**, no município de Iguatu. Barragem de terra homogênea, para irrigação de 4.000ha, beneficiando uma população de 43.000 pessoas. Tem 36,3m de altura máxima, 1.200.251 m³ de terra, capaz de armazenar 263.000.000m³ de água. Iniciada em março de 1990 e paralisada em dezembro de 1993, já foram executados 63,45%. O valor necessário à conclusão é de R\$ 6.000.000,00;

- **Projeto de Irrigação Araras Norte**, no município de Varjota, concebido em duas etapas, capaz de irrigar cerca de 3.225ha, beneficiando 20.000 habitantes quando concluído. Iniciada em 1987, foi paralisada em 1994, com 85% executados. São necessários R\$ 1.200.000,00 para a sua conclusão;

- **BR-402, trecho Marco-Granja**, paralisada em maio/95, com 20% executados, e cujo orçamento para conclusão é de R\$ 10.885.000,00;


- **BR-402, trecho Granja-Camocim-Chaval**, estando orçados em R\$ 5.202.604,00 os valores para sua conclusão.

Obra Regional

- **BR-226**, pavimentação dos trechos Jaguaribe-Senador Pompeu, Pedra Branca-Cruzeta e Crateús-Divisa com o Piauí, cujo custo está orçado em R\$ 30.000.000,00.

6.7 - DISTRITO FEDERAL


- **Metrô do Distrito Federal**, o Metrô do DF, com 42km, foi concebido como um empreendimento de US\$ 690 milhões, destinado a atender a 134.000 passageiros/dia, nas regiões mais carentes do DF (Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras e Guará). Paralisada desde outubro de 1994, a obra já consumiu US\$ 696 milhões e, para ser colocado em funcionamento comercial, no trecho

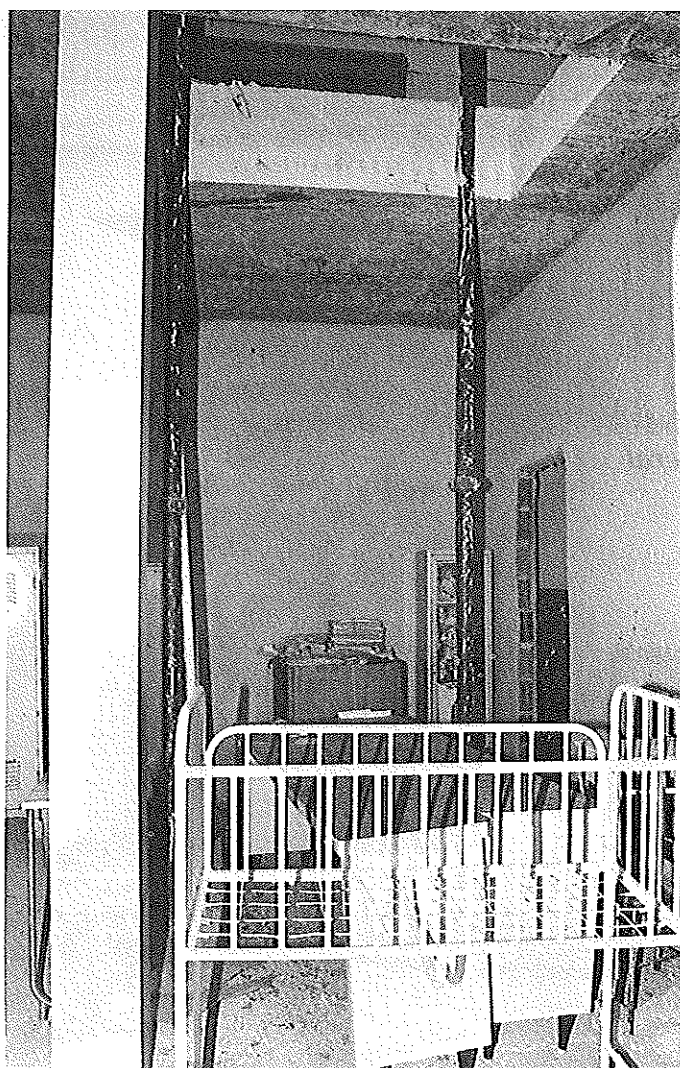

*Hospital
Universitário
Walter Cantídio
de UFC em
Fortaleza - CE*



Metrô do Distrito Federal

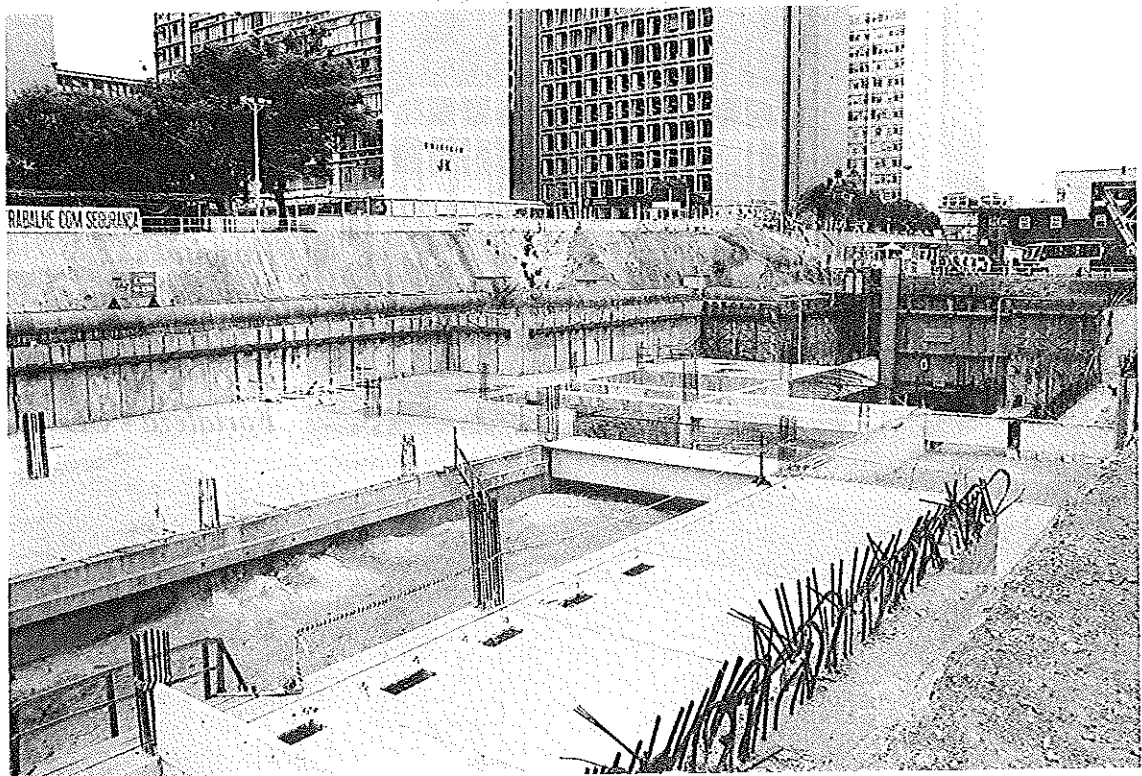

Metrô do Distrito Federal

Samambaia/Taguatinga/Final da Asa Sul, são necessários R\$ 90,6 milhões, a título de contrapartida do Governo Federal;

- **Hospital Regional do Paranoá**, com 150 leitos, numa das regiões mais carentes do DF. A obra foi iniciada em 1991 e paralisada em janeiro de 1994, contando com 16% já executados, correspondente a parte da estrutura. Os custos estimados para a sua conclusão atingem a R\$ 15.456.000,00.

6.8 - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


- **Hospital Geral e Infantil de Vila Velha**. Hospital de características regionais, com 150 leitos, sendo 45 para pediatria. Sua construção teve início em agosto de 1990 e foi paralisada em junho de 1991, com 40% executada. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 8.000.000,00;

- **BR-262** - Duplicação do trecho metropolitano nos bairros de Viana e Cariacica. As obras de duplicação foram iniciadas em junho de 1992 e paralisadas em abril do corrente ano. São de R\$ 14.000.000,00 os recursos necessários à conclusão da obra;


- **Construção da Segunda Ponte de Colatina**. Essa ponte destina-se a desafogar o centro de Colatina e a primeira ponte, construída em 1928. A sua construção teve início em 1986 e foi paralisada em 1989, com 50% executados. A sua conclusão está orçada em R\$ 10.000.000,00;

- **Complementação do Sistema de Abastecimento de Água da Grande Vitória - 3ª Fase**. A terceira fase do sistema é fundamental para seu funcionamento, destinado ao atendimento da população de baixa renda, de cerca de 1.200.000 habitantes, situada na extremidade da rede de abastecimento ou em regiões mais elevadas, atingindo principalmente a população da periferia. A obra foi iniciada em novembro de 1991 e paralisada em junho de 1994, já concluídas as fases anteriores. O valor necessário para sua conclusão é de R\$ 8.967.967,00;

- **Hospital Geral de Linhares**. A obra do hospital está paralisada desde 1987 o que ocasionou diversos danos por intempéries e depredações. A sua conclusão está estimada em R\$ 1.760.000,00.

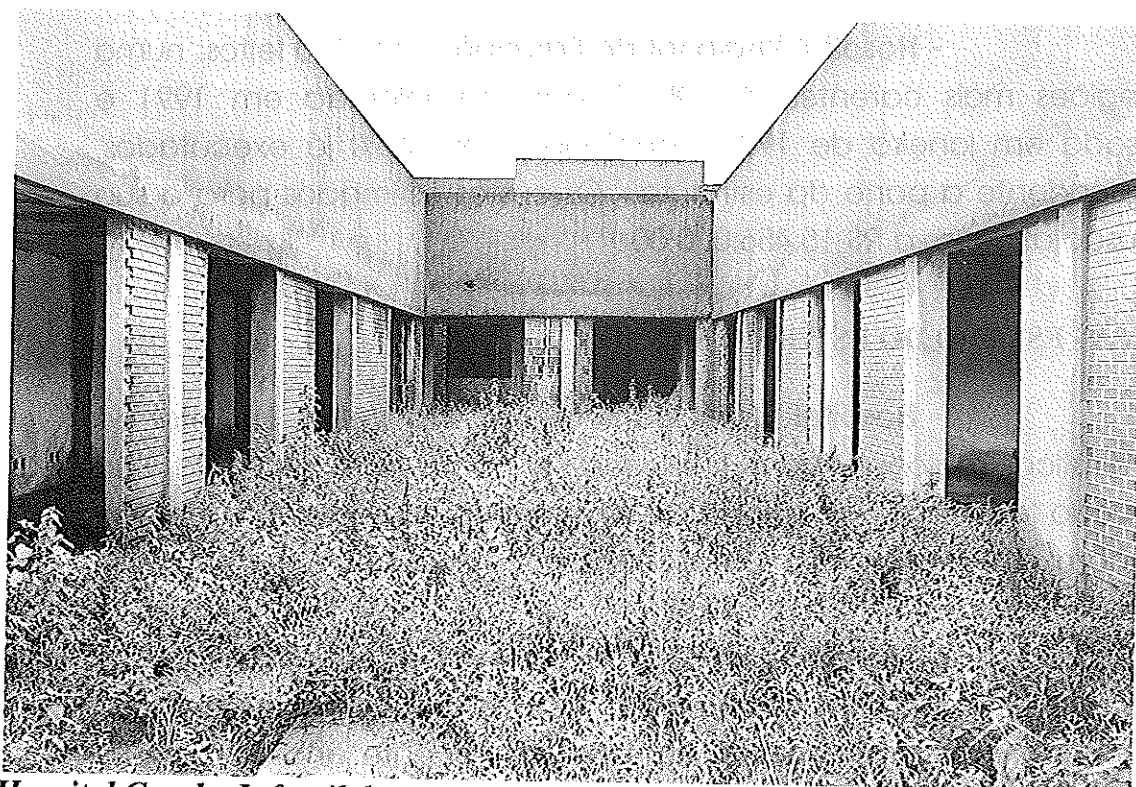

Hospital Geral e Infantil de Vila Velha - ES

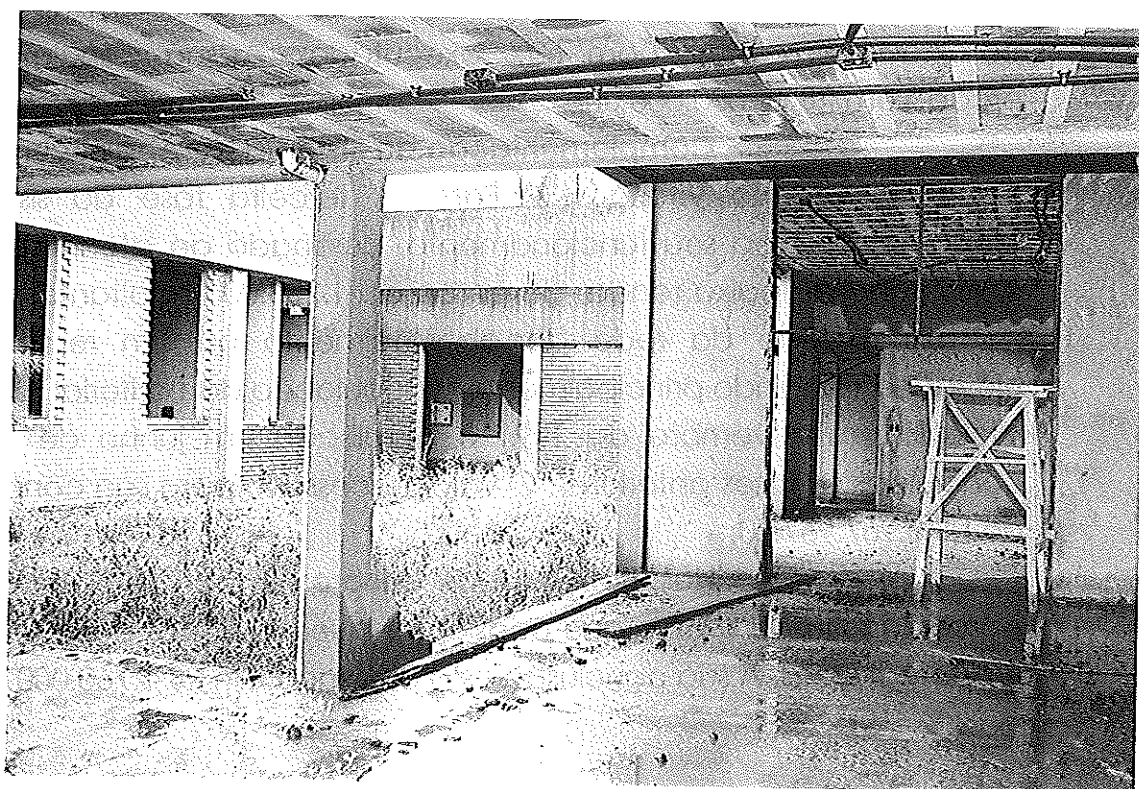

Hospital Geral e Infantil de Vila Velha - ES

6.9 - ESTADO DE GOIÁS

- **Contorno Sudoeste de Goiânia**, trecho GO-070/BR-153, com 29,3km. Contratada inicialmente em 03/12/93, sendo os recursos necessários à conclusão estimados em R\$ 22.015.324,00;

- **Ponte de Concreto sobre o Rio Maranhão**, na rodovia Minaçu-Cavalcante, com 516,3m, iniciada em 14/10/88 e paralisada, com cerca de 50% executados. Está orçado em R\$ 6.045.429,00 o montante necessário à sua conclusão;

- **BR-158, trecho Jataí-Caiapônia-Piranhas**, com 171,21 km, iniciada em 04/04/94 e paralisada em 13/01/95, com 9,3% executada. Estão estimados em R\$ 27.148.048,00 os recursos necessários à sua conclusão;

- **Reforma e Adequação do Hospital Geral de Goiânia**, iniciada em dezembro de 1991 e paralisada em outubro de 1994, com 60% concluído. Os recursos necessários à conclusão das obras civis são de R\$ 2.700.000,00;

- **Sistema de Abastecimento de Água da Grande Luziânia**, com a captação do Rio Corumbá e sistema de esgoto sanitário da região. Obra iniciada em outubro de 1989 e paralisada em fevereiro de 1991, com 57% executada, com recursos da Caixa Econômica Federal, estando estimados em R\$ 55.000.000,00 os recursos necessários à sua conclusão.

6.10 - ESTADO DO MARANHÃO


- **Terminal Petroleiro do Porto de Itaqui**, em São Luís, constituído do Acesso ao Pier e do Pier Petroleiro, esse último formado pela Ponte de Acesso, Plataforma de Operação, Delfins de Atracação e de Amarração e Passarelas, sendo todas as estruturas em concreto armado moldado "in loco" ou em concreto pré-moldado. Encontra-se executada 78% da obra, sendo necessários para a sua complementação R\$ 20.000.000,00;

- **Duplicação da BR-135 MA**, trecho São Luís-Estiva, com 24,8km, estando concluídos 90% das obras de arte e 75% da pavimentação. São necessários aproximadamente R\$ 10.000.000,00 para a sua conclusão. Os serviços estão paralisados desde 1990.


- **Pavimentação da BR-226 MA**, trecho Barra do Corda-Porto Franco, com cerca de 300km, faltando serem concluídos



Reforma e adequação do Hospital Geral de Goiânia - GO

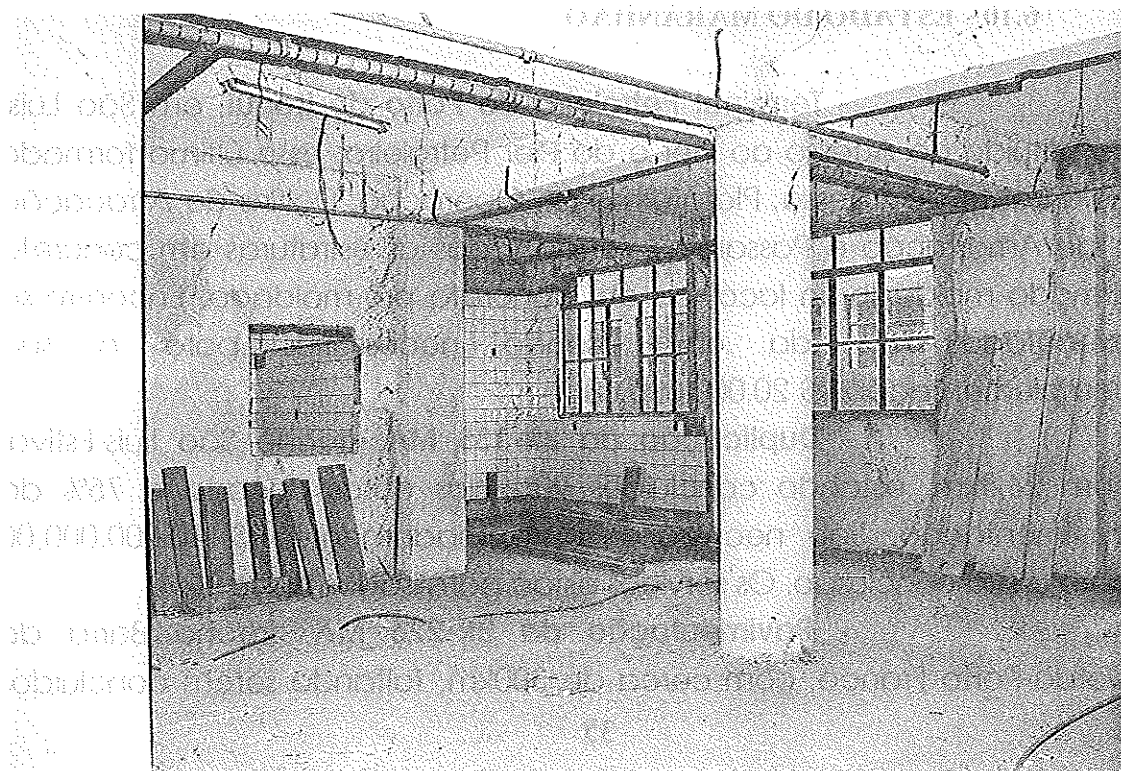

Reforma e adequação do Hospital Geral de Goiânia - GO

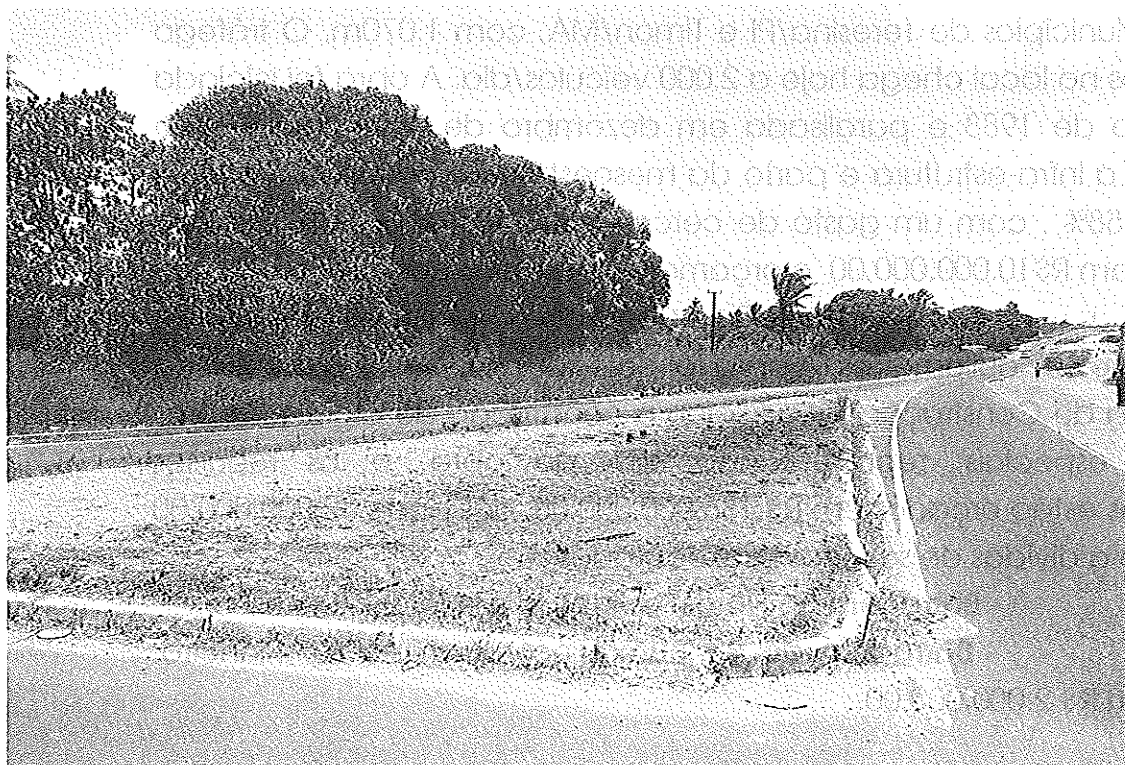

Duplicação da BR 135 - MA
Trecho São Luís - Estiva - MA



Ponte sobre o rio parnaíba "Ponte da Amizade" entre Terezina-PI e Timon-MA

140km. Os recursos para sua conclusão estão orçados em R\$ 30.000.000,00;

- **Ponte sobre o Rio Parnaíba**, a "Ponte da Amizade", entre os Municípios de Teresina/PI e Timon/MA, com 1.070m. O tráfego de veículos no local chega hoje a 2.000 veículos/dia. A obra foi iniciada em janeiro de 1988 e paralisada em dezembro de 1991, tendo sido concluída a infra-estrutura e parte da mesoestrutura, correspondente a cerca de 58% , com um gasto de cerca de R\$ 13.000.000,00, estando estimado em R\$ 10.000.000,00 o orçamento para sua conclusão;

- **Ferrovia Norte-Sul**, sub-trecho Imperatriz-Estreito, com extensão de 109 quilômetros. A obra foi delegada ao BEC - Batalhão de Engenharia de Construção, que iniciou a construção de algumas obras de artes especiais, representando 30% da obra, e os recursos necessários estão orçados em R\$ 136.000.000,00, dos quais 32.000.000,00 referem-se a dívidas de serviços já executados;

- **Barragem do Flores**, estimada em R\$ 2.270.000,00;


- **Barragem do Pericumã**, no município de Pinheiro, orçada em R\$ 2.000.000,00.

6.11 - ESTADO DO MATO GROSSO

- **Hospital Central do Estado do Mato Grosso**, com 14.500m² - 2ª Etapa, da qual 20% já se acha executada. Os recursos necessários à conclusão dessa etapa estão estimados em R\$ 7.500.000,00;

- **BR-163/364/070**-Duplicação do trecho entroncamento MT-040/Distrito Industrial, com 10,88Km na região metropolitana de Cuiabá. A obra foi iniciada em setembro de 1993 e paralisada em outubro de 1994, com 34% já executados. Os custos para sua conclusão estão estimados em R\$ 6.400.000,00;

- **Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto de Cuiabá**, iniciada em setembro de 1987, tendo sido executados cerca de 42% da obra, restando principalmente a construção das redes coletoras. Os custos estimados para sua conclusão são de R\$ 25.000.000,00.

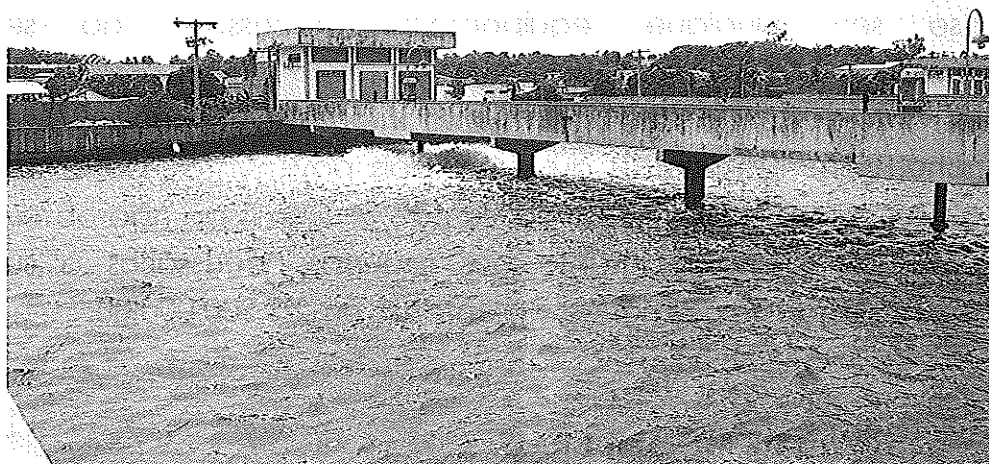

Estação de tratamento de esgoto de Cuiabá - MT



Hospital do Cancer Cuiabá - MT

6.12 - ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

- **Hospital Geral de Campo Grande**, com 10 pavimentos e 33.000 m², tendo já sido executados 95% das obras civis. Do valor contratado, de R\$ 45.606.160,00 foram pagos R\$ 29.228.110,00, restando uma dívida de R\$ 7.113.015,00 para com a empreiteira e um saldo contratual a executar de R\$ 9.265.033,00. Esse hospital já foi inaugurado em dezembro de 1994, com o nome de "Rosa Pedrosslan", mas encontra-se sem qualquer equipamento necessário ao seu funcionamento;


- **Centro de Atendimento Integral à Criança - CAIC Aero Rancho**, com 12 salas de aula, em dois pavimentos, com área total de 825m² estando prontos cerca de 60%. A Comissão não obteve informações quanto ao montante dos recursos necessários à sua conclusão, mas pode-se estimar esse montante em R\$ 200.000,00

6.13 - ESTADO DE MINAS GERAIS


- **Hospital Cardiominas**, localizado em Belo Horizonte, construção de 64.000m², para 400 leitos, em doze pavimentos e uma torre de quatro pavimentos destinados a internações. O seu projeto prevê o atendimento em cardiologia, nefrologia, pneumologia e imunologia, em unidades médicas, clínicas, cirúrgicas, salas de exames computadorizados, ressonância magnética e heliporto. Suas obras foram iniciadas em 1988 e paralisadas em setembro de 1994, com cerca de 40% executados. Já foram gastos na obra cerca de R\$ 30,0 milhões, e a estimativa é de que são necessários mais R\$ 30,0 milhões para a sua conclusão;

- **Pronto Socorro de Venda Nova**, com área prevista de 21.365m², para 240 leitos, em três blocos, sendo um com sete pavimentos destinado a atendimentos e internações. A obra foi iniciada em 17/07/90 e paralisada pela última vez em 07/95, tendo sido já construídos cerca de 27,5%. Foram aplicados R\$ 8.042.017,00, necessitando-se de mais R\$ 21.154.700,00, para sua conclusão;

- **Ponte de Porto Alencastro**, sobre o Rio Paranaíba, BR- 497, com 600 metros de extensão, na divisa MG/MS. Foi iniciada em 01/06/94 e paralisada em 01/11/94, com R\$ 9.309.656,75 aplicados, estando orçados em R\$ 30.000.000,00 os recursos necessários à sua conclusão;


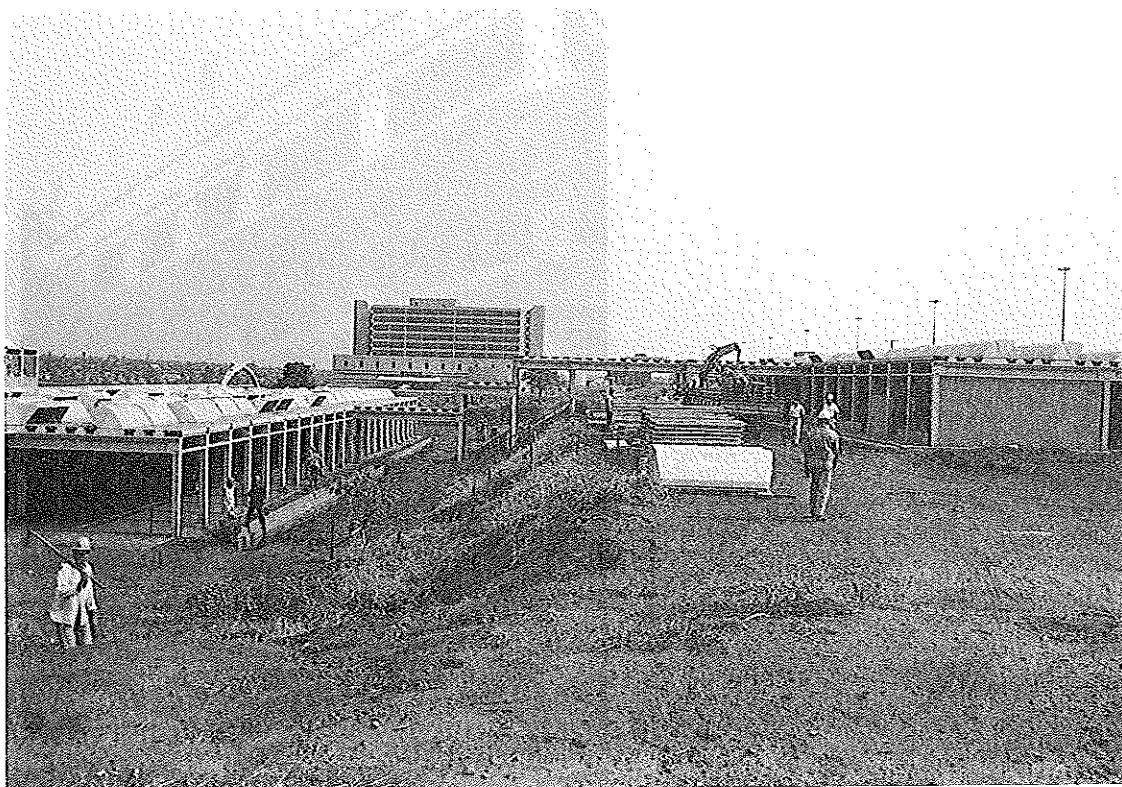


CAIC de Campo Grande - MS
CAIC Aero Rancho em Campo Grande - MS

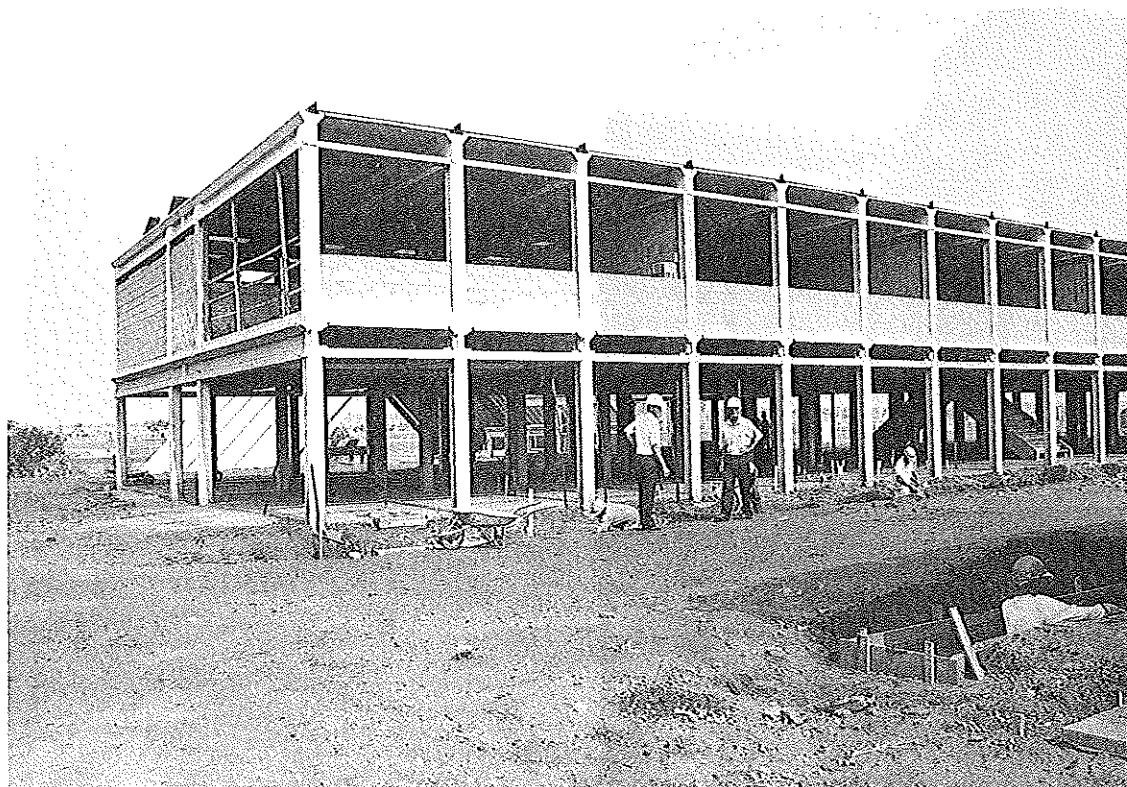

CAIC de Campo Grande - MS
CAIC Aero Rancho, Em Campo Grande - MS

*Hospital Cardiominas
BH-MG*

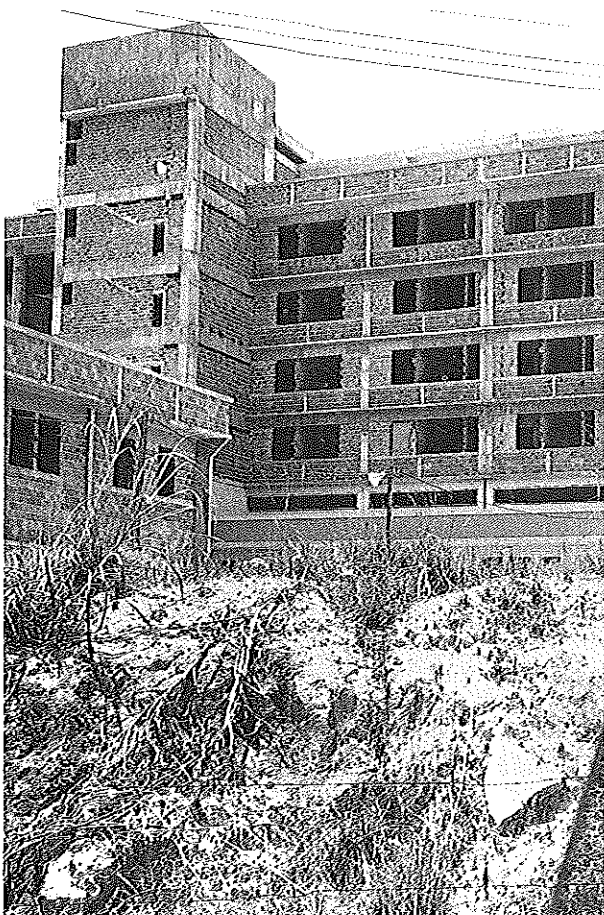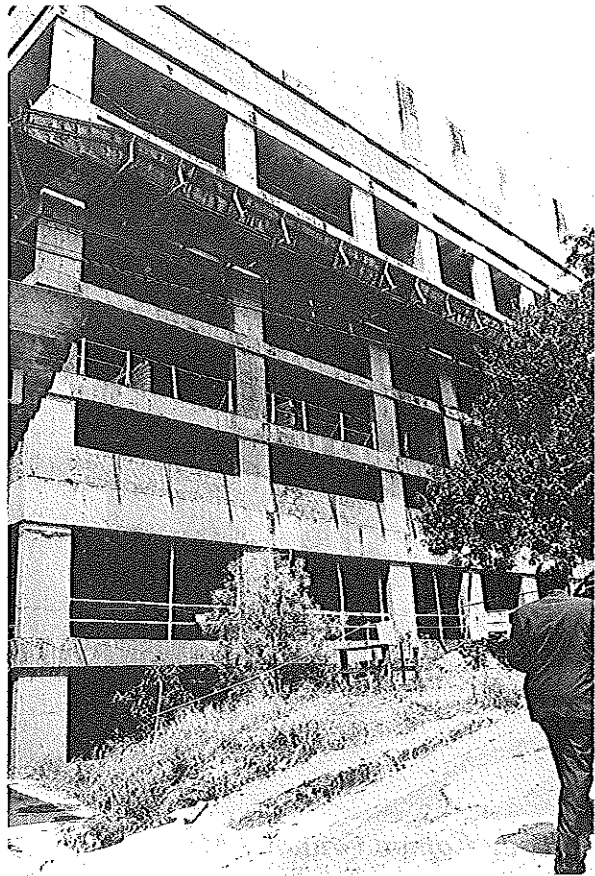

*Hospital Pronto-Socorro
de Venda Nova
Venda Nova - MG*

- **Rodovia BR-482**, pavimentação do trecho Conselheiro Lafaiete-Piranga, com 71 quilômetros de extensão, iniciada em 01/08/88 e paralisada em 01/11/90, exigindo-se R\$ 10.000.000,00 para conclusão;

- **Rodovia BR-367**, pavimentação do trecho Almenara-Salto da Divisa, com 88,6km, iniciada em 06/10/89 e paralisada em 01/05/95. Foram investidos na obra R\$ 8.916.300,00, estando orçados em R\$ 25.000.000,00 os recursos para conclusão, incluindo-se 8 pontes.

6.14 - ESTADO DO PARÁ

- **Eclusas de Tucuruí, no Rio Tocantins**, obra essencial à implantação da hidrovía Araguaia-Tocantins que, juntamente com as obras de transposição das corredeiras de Santa Isabel, permitirá a navegação, durante todo o ano, desde Nova Xavantina em Mato Grosso, pelo Rio das Mortes, até o Porto de Itaquí no Maranhão, numa extensão de cerca de 2.000km. Sua conclusão está estimada em R\$ 300.000.000,00;

- **Perenização do Lago Arari**, em Santa Cruz do Arari, na Ilha Marajó, destinada a permitir o transporte fluvial, inclusive para o desenvolvimento do eco-turismo. Exige-se o montante de R\$ 5.257.871,00 para sua conclusão;


- **Hospital de Clínicas "Gaspar Viana" em Belém**, cuja conclusão está orçada em R\$ 12.100.000,00;

- **BR-230 trecho Divisa TO/PA/Marabá/Jacareacanga**, próximo à divisa com o Amazonas, envolvendo diversos municípios, com extensão de 1.380 Km, estando orçado em R\$ 290.000.000,00 os recursos necessários à sua conclusão.


6.15 - ESTADO DA PARAÍBA

- **Restauração e Duplicação da BR-230**, trecho Cabedelo-Divisa PB/CE. Iniciada em março de 1993, a obra foi paralisada desde o final de 1994, com cerca de 90% executados. São necessários R\$ 4.600.000,00 para a sua conclusão;

- **Hospital de Pronto Socorro de João Pessoa**, com 10.012 m², construído em estrutura de aço e concreto, destinado ao atendimento da população da Grande João Pessoa, com cerca de

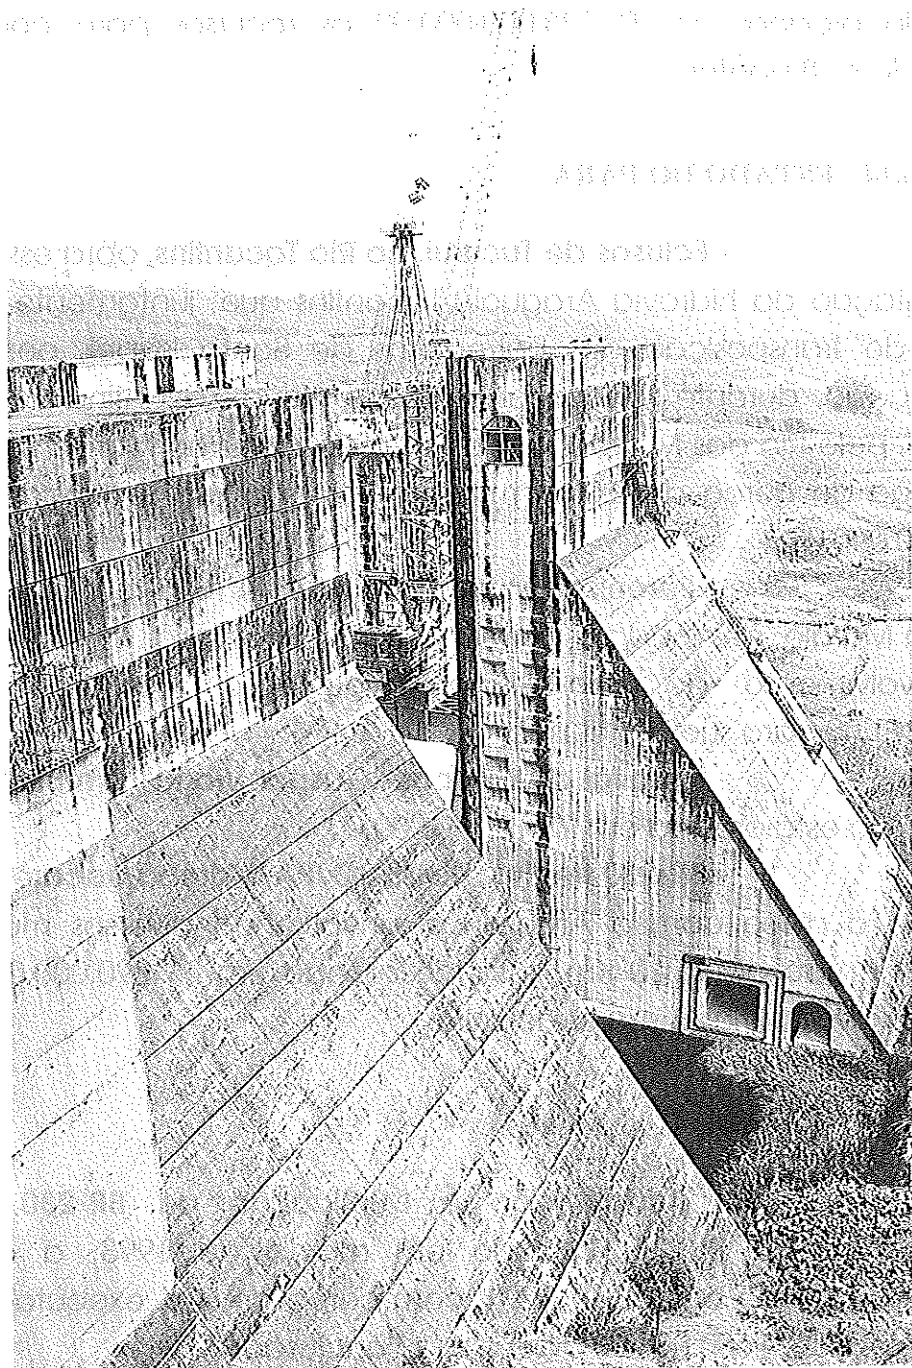

Eclusas de Tucuruí no Rio Tocantins-PA

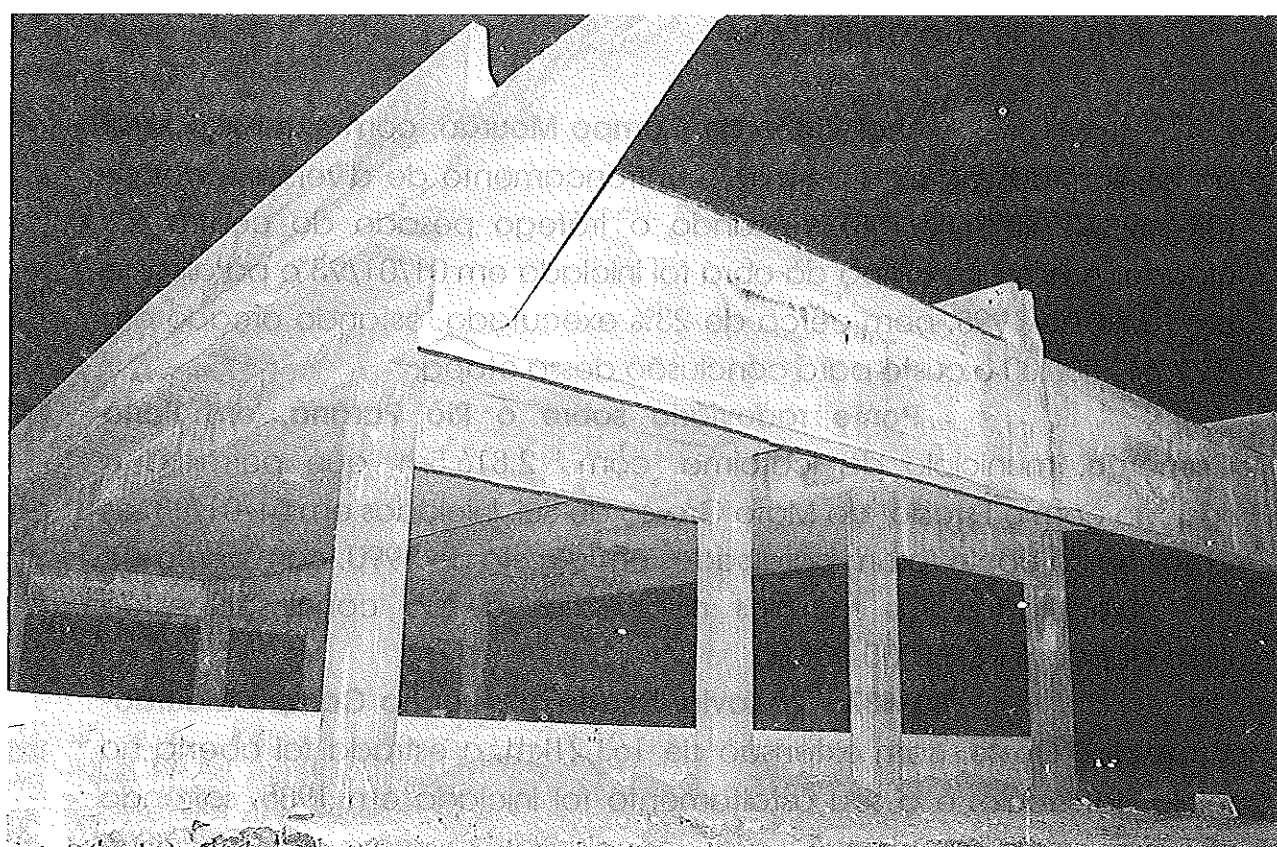

Viaduto em João Pessoa - PB

700.000 habitantes. A obra foi iniciada em setembro de 1990, encontra-se paralisada desde maio de 1995, com aproximadamente 45% executada, sendo necessários R\$ 5.078.700,00 para sua conclusão;

- **Barragem Várzea Grande, em Picuí**, de concreto compactado a rolo, com um volume de água de 22 milhões de metros cúbicos, destina-se ao abastecimento de água à população e execução de projetos de irrigação e piscicultura. Esta obra foi iniciada em outubro de 1990, estando paralisada desde dezembro de 1993, com aproximadamente 42% da barragem executada. Para a sua conclusão são necessários recursos da ordem de R\$ 4.400.000,00.

6.16 - ESTADO DO PARANÁ

- **Anel Viário de Campo Mourão**, com extensão total de 28,4km, destina-se a permitir o entroncamento de diversas rodovias (BR-369/272/487/558/158), retirando o tráfego pesado do centro da cidade. A primeira etapa da obra foi iniciada em 01/01/93 e paralisada em maio de 1995, com cerca de 23% executada, estando orçado em R\$ 2.640.000,00 o custo para conclusão dessa etapa.

- **Ponte rodoviária sobre o Rio Paraná, em Porto Camargo**, município de Icaraíma, com 2.816,5m, que permitirá a ligação com o Estado do Mato Grosso do Sul. Iniciadas em 01/01/88, as obras dessa ponte foram paralisadas em agosto de 1990, com cerca de 28% executadas. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 68.000.000,00;

BR-487, "Rodovia Boiadeira", trecho Campo Mourão-Cruzeiro D'Oeste, com extensão de 163,21km, a estrada foi aberta no início do século, e o seu asfaltamento foi iniciado em 1985, sofrendo diversas paralisações. A sua conclusão marcará a definitiva implantação do Corredor Setentrional de Exportação do País. O custo dessa obra está estimado em R\$ 73.444.000,00, correspondente a R\$ 480.000,00 o custo médio por quilômetro;

- **Ponte sobre o Rio Paraná**, na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, que permitirá integrar os dois estados e a região oeste do Brasil. Propiciará a ligação intermodal com a Ferroeste e a Hidrovia Paraná-Tietê. Esta obra foi iniciada em 11/01/94 e paralisada em dezembro do mesmo ano, com 43,5% executados. Somam R\$ 15.000.000,00 os recursos necessários à sua conclusão

6.17 - ESTADO DE PERNAMBUCO

- **BR-408.** Conclusão de um segmento de 4km (de um subtrecho de 17,66km), no trecho (Curado-Bicopeba), no valor estimado de R\$ 1.800.000,00;

- **BR-101,** constitui-se na implantação de quatro faixas de rolamento no trecho Prazeres-Cabo, de pista dupla de 24,8km, equivalentes a cerca de 55 quilômetros de pista simples. É uma obra de vital importância, uma vez que é a saída de Recife em direção do Sul do País, onde vem ocorrendo constantes e graves acidentes. Para a sua conclusão são requeridos R\$ 37.449.600,00;

- **Adutora do Oeste,** destinada a assegurar água para uma população de 300.000 habitantes e desenvolver atividades produtivas. Composta de uma adutora com extensão aproximada de 450km e várias estações de bombeamento. Seu percentual de execução é de 5%, e suas obras encontram-se paralisadas desde 1994. O valor necessário para a sua conclusão é de R\$ 70.000.000,00 para a 1ª etapa e R\$ 30.000.000,00 para a 2ª etapa;

- **Barragem do Jucazinho,** localizado no Município de Surubim com uma capacidade de acumulação de 241 milhões de m³ que, além de beneficiar uma população de 350.000 pessoas, com o abastecimento de água para a população, permitirá irrigar 1.200ha. Com suas obras paralisadas desde 1994, encontra-se 5% executada e são necessários R\$ 25.000.000,00 para o seu término;

- **Hospital Geral de Olinda,** com capacidade para 150 leitos, estando 40% de suas obras executadas. São necessários R\$ 4.000.000,00 para a sua conclusão;

- **Barragem de Serrinha,** com uma capacidade de acumulação de 311 milhões de m³, que irá permitir, através da perenização do Rio Pajeú, a instalação de um distrito de irrigação com 4.000ha numa região do Estado extremamente seca e pobre. Com suas obras paralisadas desde 1992, encontra-se 85% executada e são necessários R\$ 3.000.000,00 para o seu término.

Obra Regional

-**Ferrovia Transnordestina.** Implantação de dois trechos ferroviários (Salgueiro-Petrolina/PE e Salgueiro-Missão Velha/CE), que atenderão a todos os estados da Região Nordeste. Trata-se de uma via estratégica para a integração daqueles estados, além de permitir o



Hospital Geral e Maternidade de Olinda-PE



***Duplicação da
BR-101 -
Recife-PE***

escoamento da produção agrícola e mineral do Oeste da região, sobretudo daquelas do São Francisco e do Araripe, até os portos do Recife e Suape. É a obra inacabada mais antiga do País, uma vez que foi iniciada ainda no Império e até hoje não está concluída. Está com suas obras paralisadas desde 1992 e para a conclusão dos 212 quilômetros restantes são necessários R\$ 267.000.000,00.

6.18 - ESTADO DO PIAUÍ

- **Hospital Universitário da UFPI**, com área construída de 18.646m², e capacidade para 196 leitos. O Estado do Piauí é dos poucos estados brasileiros a não contar com um hospital universitário, apesar do curso de medicina existir há mais de um século. A construção do hospital foi iniciada em 1989 e paralisada em 1994, com 36,2%. A sua conclusão exige recursos da ordem de R\$ 15.360.400,00;


- **Anel Viário de Teresina**, iniciado em setembro de 1993 e paralisado em julho de 1995, com cerca de 70% executados. Constitui-se no corredor de escoamento de maior volume de tráfego de Teresina (5.000 veículos/dia) e acesso a 12 bairros e, segundo as autoridades locais, a obra é extremamente necessária à cidade. Existe um débito residual com a construtora de R\$ 1.700.000,00 e os custos para sua conclusão chegam R\$ 3.400.000,00;

- **Barragem Petrônio Portela**, na cidade de São Raimundo Nonato, sobre o rio Piauí, destinada ao abastecimento de água para a população e execução de projetos de irrigação, piscicultura e lazer. A obra foi iniciada em 1985 e paralisada, pela última vez, em dezembro de 1993, com 75% executados. Os recursos necessários à sua conclusão são de R\$ 4.082.000, 00 sendo R\$ 2.324.000,00 do governo estadual e R\$ 1.758.000,00 da União.

- **Ponte sobre o Rio Poti**, com 252 metros de extensão. Iniciada em 1992, a obra foi paralisada em 1994, com cerca de 25% executados. Os recursos necessários à sua conclusão são da ordem de R\$ 4.000.000,00.

6.19 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

- **Construção da Aduana do Agreste/Trairi**, atingindo diversos municípios do Estado. Obra contratada em maio/94 e

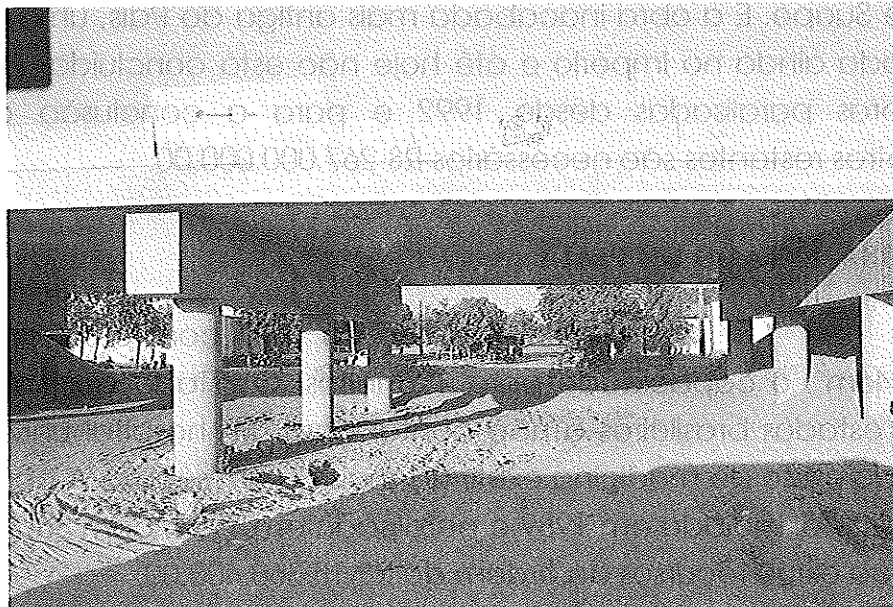

Anel Viário de Teresina-PI



***Pronto Socorro
de Teresina-PI***

paralisada logo em dezembro/94. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 38.570.000,00;

- **Unidade Mista de Saúde de Igapó**, com 50 leitos, no município de Natal. Iniciada em outubro de 1989 e paralisada em dezembro/91. São necessários cerca de R\$ 3.300.000,00 para sua conclusão;

- **Unidade Mista de Saúde**, com 50 leitos, no município de Assu. Iniciada em setembro/89 e paralisada em novembro/92. Os recursos necessários à sua conclusão estão orçados em R\$ 2.800.000,00;


- **BR-101**, construção do trecho Natal-Touros. Contratada em agosto de 1993, foi paralisada no mês seguinte, no valor de R\$ 24.719.685,16, mesmo valor requerido para sua conclusão;

- **Barragem de Santa Cruz**, nos municípios de Apodi e Mossoró. Contratada em outubro de 1989, foi paralisada no mês de dezembro de 1994. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 170.000.000,00;

6.20 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- **Usina Termelétrica de Candiota III**, no Município de Candiota-RS, com capacidade de 350mW. Teve o seu contrato de financiamento firmado em 1981, com a empresa GEC Alsthon. Os equipamentos, de origem francesa foram produzidos e encontram-se até hoje armazenados no Porto de Marselha gerando, dentre outros, o custo de armazenamento da ordem de um milhão de dólares/ano. Já está sendo encaminhada uma solução para a conclusão de Candiota III, com um projeto de lei em tramitação neste Congresso Nacional, autorizando a federalização da dívida, de US\$ 341,2 milhões, o que permitirá realizar a concessão a empresa privada da exploração da termelétrica por um determinado período, em troca da sua conclusão;

- **Usina Termelétrica de Jacuí - I**, no município de Eldorado do Sul, com capacidade nominal de 350mW, correspondente a 18% do mercado de energia do Rio Grande do Sul. Sua construção teve início em setembro de 1985, sob a responsabilidade da ELETROSUL, e paralisada em novembro de 1991, estando já concluídos 40%, correspondentes à aplicação de US\$ 420,5 milhões, dos US\$ 689,5 milhões previstos. Os equipamentos encontram-se estocados na obra, gerando um custo anual de guarda e manutenção da ordem de US\$ 630 mil. A solução desse problema, já em andamento, consiste na

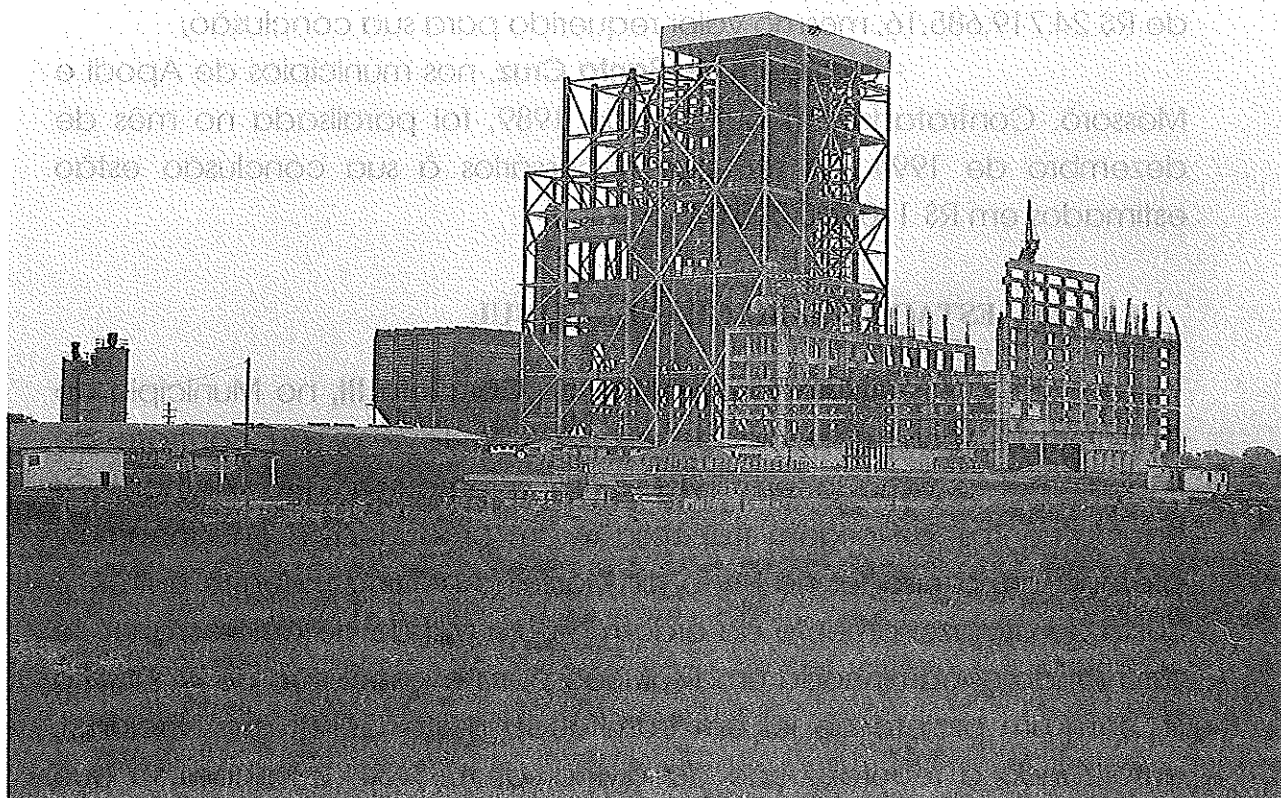

Usina termelétrica de Jacuí - RS

concessão mediante licitação da exploração e manutenção da usina e a venda da energia produzida à ELETROSUL, em contrapartida à conclusão da obra;

- **Ponte do Barracão na Rodovia BR-470**, sobre o Rio Uruguai, na divisa dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que liga os Municípios de Barracão a Campos Novos, com extensão de 600 metros. Sua construção teve início em 1982, paralisada diversas vezes, tendo sido aplicados mais de R\$ 10,0 milhões, com cerca de 81,3% de seus serviços executados. Estima-se em R\$ 3.000.000,00 os recursos necessários à sua conclusão. Essa obra foi delegada ao governo gaúcho, que se responsabilizou por sua conclusão, em parceria com a União.

- **Hospital Geral de Caxias da Sul**, na BR-116, próximo ao acesso à Universidade local, com total de 12.887m², em seis pavimentos e um bloco de serviços gerais, com capacidade para 240 leitos, destinado ao atendimento de uma população de 700 mil habitantes. Sua obra foi iniciada em 01/12/90 estando paralisada com 68% executados. O contrato foi firmado com o valor de R\$ 9.953.149,00, estimando-se em R\$ 2.192.873,00 os recursos necessários à sua conclusão.

6.21 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- **BR-101**, duplicação do trecho Rio Bonito-Silva Jardim, com extensão de 25 quilômetros, a um custo estimado de R\$ 37.500.000,00;

- **Hospital de Queimados**, com 16.182m² e uma capacidade para 180 leitos. A obra foi iniciada em janeiro de 1991 e paralisada em janeiro de 1992, tendo sido já executados 32% e pagos apenas 16,54%. O saldo dos serviços a executar é de R\$ 12.250.000,00, ou R\$ 17.500.000,00 incluindo os equipamentos;

- **Hospital de Saracuruna**, com 16.180m² e capacidade de 160 leitos, cujas obras foram iniciadas em janeiro de 1991 e paralisadas em janeiro do ano seguinte, tendo sido executados 44,8% da obra, correspondendo a 100% da infra-estrutura e estrutura, 80% da cobertura, 30% da alvenaria, 15% das instalações e 5% das massas. O saldo dos serviços a executar é de R\$ 11.325.000,00 a preços de setembro/94, sendo que, da parcela executada, não foram pagos

17,29%, de acordo com as autoridades locais; os recursos necessários à conclusão das obras civis e equipamentos estão estimados em R\$ 16.500.000,00.

6.22 - ESTADO DE RONDÔNIA

- **Hospital Municipal de Cacoal**, para 150 leitos, iniciado em 11/07/91 e paralisado em 06/04/92. O contrato original é de R\$ 29.644.172,96, tendo sido pago o valor de R\$ 4.268.179,87, correspondendo a 21,48% e falta R\$ 25.000.000,00 para concluir;

- **Construção de duas escolas com 40 salas de aula cada e dois ginásios cobertos**. Trata-se de um conjunto de duas escolas com o mesmo projeto, uma apenas iniciada e outra na fase de acabamento, esta última iniciada em 27.12.91 e paralisada em 09.06.92, com 48% executada, faltando R\$ 12.503.547,00 para sua conclusão;

- **Complexo Penitenciário de Segurança Máxima em Guajará-Mirim**, contratada em 06/08/92 por R\$ 35.838.517,00 e paralisada em 18/05/93, com apenas R\$ 507.752,00 medidos, ou seja, 1,45%;

- **Construção da Casa de Detenção de Porto Velho**. Constitui-se de obra iniciada em 14/04/88, em andamento, estando em fase final de construção. As autoridades locais informaram que o orçamento para o corrente exercício aloca o valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), que deverá ser praticamente suficiente para colocar a obra em condições de utilização. Já o formulário entregue à Comissão Indica uma percentagem construída de 67,26%, exigindo-se o valor de R\$ 6.600.500,00 para sua conclusão;


A Comissão visitou, ainda, a Universidade Federal de Rondônia, ainda inconclusa, uma vez que, dos 25.020m² constantes do projeto inicial, só foram construídos 11.007m², restando ainda parte dos laboratórios, de salas de aulas teóricas, práticas de educação física, além de locais para a administração central, alojamentos. A Comissão considera necessária a conclusão da Universidade, cujo custo é de cerca de R\$ 8.400.000,00.

6.23 - ESTADO DE RORAIMA


- **BR-174, trecho Caracaráí-Divisa RR/AM**, com extensão de cerca de 333,2 quilômetros e 35 pontes de concreto,




Casa de detenção de Porto Velho - RO

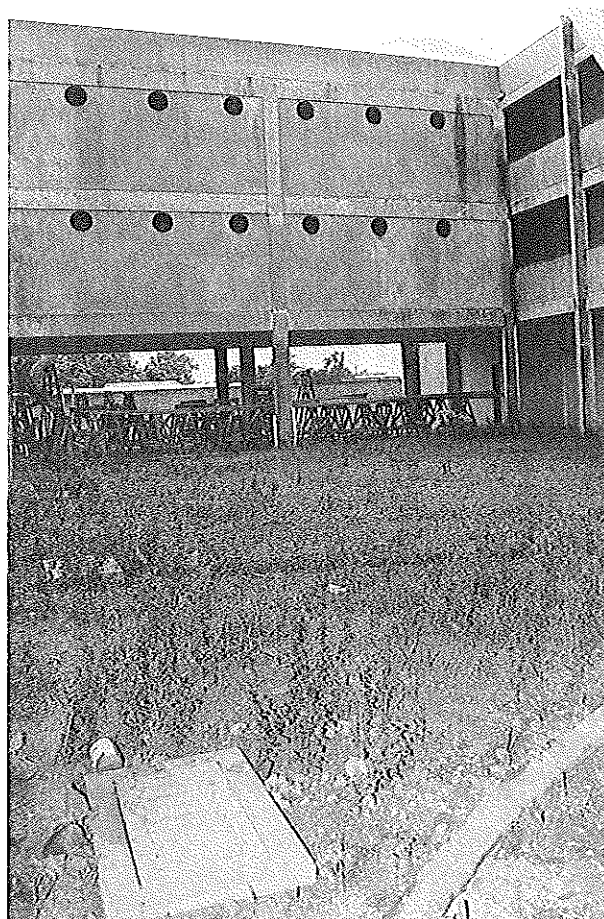

*Escola de 2º Grau do Bairro
Jardim Eldorado em Porto
Velho - RO*

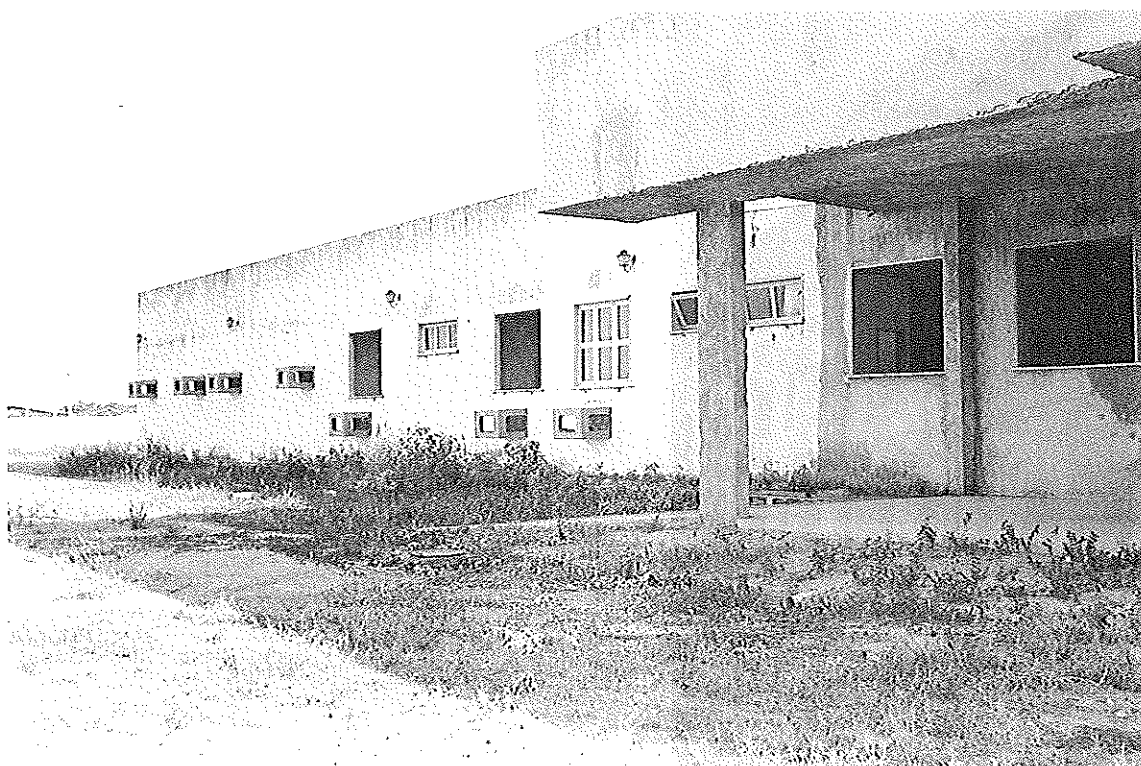

Hospital Geral de Urgências de Boa Vista - RR

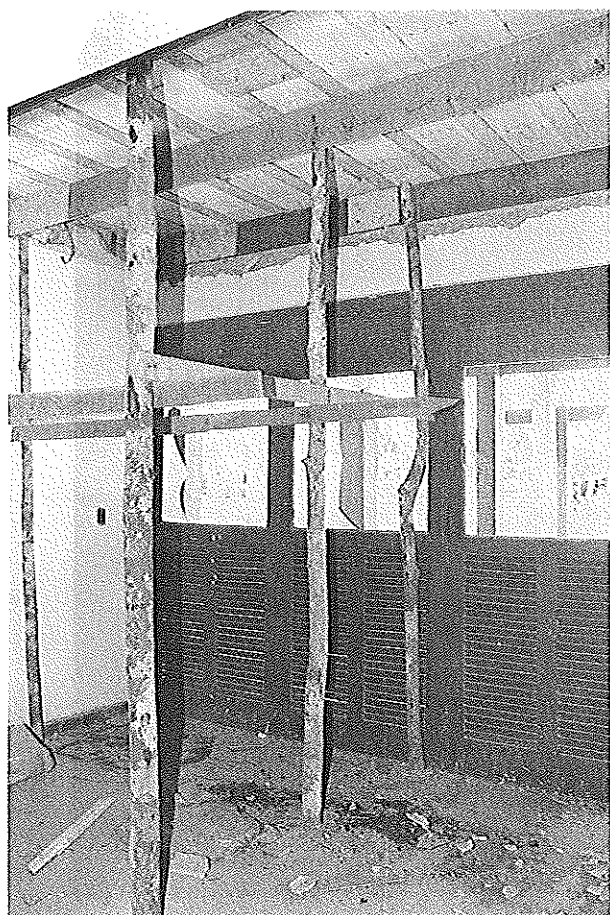

*Posto de Saúde do bairro
Pricumã em Boa Vista - RR*

sendo uma com 700 metros, sobre o Rio Branco. O custo total da obra, incluindo pavimentação, construção das pontes, elaboração do projeto e fiscalização, está estimado em R\$ 71.850.000,00;

- **BR-401, trechos I, de Boa Vista a Bonfim**, na divisa do Brasil com a Guiana, com extensão de 158 quilômetros e 2 pontes, orçado em R\$ 22.054.000,00, e **trecho II, entroncamento de Bonfim a Normandia**, com 78 quilômetros, cujo custo está orçado em R\$ 10.140.000,00;

- **Hospital de Urgências de Boa Vista**, com apenas 30% concluídos, necessitando de recursos da ordem de R\$ 8.386.000,00 para a conclusão das obras civis;

- **Posto de Saúde de Pricumã**. Reforma e ampliação de posto de saúde, já em fase bastante adiantada, sob a responsabilidade do Governo Municipal, faltando R\$ 243.000,00 para sua conclusão. A Comissão considera que esta obra pode ser concluída com recursos municipais.

6.24 - ESTADO DE SANTA CATARINA

- **BR-282, trecho Lages-Campos Novos**, passando por São José do Cerrito e Várzea, com cerca de 100Km, e seus extremos, de 20Km de São Miguel D'Oeste ao Rio Peperiguaçu e o Contorno de Santo Amaro, na Grande Florianópolis. O trecho entre Lages e São José do Cerrito, com extensão de 32 km, está sendo executado pelo Batalhão Ferroviário do Ministério do Exército, sediado em Lages, cujo custo é estimado em R\$ 2.100.000,00. A obra completa está orçada em cerca de R\$ 20.000.000,00. Destaque-se que essa rodovia liga Florianópolis à divisa com a Argentina, atravessando todo o Estado de Santa Catarina, ou seja, interligando o Oceano Atlântico àquele País vizinho;


- **BR-280, trecho Corupá-São Bento**, e contorno deste, orçado em R\$ 2.000.000,00;

- **BR-101**, duplicação (em equacionamento);

- **Hemocentros** de Chapecó, Joinville e Criciúma, custando cerca de R\$ 500.000,00 cada um;

- **Usina Termelétrica** de Jorge Lacerda IV, apenas obras de conclusão;

- **Usina Hidroelétrica de ITÁ** (em equacionamento).

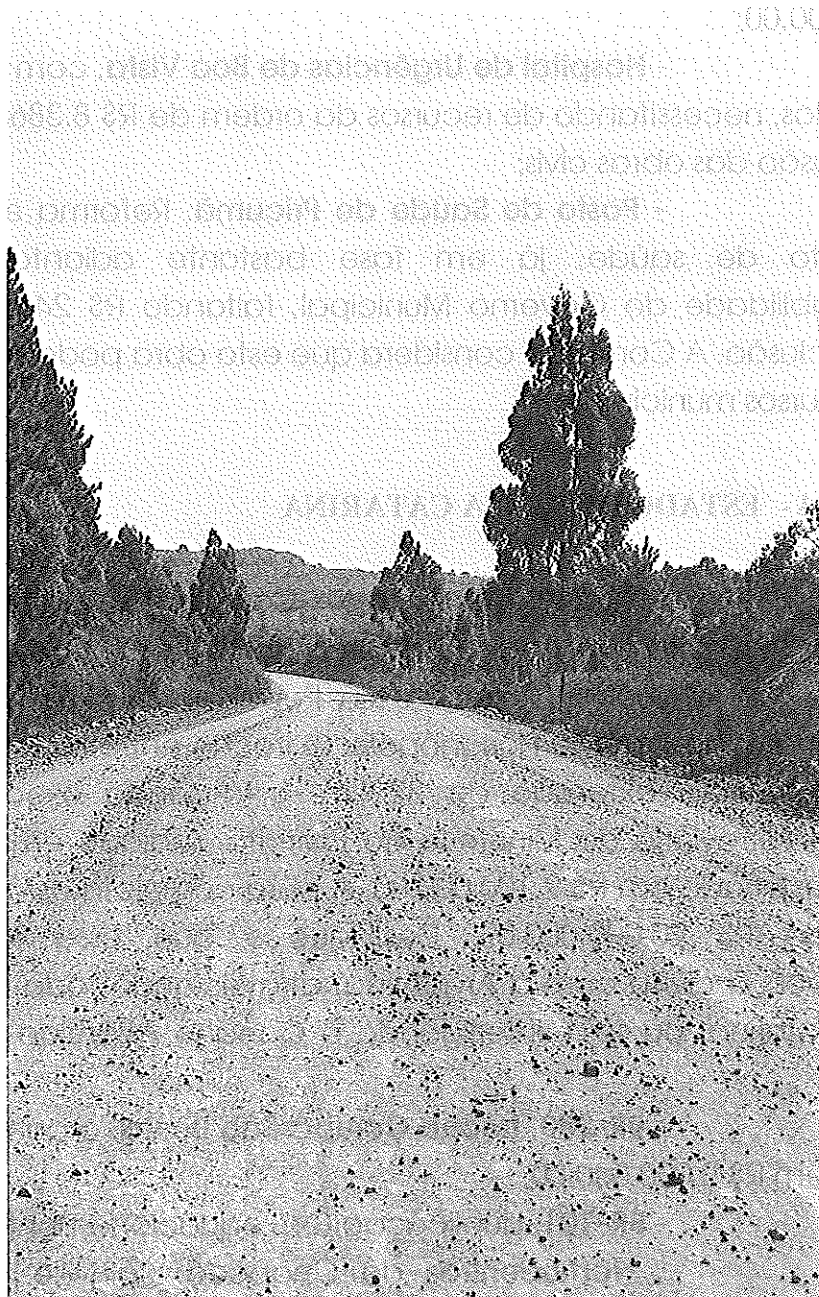

BR - 282 – Trecho Lages–Campos Novos - SC

Recomenda-se uma decisão de responsabilidade em relação às barragens do Alto Vale do Itajaí, pois as mesmas já começam a preocupar em função da falta de conservação. São exemplos de obras acabadas, porém abandonadas.

6.25 - ESTADO DE SÃO PAULO



- **Hospital Geral de Itapecerica da Serra**, com 9.140m², para 150 leitos, composto de 12 prédios, estilo pavilhonar. A obra foi iniciada em outubro de 1989 e paralisada em novembro de 1991, com cerca de 55% executados. O valor estimado para conclusão é de R\$ 6.567.310,00, a preços de julho/95. Consta que existe um débito atual de R\$ 3.096.003,00 junto à construtora;

- **Hospital Geral de Itaim Paulista**, na capital paulista, consiste numa edificação de 6 pavimentos, com 15.800 m², para 220 leitos, iniciada em 03.07.79, estando com 65% executados. O valor para concluir (saldo contratual) chega a R\$ 9.075.583,00 a preços de julho/95, constando um débito de R\$ 1.043.198,00;

- **Ponte Rodoferroviária em Santa Fé do Sul**, com 2.600 metros sobre o Rio Paraná, na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Obra em estrutura mista de concreto armado e treliça metálica, com viadutos de acesso de 1.170 metros e acesso ferroviário da ponte a Santa Fé do Sul, com extensão de 17.000 metros. A obra foi iniciada em janeiro de 1991, mediante convênio firmado entre a União e o Governo do Estado de São Paulo; já foram aplicados R\$ 402,7 milhões, correspondendo a 58,78% dos R\$ 685,1 milhões previstos, excluído o acesso ferroviário. Estão estimados em R\$ 282.613.582,00 os recursos necessários à conclusão da obra, dos quais R\$ 80.000.000,00 constam da proposta do Orçamento Geral da União para 1996;

- **BR-381 Rodovia Fernão Dias, duplicação do trecho São Paulo-Atibaia**, com extensão de 53,4 quilômetros. Obra financiada com recursos do BID, foi iniciada em maio de 1994 e paralisada em fevereiro de 1995. Foi executada apenas a parcela de 10%, correspondente a R\$ 13,0 milhões, sendo R\$ 5,0 milhões provenientes do Governo de São Paulo, R\$ 5.500.000,00 do BID e R\$ 2.200.000,00 da União/DNER. O valor previsto para a conclusão deste investimento é de R\$ 190.000.000,00;

*Hospital de Jaboatão
da Serra em São
Paulo*

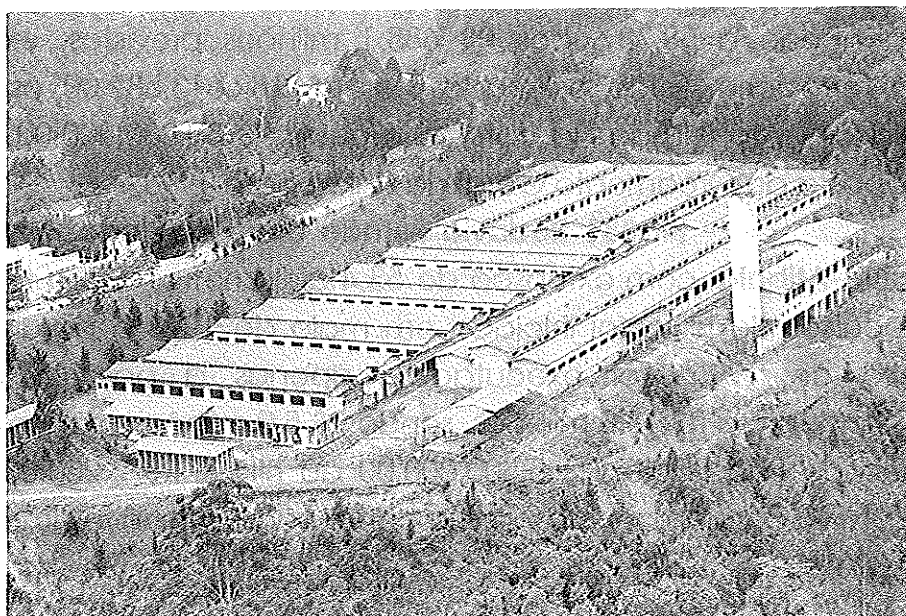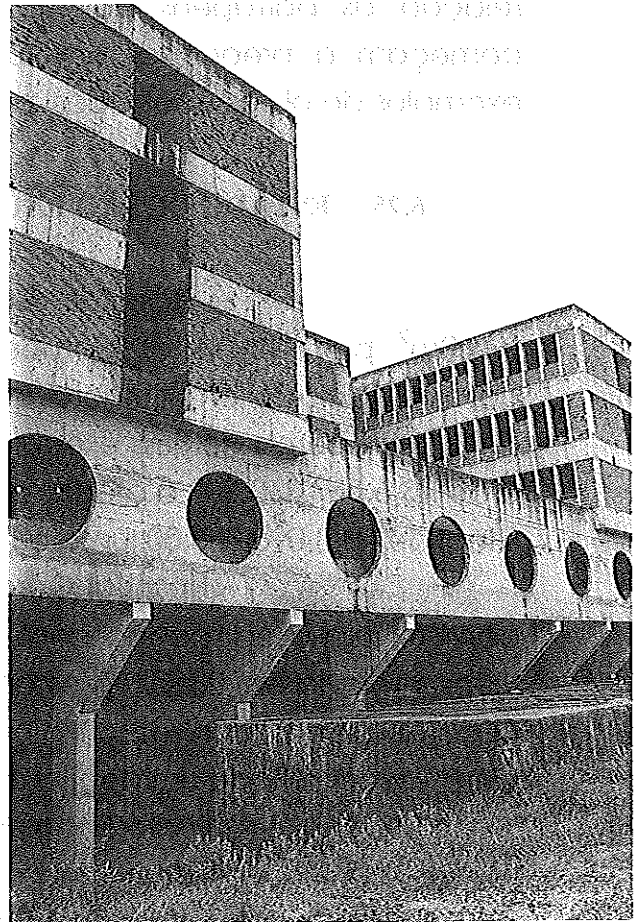

Hospital Geral de Itapequerica da Serra em São Paulo

- **BR-116, Rodovia Régis Bittencourt, no trecho São Paulo-Cajati**, em dois trechos: **1º Trecho**, constante da execução de 7 trevos e respectivas duplicações (mini-duplicações) no trecho São Paulo-Cajati, numa extensão de 43 quilômetros, em execução mediante convênio entre a União/DNER e o Governo de São Paulo/DER. Obra iniciada em dezembro de 1992 e paralisada em novembro de 1994, já tendo sido executados 34%, do total de R\$ 130 milhões previstos; **2º Trecho**, constante da duplicação, melhoramentos, conservação e operação rodoviária do trecho São Paulo-Juquitiba, numa extensão de 60 quilômetros, sendo que 30 km foram duplicados anteriormente. Obra iniciada em 1990 e paralisada desde novembro 1994, com apenas 2% dos 30km restantes da duplicação executados. Já foram aplicados desde 1990, R\$ 100.700.000,00, sendo R\$ 50.900.000,00 em duplicações e melhoramentos, R\$ 36.900.000,00 em manutenção e conservação e R\$ 12.900.000,00 em operação rodoviária. São previstos recursos da ordem de R\$ 96.000.000,00 para sua conclusão.

6.26 - ESTADO DE SERGIPE

- **Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Aracaju**, com a construção de 18.000 metros de adutoras, 2 reservatórios de 10.000m³, 40.000m de rede de distribuição e uma estação elevatória. A obra foi iniciada em agosto de 1991 e paralisada em março do corrente ano, com 75% executados. Os recursos necessários à sua conclusão são de R\$ 11.785.000,00;

- **Obras de Estabilização do Molhe da Atalaia Nova, em Barra dos Coqueiros**. Obra iniciada em janeiro de 1989, encontra-se paralisada desde abril de 1994, com 47,45% concluídos. Os recursos necessários à sua conclusão chegam a R\$ 12.466.600,00;

- **Obras de proteção da Praia da Coroa do Meio**, em Aracaju, destinada, junto com a obra descrita no item anterior, a proteger a praia do avanço do mar. Essa obra foi iniciada em janeiro de 1989 e paralisada em junho de 1994, com 35% executados. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 9.012.000,00;

- **Projeto de Irrigação de Jacarecica II**, no município de Malhador. Constitui-se na construção de uma barragem de 50,00m de altura e volume de aterro de 600.000m³ e 50km de canais de



Obra de proteção da Praia da Coroa do Meio em Aracajú-SE

irrigação, prevendo-se irrigar 1.600ha. A obra foi iniciada em maio de 1992 e paralisada algum tempo depois, com 25% concluídos. Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R\$ 22.881.329,00.

6.27 - ESTADO DO TOCANTINS



- **Hospital Geral de Tocantins, em Palmas**, com área prevista de 8.300m² e capacidade para 200 leitos. Essa obra foi iniciada em 27/11/89 em convênio com o SUS e paralisada em 04/03/91, com apenas 12,5% executada. Os recursos necessários à conclusão estão estimados em R\$ 7.410.164,00. Foi informado à Comissão que o contrato original, com a empresa Estacon, foi sub-rogado a outra empresa, procedimento que a Comissão considera necessário investigar. Além disso, a parcela física executada é mínima;

- **Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Tocantins - LACEN**, com área projetada de 6.314m², está paralisado desde dezembro de 1994, com cerca de 52% executados. O LACEN foi concebido para ser, nessa área, o centro de referência no Estado. Os recursos necessários à conclusão do Laboratório estão estimados em R\$ 1.500.000,00;

- **BR-153, trecho Wanderlândia-Xambioá**, com 90 quilômetros de extensão, cujo orçamento para execução é de R\$ 16.000.000,00. Este trecho viabiliza a ligação da região produtora de grãos do Centro Oeste ao posto de Itaquí, pelo sistema Intermodal do Araguaia-Tocantins;


- **Ponte de Concreto sobre o Rio Tocantins**, na Rodovia TO-010, entre os Municípios de Miracema do Tocantins e Tocantínia, com 879m de extensão. Esta obra conta com 23,86 executados e é de grande importância, pois interliga o norte do Estado com a Capital. Para sua conclusão são necessários R\$ 26.000.000,00.

**Laboratório Central de
Saúde Pública do
Estado de Tocantins -
LACEN (TO)**

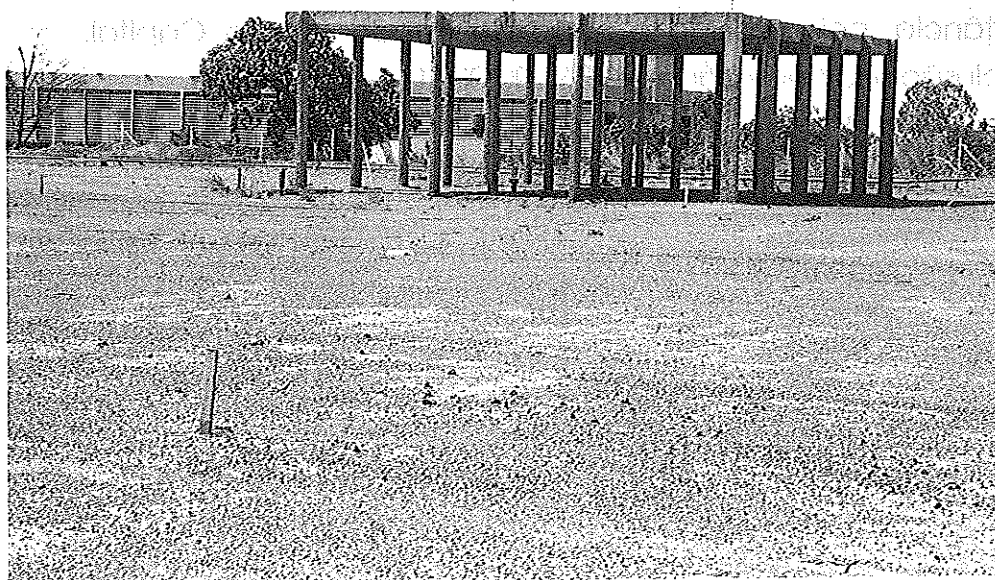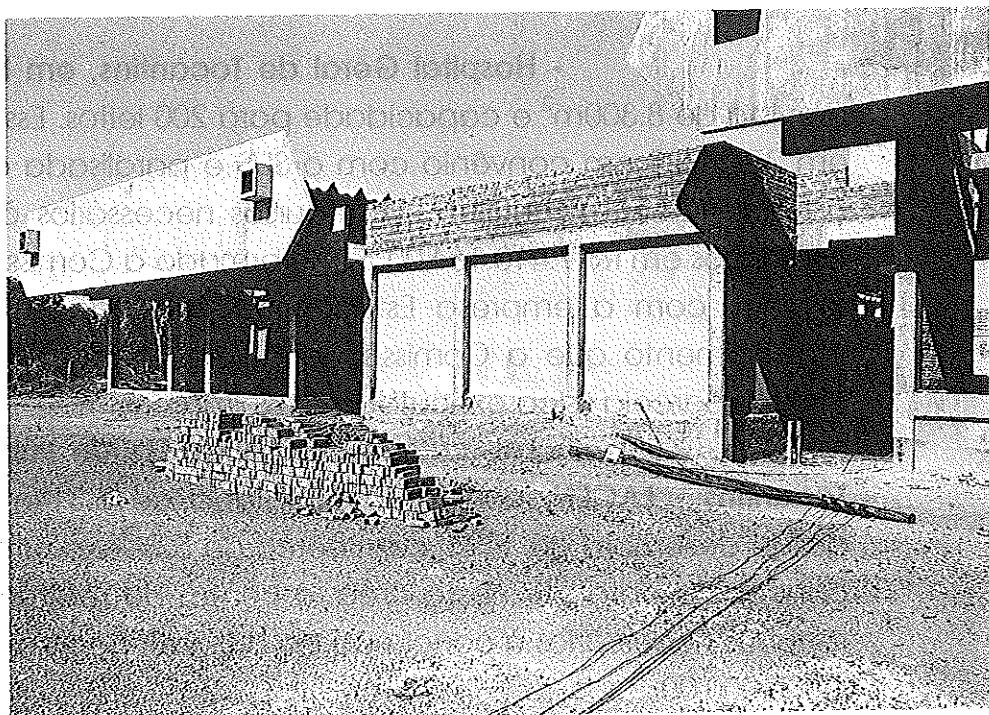

**Hospital Geral de
Tocantins em
Palmas-TO**

"O Mapa do Abandono no País do Desperdício."

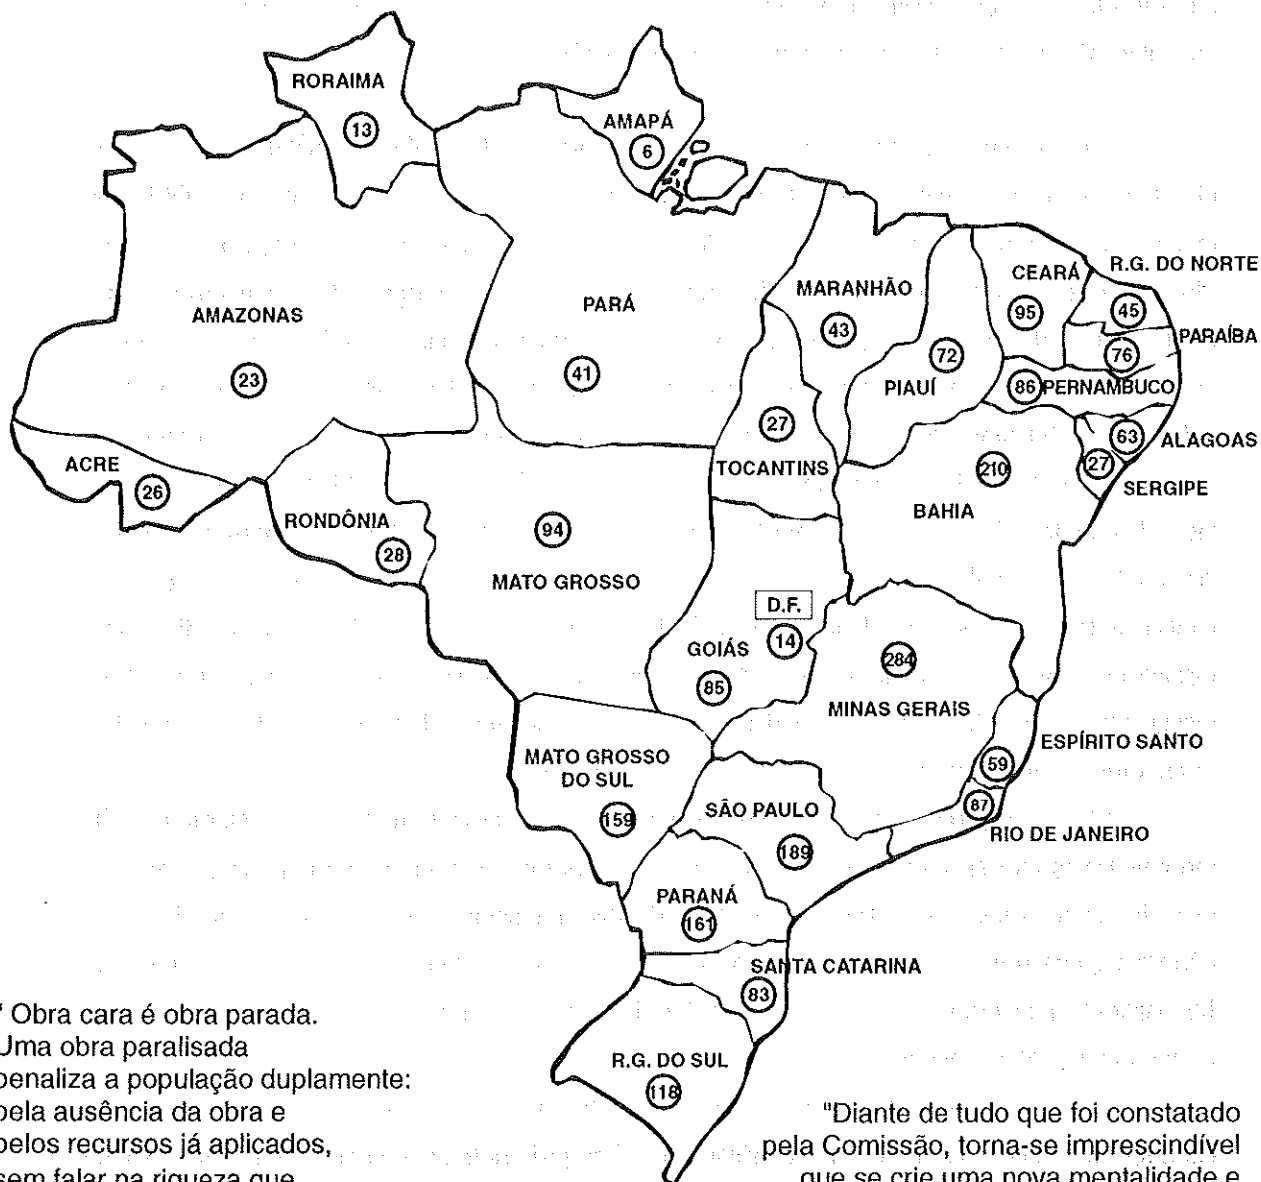

"Obra cara é obra parada. Uma obra paralisada penaliza a população duplamente: pela ausência da obra e pelos recursos já aplicados, sem falar na riqueza que se deixa de produzir, em prejuízo do desenvolvimento econômico e social do País."

Presidente
Senador Carlos Wilson

"Diante de tudo que foi constatado pela Comissão, torna-se imprescindível que se crie uma nova mentalidade e mecanismos que acabem com o vício de iniciar obras, sem que se ofereçam meios para a sua conclusão."

Relator
Senador Casildo Maldaner

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A conclusão geral da Comissão é no sentido de que o problema das obras inacabadas merece especial atenção, razão pela qual deve ser enfrentado com seriedade pelo Governo Federal, numa ação conjugada de todos os Poderes e Órgãos. Como já exhaustivamente dito, uma obra paralisada acaba significando dupla penalização à população: pela ausência da obra e pelo desperdício dos recursos já aplicados.

Dessa forma, à guisa de serem buscadas as causas das paralisações de milhares de obras em todo o País, consideramos pertinente tecer as seguintes considerações:

7.1 - a principal causa da paralisação das obras públicas é, sem dúvida, a desordem das finanças públicas vivida pelo País nos últimos anos, caracterizada, de um lado, pela situação econômica que deprime a arrecadação e, de outro, pela sobrecarga dos encargos da dívida pública, cuja consequência é uma crônica falta de recursos orçamentários. A propósito desse assunto, vale lembrar que as normas infraconstitucionais sobre elaboração e execução do orçamento, ainda se encontram regidas pela Lei nº 4.320, de 17/03/64, concebida na década de 50. A Constituição de 1988, no entanto, instituiu novo modelo de elaboração orçamentária, que inclui a aprovação de lei complementar sobre finanças públicas, sobre a qual tramitam diversos projetos neste Congresso. Na ausência dessa lei complementar, assuntos que lhe são pertinentes vêm sendo tratados de maneira precária pelas leis de diretrizes orçamentárias;

7.2 - o processo de elaboração do orçamento é caótico. Os problemas começam na elaboração das propostas setoriais, em termos de fixação das previsões e estimativas, passam pelas dificuldades do Órgão central em criticar as informações físico-financeiras colocadas e terminam na profusão de emendas individuais que sofre a proposta no Congresso Nacional.

As razões são que o Orçamento Geral da União é elaborado sem uma clara definição das prioridades nacionais de longo prazo, o que acaba levando à descontinuidade dos programas, e à pulverização dos poucos recursos disponíveis. Parece faltar às autoridades responsáveis a noção da extrema importância da Lei do Orçamento, como instrumento da busca da justiça social.

No que se refere à apreciação da proposta pelo Poder Legislativo, pode-se dizer que os Parlamentares ainda não encontraram uma forma de participar efetivamente do processo de elaboração do orçamento, ou seja, firme, racional e eficiente, após o longo jejum imposto durante o regime militar, época em que os Parlamentares não podiam apresentar emendas à proposta orçamentária.

Observe-se, nesse sentido, que da "fase da não-emenda", que vigorou durante o regime militar, passamos para uma situação inversa após a Constituição de 1988, que pode ser chamada de "fase da emenda irresponsável", caracterizada pela apresentação indiscriminada de emendas, independentemente da sua necessidade, oportunidade e sem considerar as prioridades do País como um todo. Para o orçamento de 1993, foram apresentadas mais de setenta mil emendas. O resultado desse processo, como não poderia deixar de ser, foi a não-aprovação da quase totalidade das emendas e, mesmo aquelas que passaram pelo crivo do Congresso Nacional, ou foram vetadas ou contingenciadas, como ocorreu também no orçamento para o corrente exercício de 1995;

7.3 - a solução de algumas obras inacabadas não depende de recursos orçamentários, mas da adoção de procedimentos administrativos e legais, que permitam e viabilizem a concessão de sua exploração à iniciativa privada, por prazo certo, em troca da sua conclusão e manutenção, a exemplo do que já vem ocorrendo com usinas termelétricas, pontes, algumas rodovias, portos e outras;

7.4 - o Senado Federal não vem exercendo a contento a sua atribuição fiscalizadora, que deve ser persistente e permanente, mas limitando-se a investigar assuntos pontuais, decorrentes de denúncias ou de provocações eventuais de Senadores, o que acaba não conduzindo a um resultado prático e consistente. Nesse sentido, verifica-se que a Comissão de Fiscalização e Controle, embora instituída em 1993 pela Resolução Nº 46, somente foi formada em meados deste ano e apenas agora começa a funcionar;

7.5 - o Congresso Nacional não tem aproveitado os resultados das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da União. Nesse ponto, o Congresso deve funcionar como uma caixa de ressonância das proposições e recomendações da Corte de Contas, notadamente na adoção de medidas de caráter normativo-legal ou de políticas

públicas. Com isso, são perdidas excelentes oportunidades de aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão da *res publica*.

7.6 - também é causa da existência de obras inacabadas a falta de controle que se verifica em todos os órgãos da União. Esse descontrole decorre da desorganização geral do Estado ocorrida nos últimos anos, em que as funções de controle foram relegadas a segundo plano. A propósito, nota-se que a Secretaria Federal de Controle e todo o Sistema de Controle Interno, estão vinculados ao Ministério da Fazenda, onde se situam também as áreas de arrecadação, execução e escrituração das despesas públicas⁹, representando um claro desrespeito ao princípio administrativo da segregação de funções. Além disso, o SCI, juntamente com o Sistema de Planejamento e Orçamento, vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, vêm sobrevivendo, há quase dois anos, através de medidas provisórias que são indefinidamente reeditadas;

7.7 - observa-se uma grande disparidade nos preços médios das obras e serviços contratados nos últimos anos, não raro muito elevados e superfaturados, resultado, tanto do agudo processo inflacionário em que vivia o País, quando era prática comum a inclusão nos preços de uma espécie de "seguro-inflação", como das comissões pagas à corrupção. Essa disparidade é observada até mesmo na proposta orçamentária preparada pelo Poder Executivo. Daí porque é de bom alvitre que todas as obras que forem retomadas sejam objeto de prévia auditoria;

7.8 - também o superfaturamento e a grande maioria das irregularidades que recaem sobre as obras e serviços de engenharia decorrem da falta de controle dos órgãos do Estado.

7.9 - o atraso nos pagamentos dos serviços prestados nos prazos contratados, igualmente, é causa dos superfaturamentos e atrasos na execução das obras; em alguns casos, o atraso nos pagamentos estende-se a meses e até anos, como se pôde constatar nas inspeções realizadas;

7.10 - o sistema de contabilidade do Governo Federal não fornece as ferramentas necessárias ao planejamento, controle e avaliação. Observe-se que o sistema de contabilização das contas do Governo

⁹ Registre-se, a bem da verdade, que a criação da Secretaria Federal de Controle e a reestruturação do Sistema de Controle Interno pela Medida Provisória nº 480, de 27/04/94, representa um avanço em relação à situação vivida no Período Collor, quando o comando do Sistema constituiu-se em uma simples Coordenação do então Departamento do Tesouro Nacional

Federal, executado pelo Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, não oferece qualquer ajuda ao acompanhamento e controle das obras executadas com recursos da União, na medida em que não contém informações gerenciais, nem dispõe das informações físicas e de cumprimento de metas.

Basta dizer que, nos relatórios sobre a execução orçamentária e financeira da União mensalmente publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN em cumprimento ao disposto no § 9º, do art. 165, da Constituição Federal, não se consegue eliminar a dupla contagem resultante das chamadas "contribuições a fundos", executadas como transferências intragovernamentais. O próprio Orçamento Geral da União, da forma em que é elaborado, não oferece meios para ações de fiscalização, controle e avaliação;

7.11 - a existência de dotações globais, destinadas à concessão de transferências negociadas, também contribui para o funcionamento de "esquemas". Essas dotações, tanto na fase de preparação da proposta no Poder Executivo, como na sua apreciação pelo Poder Legislativo, ainda deixam margens à atuação de pessoas mais preocupadas em obter vantagens do que em realizar as obras realmente prioritárias para a população, dentro de padrões éticos.

A forma de transferência desses recursos a Estados e Municípios mediante convênios resultantes de negociações políticas acarreta maiores dificuldades de controle, dadas as diferenças administrativas e de forma de gestão de cada Prefeitura. Como essas diferenças não são consideradas pelas autoridades federais, o resultando é a imposição de normas gerais muito rígidas para a obtenção e aplicação dos recursos, com a penalização daquelas unidades que mantêm um real interesse em servir à sociedade.

8. RECOMENDAÇÕES

Diante das considerações anteriormente postas, das informações colhidas pela Comissão, das análises técnicas realizadas, das discussões levadas a efeito com autoridades de diversos locais do País e níveis de governo, responsáveis pela contratação de obras e serviços de engenharia, consideramos pertinente arrolar uma série de recomendações, de caráter **Administrativo** - no âmbito do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União - e **Normativo-Legal**, a cargo principalmente do Congresso Nacional.

8.1. No âmbito **Administrativo**, a Comissão recomenda:

8.1.1 - ao Poder Executivo:

a) **a instituição e manutenção de um Cadastro Geral de Obras Públicas** custeadas com recursos da União, para fins de acompanhamento e controle pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Controle Interno, inclusive como forma de subsidiar a elaboração do orçamento e acompanhar e fiscalização a sua execução, conforme, inclusive já foi solicitado pelo Tribunal de Contas da União, (Decisão Nº 227/95 - TCU 1ª Câmara, de 05/09/95, item 8.4);

b) **a reestruturação dos sistemas de Planejamento, Orçamento e Controle Interno** do Poder Executivo, com a segregação do Controle Interno das atividades de arrecadação da receita, de caixa do Tesouro Nacional e da escrituração da despesa e da prestação de contas, hoje sob a mesma autoridade;

c) **a reestruturação e simplificação do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI**, permitindo a sua integração com a elaboração da proposta do Orçamento Geral da União, para que possa ser utilizado como ferramenta de planejamento, controle e avaliação, pelo próprio Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e, inclusive, pelo cidadão.

d) **a revisão das formas de transferência de recursos para Estados e Municípios, com a eliminação das dotações globais**, executadas mediante convênios firmados pelos Ministérios com as Prefeituras Municipais. A distribuição dos recursos destinados a investimentos nos Municípios, especialmente para educação básica e saúde, deverá ser

feita com base em critérios técnicos, tais como população, área física abrangida, desnível regional, níveis de escolaridade, níveis dos serviços já atendidos.

e) **a renegociação dos contratos relativos às obras paralisadas**, de forma a eliminar dos preços parcelas decorrentes da expectativa inflacionária, muito comum em épocas passadas, mas inaceitável numa economia estabilizada como a atual. Nos casos mais complexos, onde constam irregularidades comprovadas, os contratos devem ser rescindidos, no interesse da Administração, realizando-se novo processo licitatório, precedido de avaliação técnica da obra.

8.1.2 - ao Poder Legislativo:

a) **a adoção de nova postura na apreciação da proposta orçamentária** e de solicitações de créditos adicionais, vedando-se a apresentação de emendas destinadas ao início de novas obras, enquanto não forem concluídas as obras inacabadas existentes no País;

b) **a revisão do processo de apreciação da proposta do orçamento geral da União**, com a *eliminação de emendas individuais*;

c) **a instituição de mecanismos de acompanhamento da execução do Orçamento Geral da União**, como forma de subsidiar a apreciação da proposta orçamentária, das solicitações de créditos adicionais e das ações de fiscalização e controle;

d) **ao Senado Federal, o fortalecimento da Comissão de Fiscalização e Controle**, mediante a criação de uma subcomissão específica para tratar das obras inacabadas, dotada da necessária estrutura técnico-administrativa, que lhe possibilite o pleno exercício de suas atribuições institucionais, notadamente no sentido de:

- complementar e aperfeiçoar o inventário das obras paralisadas, realizando gestões junto ao Poder Executivo para o estabelecimento do Cadastro Geral das Obras Públicas;

- instituir mecanismos de acompanhamento físico-financeiro das obras a cargo da União e a realização de inspeções e auditorias, na forma da Resolução do Senado Federal Nº 46/93, com o auxílio do Tribunal de Contas da União;

- atuar junto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com o propósito de definir anualmente as obras prioritárias em cada Unidade da Federação;

e) **adoção das providências legais e do amparo político para que o Poder Executivo encaminhe a solução das obras inacabadas**, que possam ser concedidas à exploração privada ou transferidas à órbita estadual ou municipal.

8.1.3 - ao Tribunal de Contas da União:

a) **realização imediata de auditorias nas obras paralisadas indicadas como prioritárias**, que ainda não tenham sido objeto de Inspeção por esse Órgão;

b) **a adoção de providências no sentido de acelerar a conclusão e julgamento das auditorias e inspeções** sobre obras públicas em andamento naquela Casa, em especial das indicadas como prioritárias;

c) **estabelecimento de um programa permanente de auditorias em obras e serviços de engenharia**, com a instituição de equipes ou Unidade Técnica especializada nessa área;

d) **estudar e propor meios legais e/ou administrativos destinados a tornar mais ágil e efetiva a aplicação de penalidades.**

8.2. No campo Normativo e Legal, a Comissão recomenda:

8.2.1 - a aprovação de legislação disciplinadora da alocação de recursos orçamentários para execução de obras e serviços de engenharia, baseada nos seguintes pontos:

a) não se iniciem novas obras no País enquanto não forem concluídas aquelas que estão inacabadas;

b) só seja autorizado o início de uma nova obra se apresentado: i) projeto básico, ii) orçamento detalhado e cronograma de execução, iii) benefícios previstos, e iv) viabilidade orçamentária até sua conclusão;

c) a obrigatoriedade da alocação dos recursos necessários à continuidade ou conclusão de todas as obras em andamento, em cada exercício, vedando-se a apresentação de emendas sobre os valores propostos;

d) conste da proposta orçamentária quadro demonstrativo das obras em andamento, que contenham informações, sobre o valor alocado para o exercício, o percentual e valor já executados até o exercício, a data provável de conclusão e o montante necessário nos exercícios seguintes;

e) estabeleça critérios de aprovação de emendas relativas a obras e serviços de engenharia, exclusivamente se originárias de bancadas estaduais ou regionais ou de Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;

f) institua sistemática de acompanhamento permanente da execução orçamentária e financeira da União;

8.2.2 - a aprovação da Lei Complementar sobre finanças públicas prevista no § 9º do art. 165 da Constituição Federal.

9. PROPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto, propomos a imediata adoção das seguintes providências:

a) que a Comissão Mista de Orçamento consigne, no Orçamento Geral da União para o exercício de 1996, os recursos necessários à conclusão das obras inacabadas consideradas prioritárias por esta Comissão, anteriormente descritas, após ouvidas as respectivas autoridades federais, estaduais, municipais e outras lideranças;

b) a renegociação, pela Administração Pública contratante, de todos os contratos celebrados anteriormente a julho de 1994, retirando-se as parcelas correspondentes à expectativa inflacionária neles contidas;

c) que o Congresso Nacional elimine as emendas individuais, passando, toda e qualquer alteração à proposta orçamentária da União, a ser objeto exclusivo de emendas coletivas de bancadas estaduais, regionais ou de Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;

d) a proibição do início de nova obra, ou o reinício de obra paralisada, sem que estejam assegurados os recursos orçamentários necessários à sua completa execução;

e) que o Tribunal de Contas da União, em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, acompanhe e fiscalize a aplicação dos recursos que forem liberados para o reinício dessas obras;

f) a imediata realização, pelo Tribunal de Contas da União, de auditorias nas obras indicadas como prioritárias que ainda não tenham recebido inspeção daquele Órgão, bem como a adoção de providências no sentido de acelerar a conclusão e o julgamento das auditorias e inspeções sobre obras, em tramitação;

g) a reestruturação dos Sistemas de Planejamento, Orçamento e Controle Interno do Poder Executivo, bem como o aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização e controle.

10. ENCAMINHAMENTO

Para fins de conhecimento e adoção dos procedimentos cabíveis na respectiva esfera de competência, recomendamos o encaminhamento do presente relatório às seguintes autoridades:

- a) ao Senhor Presidente da República;
- b) aos Ministros de Estado e autoridades equivalentes do Poder Executivo;
- c) aos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União;
- d) aos Presidentes dos Tribunais Superiores;
- e) aos Governadores de Estado e do Distrito Federal e respectivas Assembléias Legislativas;
- f) aos demais dirigentes de órgãos e entidades diretamente interessados nos assuntos aqui tratados.

É o relatório.

Brasília, de novembro de 1995

Senador Carlos Wilson
Presidente

Senador Edison Lobão
Vice-Presidente

Senador Casildo Maldaner
Relator

Senador Fernando Bezerra

Senador Flaviano Melo

Senador Gerson Camata

Senador Hugo Napoleão

Senador José Roberto Arruda

Senador Arlindo Porto

Senador Lúcio Alcântara

Senadora Emília Fernandes

Senador Waldeck Ornelas

Senador Joel de Hollanda

Senador Esperidião Amin

1. The first step in the process of the scientific method is to ask a question. This question should be based on observation and should be something that can be tested. For example, a scientist might observe that plants grow better in sunlight than in shade and ask the question, "Does sunlight affect plant growth?"

2. The second step is to form a hypothesis. A hypothesis is a statement that can be tested. It is often written in the form of an "if-then" statement. For example, a scientist might hypothesize, "If a plant receives more sunlight, then it will grow taller." The hypothesis should be based on the question and should be something that can be tested.

3. The third step is to design an experiment. The experiment should be designed to test the hypothesis. It should include a control group and an experimental group. The control group is the group that does not receive the treatment being tested. The experimental group is the group that does receive the treatment.

4. The fourth step is to collect data. Data is the information that is collected during the experiment. It can be in the form of numbers, words, or pictures. The data should be recorded carefully and accurately.

5. The fifth step is to analyze the data. This step involves looking at the data and trying to find patterns or trends. It may involve using statistical methods to analyze the data.

6. The sixth step is to draw a conclusion. A conclusion is a statement that summarizes the results of the experiment. It should be based on the data and should answer the original question.

7. The seventh step is to communicate the results. This step involves sharing the results of the experiment with others. It can be done through a presentation, a paper, or a report.

8. The eighth step is to repeat the experiment. This step is important because it helps to confirm the results of the experiment. If the results are the same when the experiment is repeated, then the hypothesis is more likely to be correct.

9. The ninth step is to apply the results. This step involves using the results of the experiment to solve a problem or to make a discovery. It is the final step in the scientific method.

10. The tenth step is to evaluate the process. This step involves looking at the entire process and trying to find ways to improve it. It is an important part of the scientific method because it helps to make the process more efficient and effective.

SENADO FEDERAL
COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

ANEXO A

Notas Explicativas

Na elaboração deste Inventário foram adotados os seguintes procedimentos:

1. Nos casos em que um determinado dado não foi fornecido pelo órgão, ou quando as informações recebidas não foram suficientes para o preenchimento do campo, o mesmo foi deixado em branco.
2. Nos casos em que foi informado pelo órgão apenas o ano do início ou da paralisação de uma determinada obra, consideramos o dia 1º de janeiro do ano informado como o dia do início da obra e o dia 31 de dezembro do ano informado como o dia da paralisação.

Nos casos em que foram informados pelo órgão apenas o mês e o ano do início ou da paralisação de uma determinada obra, consideramos o dia 1º, do mês e ano informados, como o dia do início da obra e o dia 31, do mês e ano informados, como o dia da paralisação.

4. Nos casos em que as informações foram fornecidas pelos Estados/Municípios, o campo "Código" foi preenchido com um número iniciado com o algarismo "1"; quando as informações foram fornecidas pelos Ministérios, o campo foi preenchido com um número iniciado com o algarismo "2".

5. No Inventário, os dados relativos a cada obra estão separados por um traço contínuo; quando as informações sobre uma determinada obra, fornecidas por Ministério e por Estado/Município indicaram tratar-se de uma mesma obra, o traço separador entre obras não foi impresso.

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AC

Município : CRUZEIRO DO SUL Código: 101005 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital de Cruzeiro do Sul com 150 leitos

Data de Início: 29/01/90 Data de Paralisação: 31/07/92 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PLACIDO DE CASTRO Código: 100536 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Execução de terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes, obras de arte especiais, obras complementares e manutenção de tráfego da rodovia AC-401, trecho rodovia BR-364 a rodovia AC-40, com extensão de 52 quilômetros.

Data de Início: 01/06/92 Data de Paralisação: 17/11/93 Percentual Concluído: 7

Valor para Conclusão: R\$18.629.666,00

Município : PORTO ACRE Código: 101006 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de poço para ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água de Porto Acre

Data de Início: 05/11/93 Data de Paralisação: 07/12/93 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PORTO WALTER Código: 200730 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : RIO BRANCO Código: 100392 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Urbanização e drenagem do Canal da Maternidade. Executado apenas os serviços preliminares.

Data de Início: 16/10/91 Data de Paralisação: 30/04/92 Percentual Concluído: 4,82

Valor para Conclusão:

Município : RIO BRANCO Código: 100393 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Pavimentação do Rodovia BR 317. Trecho Rio Branco-Xapuri (150Km). Foram executados os serviços de terraplanagem e alguns bueiros.

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AC

Município : RIO BRANCO Código: 100394 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ponte sobre o Rio Acre no Bairro Taquari/Floresta.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão:

Município : RIO BRANCO Código: 100395 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Estação de Tratamento de Águas - E.T.A. Executado parte dos reservatórios de Tratamento em concreto armado.
Data de Início: Data de Paralisação: 02/01/92 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:

Município : RIO BRANCO Código: 200143 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de 7.706,20 m da rodovia BR 364/AC, contorno de Rio Branco/AC e ponte sobre o Rio Acre com 200,00 m de extensão.
Data de Início: 19/01/93 Data de Paralisação: 14/02/93 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$10.200.000,00

Município : RIO BRANCO Código: 100530 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação e Pav., com revestimento asfáltico da BR-364, subtrecho Corrente - Estrada do Calafate, com uma extensão de 7.706,28 metros, e construção de uma ponte em concreto protendido sobre o Rio Acre com extensão de 200 metros.
Data de Início: 20/08/93 Data de Paralisação: 01/11/93 Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão: R\$9.679.920,00

Município : RIO BRANCO Código: 100531 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção e instalação de uma estação elevatória de esgoto bruto situado ao Conjunto Habitacional Mascarenhas de Moraes.
Data de Início: 24/05/88 Data de Paralisação: 15/03/91 Percentual Concluído: 21,52
Valor para Conclusão: R\$234.914,00

Município : RIO BRANCO Código: 100532 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Estação de tratamento de esgoto para atender aos Conjuntos Habitacionais: Adalberto Sena, Xavier Maia e Wanderley Dantas
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 30/08/91 Percentual Concluído: 29
Valor para Conclusão: R\$1.576.737,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AC

Município : RIO BRANCO

Código: 100533 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Estação elevatória de esgotos do Conjunto Habitacional Bela Vista

Data de Início: 02/01/88

Data de Paralisação: 31/01/91

Percentual Concluído: 92,93

Valor para Conclusão:

R\$10.731,00

Município : RIO BRANCO

Código: 100534 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Pavimentação do Conjunto Habitacional Bela Vista

Data de Início: 02/01/88

Data de Paralisação: 31/01/91

Percentual Concluído: 98,55

Valor para Conclusão:

R\$407.230,00

Município : RIO BRANCO

Código: 100535 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Drenagem do Conjunto Habitacional Bela Vista

Data de Início: 02/01/88

Data de Paralisação: 31/01/91

Percentual Concluído: 99,79

Valor para Conclusão:

Município : RIO BRANCO

Código: 101007 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação do sistema de abastecimento de água de sub-adutora do Bairro Boa União.

Data de Início: 05/11/93

Data de Paralisação: 07/12/93

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : RIO BRANCO

Código: 101008 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação de sub-adutora do calafate.

Data de Início: 05/11/93

Data de Paralisação: 05/01/94

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : RIO BRANCO

Código: 101009 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de 200 unidades habitacionais.

Data de Início: 04/11/92

Data de Paralisação: 30/06/94

Percentual Concluído: 47

Valor para Conclusão:

R\$106.829.188,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AC

Município : RIO BRANCO Código: 101013 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção e instalação de uma estação de esgoto junto situada no Conjunto Habitacional Manoel Julião.
Data de Início: 18/05/88 Data de Paralisação: 07/08/89 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$412.320,00

Município : RIO BRANCO Código: 101014 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção e instalação de uma estação elevatória de esgoto junto situada no Conjunto Habitacional Ruy Lino.
Data de Início: 07/08/90 Data de Paralisação: 30/10/91 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$410.150,00

Município : RIO BRANCO Código: 101015 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Pavimentação do Conjunto - Castelo Branco.
Data de Início: 01/01/88 Data de Paralisação: 31/01/91 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$2.318.500,00

Município : RIO BRANCO Código: 200062 Ministérios
Descrição da Obra: Reforma da Penitenciária de Rio Branco - AC (construção de ala de segurança máxima)
Data de Início: 03/02/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$3.500.000,00

Município : RIO BRANCO Código: 200731 Ministérios
Descrição da Obra: Centro de Saúde
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : RODRIGUES ALVES Código: 101010 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação, do sistema de abastecimento de água.
Data de Início: 05/11/93 Data de Paralisação: 24/01/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AC**Município : SENADOR GUIOMARD****Código: 101011** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Implantação e ampliação de abastecimento de água.**Data de Início:** 05/11/93 **Data de Paralisação:** 20/01/94**Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : TARAUAÇA****Código: 101012** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Hospital.**Data de Início:** 03/04/89 **Data de Paralisação:** 14/03/91**Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Unidade da Federação: AC****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :****R\$13.700.000,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios :****4****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:****R\$140.509.356,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :****22**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **AL**

Município : **ALAGOAS** Código: 100505 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação - AL-470 - Ent. AL-110 (Chã-Preta), divisa AL/PE
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$3.200.000,00

Município : **ALAGOAS** Código: 100506 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação - AL-205 - Ent. 440 - Ent. AL-110 (S. Mundaú)
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão: R\$9.125.491,00

Município : **ALAGOAS** Código: 200002 Ministérios
Descrição da Obra: Adutora Pão de Açúcar Olho d'água das Flores
Data de Início: 17/04/91 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão: R\$1.813.000,00

Município : **ALAGOAS** Código: 200390 Ministérios
Descrição da Obra: Restauração da Rodovia BR-423/AL. Trecho: Div. PE/AL - Div. AL/BA.
Data de Início: 28/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 99
Valor para Conclusão:

Município : **ARAPIRACA** Código: 200732 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Regional
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 3
Valor para Conclusão:

Município : **CACIMBINHAS** Código: 200040 Ministérios
Descrição da Obra: Construção da Barragem Bezerra, no Riacho do mesmo nome, da Bacia do rio Traipu.
Data de Início: 04/12/89 Data de Paralisação: 30/04/90 Percentual Concluído: 28
Valor para Conclusão: R\$1.100.000,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município :	CACIMBINHAS	Código:	100515	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Barragem de terra com capacidade de reservar 969 mil metros cúbicos. Possui uma bacia hidrográfica de 8,0 Km² e bacia hidráulica de 21,7 Ha			
Data de Início:	01/12/89	Data de Paralisação:	31/01/90	Percentual Concluído: 28
Valor para Conclusão:	R\$1.100.000,00			

Município :	CAMPO ALEGRE	Código:	100508	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Melhoria urbana				
Data de Início:	01/01/92	Data de Paralisação:	30/06/95	Percentual Concluído:	10
Valor para Conclusão:	R\$15.000.000,00				

Município :	CAMPO ALEGRE	Código:	100522	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de uma casa maternal, no povoado de Pau do Descanso (Luziápolis), projetada para atender as especialidades de clínica médica, ginecológica, partos normais.			
Data de Início:	06/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:			R\$50.000,00	

Município : CANAPI **Código:** 200041 **Ministérios**
Descrição da Obra: Construção da Barragem de Aneló, no Rio do mesmo nome, da bacia do rio Capiá.
Data de Início: 04/12/89 **Data de Paralisação:** 31/01/90 **Percentual Concluído:** 16
Valor para Conclusão: R\$2.400.000,00

Município :	CANAPI	Código:	100517	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Barragem de terra com capacidade de reservar 1,5 milhões de metros cúbicos de água. Possui uma bacia hidrográfica de 44,36 Km² e bacia hidráulica de 51,2 Ha.			
Data de Início:	01/12/89	Data de Paralisação:	31/01/90	Percentual Concluído: 16
Valor para Conclusão:	R\$2.400.000,00			

Município :	CRAIBAS	Código:	100523	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Pronto-socorro, com área aproximada de 440,00 m², projetada para atender as pequenas urgências.			
Data de Início:	18/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$124.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **AL**

Município : **DELMIRO GOUVEIA** Código: 200001 Ministérios
Descrição da Obra: Obras de implantação do projeto de Irrigação Aproveitamento hidroagrícola de Moxotó.
Data de Início: 06/07/92 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 22,5
Valor para Conclusão: R\$6.000.000,00

Município : **DELMIRO GOUVEIA** Código: 100519 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Irrigação, dentro de uma área bruta de 800 Ha, compreendendo 111 lotes, com área em torno de 7 Ha e implantação inicial de uma superfície agrícola útil de 480 Ha, pelo método de irrigação localizada.
Data de Início: 01/11/92 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 39
Valor para Conclusão: R\$8.000.000,00

Município : **ESTRELA DE ALAGOAS** Código: 100518 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem de alvenaria e pedra com capacidade para armazenar 100,6 mil metros cúbicos de água. Possui uma bacia hidrográfica de 10 Km² e uma bacia hidráulica de 2,93 Ha
Data de Início: 01/10/94 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 7
Valor para Conclusão: R\$297.900,00

Município : **FEIRA GRANDE** Código: 200733 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **JACARE DOS HOMENS** Código: 200734 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Maternidade
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **JUNQUEIRO** Código: 200388 Ministérios
Descrição da Obra: Restauração da Rodovia BR-101/AL . Trecho Div. AL/SE
Data de Início: 26/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$174.234,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AL

Município : JUNQUEIRO **Código:** 100504 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Restauração rodoviária na BR-101/AL. Trecho; Div. PE/AL - Div. AL/SE. Sub-
trecho Km 201,0 - Km 248,5
Data de Início: 29/12/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 80
Valor para Conclusão: R\$174.234,00

Município : MACEIO **Código:** 200389 **Ministérios**
Descrição da Obra: Restauração da Rodovia: BR-104/AL. Trecho divisa PE/AL - praça Centenário.
Melhoramento e duplicação da rodovia BR-104/AL - Subtrecho: Aeroporto de
Maceio - Av. Fernandes Lima (Km 90,9 - km 109,0)
Data de Início: 14/05/92 **Data de Paralisação:** 29/12/92 **Percentual Concluído:** 0
Valor para Conclusão: R\$3.530.000,00

Município : MACEIO **Código:** 100498 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Melhoramento e duplicação da rodovia BR-104/AL. Trecho: Div. PE/AL. Sub-
trecho: Aeroporto - Av. Fernandes Lima (Km 90 - Km 109)
Data de Início: 14/05/92 **Data de Paralisação:** 29/12/92 **Percentual Concluído:** 20
Valor para Conclusão: R\$3.530.000,00

Município : MACEIO **Código:** 100507 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Implantação, pavimentação, drenagem e acorr Ent. BR-316/104 Usina Cachoeira/
Ent. AL - 101 - Saúde.
Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** 31/12/94 **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão: R\$4.314.452,00

Município : MACEIO **Código:** 200065 **Ministérios**
Descrição da Obra: Construção da Penitenciária Masculina de Alagoas - AL
Data de Início: 06/05/92 **Data de Paralisação:** 13/06/94 **Percentual Concluído:** 3,38
Valor para Conclusão: R\$11.768.541,00

Município : MACEIO **Código:** 100520 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Penitenciária Masculina de Alagoas.
Data de Início: 31/01/93 **Data de Paralisação:** 02/05/95 **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão: R\$8.950.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AL

Município : MACEIO

Código: 200736 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Geral

Data de Início: 01/01/88

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 33

Valor para Conclusão:

Município : MACEIO

Código: 100521 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital com 300 leitos, projetado para atender as especialidades de clínica médica e cirúrgica, ortopedia, ginecologia, obstetricia, pediatria e cardiologia, com área aproximada de 20.000,00 m².

Data de Início: 04/12/90

Data de Paralisação: 12/09/91

Percentual Concluído: 31,27

Valor para Conclusão:

R\$23.848.201,00

Município : MACEIO

Código: 200735 Ministérios

Descrição da Obra: Instituto Médico Legal

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

Município : MACEIO

Código: 100527 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Instituto Médico Legal de Maceió

Data de Início: 01/01/89

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído: 32,17

Valor para Conclusão:

Município : MACEIO

Código: 100529 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Macro Drenagem do Tabuleiro dos Martins

Data de Início: 01/01/89

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído: 9,8

Valor para Conclusão:

R\$6.872.540,00

Município : MACEIO

Código: 200386 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração da Rodovia: BR-104/AL. Trecho: Divisa PE/AL - Maceio Restauração de Rodovia

Data de Início: 23/07/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão: R\$432.785,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **AL**

Município : MACEIO **Código:** 200387 **Ministérios**
Descrição da Obra: Restauração da Rodovia: BR-316/AL. Trecho: Divisa PE/AL - Maceio Restauração de Rodovia
Data de Início: 01/04/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 96
Valor para Conclusão: R\$123.710,00

Município : MARECHAL DEODORO **Código:** 100509 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Infra-estrutura urbana.
Data de Início: 01/05/93 **Data de Paralisação:** 30/05/95 **Percentual Concluído:** 15
Valor para Conclusão: R\$12.000.000,00

Município : MARECHAL DEODORO **Código:** 200449 **Ministérios**
Descrição da Obra: Unidades de 2º Grau , com percentual executado acima de 50%, e recursos orçamentários da SEMTEC
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão:

Município : MATRIZ DE CAMARAGIBE **Código:** 200738 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Geral
Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 2,5
Valor para Conclusão:

Município : MATRIZ DE CAMARAGIBE **Código:** 100525 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Hospital com 100 leitos, projetado para atender as especialidades básicas de: clínica médica e cirúrgica, ortopedia, ginecologia, obstetrícia e pediatria, com área aproximada de 7.500,00 m².
Data de Início: 01/02/91 **Data de Paralisação:** 31/07/91 **Percentual Concluído:** 2,01
Valor para Conclusão: R\$11.600.000,00

Município : MATRIZ DE CAMARAGIBE **Código:** 200737 **Ministérios**
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 70
Valor para Conclusão: R\$40.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AL

Município : OURO BRANCO

Código: 200042 Ministérios

Descrição da Obra: Construção da Barragem Capiazinho, no Rio do mesmo nome, da bacia do rio Capiá.

Data de Início: 27/11/89 Data de Paralisação: 31/01/90 Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão: R\$2.750.000,00

Município : OURO BRANCO

Código: 100516 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem de terra com capacidade de reservar 2,9 milhões de metros cúbicos de água. Possui uma bacia hidrográfica de 30,0 Km² e bacia hidráulica de 57,7 Ha.

Data de Início: 01/12/89 Data de Paralisação: 31/01/90 Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão: R\$2.075.000,00

Município : PALMEIRA DOS INDIOS

Código: 100512 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Infra-estrutura urbana e de saneamento básico.

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 25

Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município : PALMEIRA DOS INDIOS

Código: 100513 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Programa de integração rural na mata alagoana

Data de Início: 01/01/92 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 55

Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : PENEDO

Código: 200043 Ministérios

Descrição da Obra: Execução das obras civis do Projeto de Irrigação e Drenagem da Várzea de Marituba.

Data de Início: 02/01/92 Data de Paralisação: 30/11/93 Percentual Concluído: 33

Valor para Conclusão: R\$41.945.000,00

Município : PENEDO

Código: 100514 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação das obras de infra-estrutura de irrigação e drenagem em uma área bruta irrigável de 3.570 Ha.

Data de Início: 02/05/92 Data de Paralisação: 30/11/93 Percentual Concluído: 33

Valor para Conclusão: R\$41.945.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AL

Município : PIACABUCU Código: 100118 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Centro de Convivência ao Idoso.
Data de Início: 05/06/89 Data de Paralisação: 30/01/90 Percentual Concluído: 13,75
Valor para Conclusão: R\$113.750,00

Município : PILAR Código: 100499 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Restauração rodoviária da BR-316/AL. Trecho: Div. PE/AL. Sub-trecho: Entr. PR 424 AL - Entr. PR 104/AL
Data de Início: 01/04/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 96,29
Valor para Conclusão: R\$123.710,00

Município : PILAR Código: 100524 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Centro de saúde com área de 347,00 m² para atender as especialidades de clínica médica, pediatria, gabinete odontológico, controle de vacinas e laboratório.
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 42,56
Valor para Conclusão: R\$82.790,00

Município : PORTO CALVO Código: 100511 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Saneamento e infra-estrutura urbana
Data de Início: 01/04/93 Data de Paralisação: 30/09/93 Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão: R\$11.000.000,00

Município : SAO BRAS Código: 100322 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de um Cais de Proteção em alvenaria de pedra argamassada com 450 m de extensão iniciado com recursos liberados através da Portaria 1024 de 28/10/93 do Ministério da Integração Regional.
Data de Início: 01/10/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$500.000,00

Município : SAO BRAS Código: 100323 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Conclusão do Hospital de São Braz. Iniciado com recursos do Ministério da Saúde através da Portaria 39/93 de 21/12/93. Capacidade para 50 leitos. Atenderá uma região com aproximadamente 120.000 hab.
Data de Início: 01/12/93 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$1.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AL

Município : SAO BRAS

Código: 200740 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SAO JOSE DA TAPERA

Código: 200741 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 45

Valor para Conclusão: R\$2.955.713,00

Município : SAO JOSE DA TAPERA

Código: 100003 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação no Município de uma unidade mista de saúde, com 50 leitos, em terreno com 7.000m² de área, sendo área construída de 2.750m² assim dividida: Clínica Médica; Gineco-Obstetricia; Pediatria; Clínica Cirurgica; atendimento Odontológico; atendimento

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação: 30/12/92

Percentual Concluído: 32,56

Valor para Conclusão:

R\$3.843.279,00

Município : SAO MIGUEL DOS CAMPOS

Código: 200742 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Geral

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 3,3

Valor para Conclusão:

Município : SAO MIGUEL DOS MILAGRES

Código: 100683 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de abastecimento de água de S. M. Milagres - Toque - Porto da Rua (sistema coletivo)

Data de Início: 01/06/94

Data de Paralisação: 30/06/95

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

R\$300.000,00

Município : SANTANA DO IPANEMA

Código: 100500 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação e pavimentação na rodovia BR-316/AL. trecho: Santana do Ipanema/AL. Sub-trecho: Entr. PR-423/AL

Data de Início: 20/01/93

Data de Paralisação: 01/09/93

Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

R\$3.500.000,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município :	SANTANA DO IPANEMA	Código:	100526	Estados / Municípios:
Descrição da Obra:	Hospital com capacidade para 150 leitos, projetado para atender as especialidades básicas de: clínica médica e cirúrgica, ortopedia, ginecologia, obstetrícia e pediatria, com área aproximada de 9.700,00 m².			
Data de Início:	20/02/91	Data de Paralisação:	31/08/92	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$14.900.000,00			

Município :	SANTANA DO IPANEMA	Código:	200385	Ministérios
Descrição da Obra:	Restauração da Rodovia: BR-316/AL Trecho: Santana do Ipanema Restauração de Rodovia			
Data de Início:	19/01/93	Data de Paralisação:	01/09/93	Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão:	R\$3.500.000,00			

Município : SANTANA DO IPANEMA **Código:** 200739 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Geral
Data de Início: 01/01/88 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 14
Valor para Conclusão:

Município : UNIAO DOS PALMARES **Código:** 200743 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Geral
Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 8
Valor para Conclusão:

Município :	UNIAO DOS PALMARES	Código:	100211	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção do Hospital Geral			
Data de Início:	01/08/90	Data de Paralisação:	28/02/91	Percentual Concluído: 4
Valor para Conclusão:	R\$7.900.000,00			

Município :	UNIAO DOS PALMARES	Código:	200384	Ministérios
Descrição da Obra:	Restauração da Rodovia BR-104/AL. Trecho: Div. PE/AL - União dos Palmares/ AL. Restauração de Rodovia			
Data de Início:	31/12/89	Data de Paralisação:	01/11/93	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$3.500.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AL**Município : UNIAO DOS PALMARES** **Código: 100501** **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Melhoramento e restauração na rodovia BR-104/AL. Trecho: Div. PE/AL - União dos Palmares. Sub-trecho: Km 0,0 - Km 35,3.**Data de Início:** 17/01/90 **Data de Paralisação:** 01/11/93 **Percentual Concluído:** 76**Valor para Conclusão:** R\$3.500.000,00**Município : UNIAO DOS PALMARES** **Código: 100502** **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Restauração rodoviária na BR-104/AL. Trecho: Div. PE/AL. Sub-trecho: Seg. Km 35,3 - 74,0 - Ext. 38,7 Km.**Data de Início:** 05/08/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 85**Valor para Conclusão:** R\$432.785,00**Município : UNIAO DOS PALMARES** **Código: 100510** **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Recuperação de aglomerados sub-normais.**Data de Início:** 01/01/94 **Data de Paralisação:** 31/12/94 **Percentual Concluído:** 30**Valor para Conclusão:** R\$800.000,00**Unidade da Federação: AL****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :** **R\$82.032.983,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios :** **27****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:** **R\$206.103.132,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :** **36**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: AM****Município : AUTAZES****Código: 200744** Ministérios**Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/91**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:** R\$10.000,00**Município : BARCELOS****Código: 200745** Ministérios**Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** 01/01/91**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 30**Valor para Conclusão:****Município : BARCELOS****Código: 100458** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Ampliação da unidade hospitalar de Barcelos**Data de Início:** 01/01/90**Data de Paralisação:** 31/12/92**Percentual Concluído:** 20**Valor para Conclusão:** R\$200.000,00**Município : BOA VISTA DO RAMOS****Código: 100405** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Construção de 01 Ginásio de Esportes Polivalente coberto, com uma quadra poliesportiva, vestiários, banheiros, 10 salas sob as arquibancadas.**Data de Início:** 03/03/94**Data de Paralisação:** 25/04/94**Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:** R\$600.167,00**Município : HUMAITA****Código: 200392** Ministérios**Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras.**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:****Município : ITACOATIARA****Código: 200746** Ministérios**Descrição da Obra:** Hospital Maternidade**Data de Início:** 01/01/91**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AM

Município : JAPURA

Código: 200747 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : JUTAI

Código: 200748 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

Município : LABREA

Código: 200394 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : LABREA

Código: 200749 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : MANACAPURU

Código: 100324 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Cais de Saneamento.

Data de Início: 04/10/93

Data de Paralisação: 28/02/94

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

R\$250.000,00

Município : MANAUS

Código: 200072 Ministérios

Descrição da Obra: Penitenciária Central do Amazonas

Data de Início: 30/09/87

Data de Paralisação: 27/07/93

Percentual Concluído: 41,5

Valor para Conclusão: R\$3.780.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AM

Município :	MANAUS	Código:	101016	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Penitenciária Anísio Jobim.			
Data de Início:	22/02/88	Data de Paralisação:	18/02/94	Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:	R\$4.100.000,00			

Município :	MANAUS	Código:	101017	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Forum de Justiça - Varas Cíveis e Criminais.			
Data de Início:	08/09/75	Data de Paralisação:	31/12/76	Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão:	R\$16.500.000,00			

Município :	MANAUS	Código:	101019	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR-174 entre Manaus e a divisa com Roraima.			
Data de Início:	23/07/95	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 12
Valor para Conclusão:	R\$42.771.480,00			

Município :	MANAUS	Código:	200112	Ministérios
Descrição da Obra:	Otimizar a comunicação entre os Campi do INDA com suas Reservas de Pesquisas que funcionam como Campi Avançado			
Data de Início:	27/12/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 75
Valor para Conclusão:	R\$77.779,00			

Município :	MANAUS	Código:	200113	Ministérios
Descrição da Obra:	Substituição da rede elétrica aérea de alta e baixa tensão, hoje sujeitas às intempéries atmosféricas e sobrecarregadas ocasionando frequentes interrupções no abastecimento de energia nos CAMPI do INPA.			
Data de Início:	25/03/94	Data de Paralisação:	31/01/95	Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão:	R\$133.910,00			

Município :	MANAUS	Código:	101018	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Geral Dona Francisca Mendes			
Data de Início:	30/12/87	Data de Paralisação:	01/10/92	Percentual Concluído: 75
Valor para Conclusão:	R\$4.500.000,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AM

Município : NOVO ARIPUANA

Código: 200393 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : PAUINI

Código: 200750 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Maternidade

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

Município : PAUINI

Código: 100316 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Obra em alvenaria com 735,00 m² de área construída destinada a Hospital Maternidade com 12 leitos.

Data de Início: 01/04/94

Data de Paralisação: 30/07/94

Percentual Concluído: 35

Valor para Conclusão:

R\$320.000,00

Município : SAO GABRIEL DA CACHOEIR

Código: 200462 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : TAPAUA

Código: 200751 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL
COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS
INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

14-nov-95

Unidade da Federação: AM

Unidade da Federação: AM

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :

R\$4.001.689,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios :

15

Total dos recursos para conclusão, informado pelos
Estados/Municípios:

R\$69.241.647,00

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :

8

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AP

Município : LARANJAL DO JARI

Código: 200752 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Geral

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 65

Valor para Conclusão:

Município : LARANJAL DO JARI

Código: 100341 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de um Hospital em Laranjal do Jari

Data de Início: 07/11/91

Data de Paralisação: 30/06/94

Percentual Concluído: 65

Valor para Conclusão:

R\$1.813.118,00

Município : MACAPA

Código: 100338 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Drenagem e Pavimentação da Baixada do Adonias.

Data de Início: 10/06/94

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 30,81

Valor para Conclusão:

R\$472.758,00

Município : MACAPA

Código: 100339 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Revestimento do Canal do Beírol, urbanização e pavimentação das vias laterais.

Data de Início: 14/10/92

Data de Paralisação: 31/10/94

Percentual Concluído: 13,82

Valor para Conclusão:

R\$21.479.197,00

Município : MACAPA

Código: 100340 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Reforma e adaptação da Penitenciária Agrícola do Amapá

Data de Início: 27/10/93

Data de Paralisação: 30/06/94

Percentual Concluído: 2,15

Valor para Conclusão:

R\$9.496.651,00

Município : MACAPA

Código: 200753 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital de Base

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 6

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: AP

Unidade da Federação: AP

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :

Total de Obras, informado pelos Ministérios : **2**

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios: **R\$33.261.724,00**

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios : **4**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : BAHIA

Código: 100381 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação Km 69 - Km 79 Linha Norte - RFFSA

Data de Início: 01/02/90

Data de Paralisação: 31/03/91

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

R\$5.000.000,00

Município : BAHIA

Código: 100945 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação / pavimentação da BR-135, trecho Monte Alegre - Divisa BA/PI com 73 Km de extensão.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$4.800.000,00

Município : BAHIA

Código: 100957 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação / pavimentação da BR-418, trecho Divisa MG/BA - Entr. BR-101, com 33 Km de extensão.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$3.600.000,00

Município : BAHIA

Código: 200686 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-242/BA - Trecho - km 496,5 - km 590,9 - Extensão 94,4 km

Data de Início: 14/09/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$2.741.816,00

Município : BAHIA

Código: 200687 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-242/BA - Trecho - km 392,5 - km 496,5 - Extensão 104 km

Data de Início: 29/04/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 65

Valor para Conclusão: R\$1.310.000,00

Município : BAHIA

Código: 200688 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-242/BA - Trecho - km 253,1 - km 319,5 Extensão 66,4 km

Data de Início: 03/05/93

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído: 74,8

Valor para Conclusão: R\$2.510.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : BAHIA

Código: 200689 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-242/BA - Trecho - km 203,5 - km 253,1 extensão 91 km

Data de Início: 03/05/93

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído: 97

Valor para Conclusão: R\$250.000,00

Município : BAHIA

Código: 200690 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-242/BA - Trecho - km 319,5 - km 392,5 Extensão 73 km

Data de Início: 03/05/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 62

Valor para Conclusão: R\$830.000,00

Município : BAHIA

Código: 200691 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Melhoramentos e Restauração na Rodovia BR-101/BA - Trecho - km 597 - km 663 Extensão 66 km

Data de Início: 29/12/89

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município : BAHIA

Código: 200692 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Melhoramentos e Restauração na Rodovia BR-101/BA - Trecho - km 767 - km 808 - Extensão 41 km

Data de Início: 29/12/89

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$2.460.000,00

Município : BAHIA

Código: 200693 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-324/BA - Trecho - km 0 - km 34 - Extensão 2 x 34 km

Data de Início: 27/12/89

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão: R\$2.040.000,00

Município : BAHIA

Código: 200697 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-242/BA - Trecho - Argoim - km 203,5 Extensão 91 km

Data de Início: 24/09/93

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído: 47,3

Valor para Conclusão: R\$1.125.705,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : BAHIA

Código: 200779 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BAHIA

Código: 200793 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ALAGOINHAS

Código: 100956 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação / pavimentação da BR-110, trecho Alagoinhas - Cícero Dantas com extensão de 197 Km.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$3.600.000,00

Município : ALCOBACA

Código: 100024 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Cais do porto.

Data de Início: 01/01/87

Data de Paralisação: 31/12/87

Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão:

Município : AMARGOSA

Código: 200754 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

Município : AMERICA DOURADA

Código: 200755 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : ANTONIO GONCALVES

Código: 200756 - Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ARATACA

Código: 200757 - Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : AURELINO LEAL

Código: 200758 - Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BANZAE

Código: 200759 - Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BARRA

Código: 100171 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Prédio destinado a armazéns e silos - Abandono total do Posto Experimental da
Monta e Posto Agro-Pecuário - Abandono total do antigo Hospital "Ana Mariani" -
Aeroporto desativado

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BARRA DO MENDES

Código: 200760 - Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS.

Unidade da Federação: BA

Município :	BARREIRAS	Código:	100267	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Canalização e urbanização do córrego do rego, constando de rede de canalização da antiga hidroelétrica, que corta o bairro de Barreirinhas e hoje está totalmente assoreado e as águas poluídas pelos dejetos. Extensão: 2700 m.			
Data de Início:	01/12/94	Data de Paralisação:	31/03/95	Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão:	R\$3.900.000,00			
Município :	BARREIRAS	Código:	100268	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Anel Rodoviário - Obra que liga a BR 242 à BR 135/020, desviando o tráfego pesado do centro da cidade. Extensão 6.400 m, com obras de artes especiais.			
Data de Início:	01/06/94	Data de Paralisação:	30/09/94	Percentual Concluído: 3
Valor para Conclusão:	R\$8.000.000,00			
Município:	BARREIRAS	Código:	100269	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ponte sobre o Rio Grande - Ponte em concreto armado que irá substituir a de madeira existente, que se encontra em estado de deteriorização comprometendo a segurança do usuário, além de dificultar o acesso ao centro da cidade.			
Data de Início:	01/07/94	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão:	R\$1.800.000,00			
Município :	BARREIRAS	Código:	100954	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Recuperação / pavimentação da BR-020 no trecho Divisa GO/BA - Barreiras com 302 Km de extensão.			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$19.000.000,00			
Município :	BARREIRAS	Código:	200472	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	20/07/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:				
Município :	BELO CAMPO	Código:	200761	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 33
Valor para Conclusão:				

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : BIRITINGA

Código: 200762 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BOM JESUS DA LAPA

Código: 200044 Ministérios

Descrição da Obra: Execução das obras civis de irrigação do Projeto Formoso "A".

Data de Início: 10/12/87

Data de Paralisação: 31/01/95

Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão: R\$18.000.000,00

Município : BONITO

Código: 200763 Ministérios

Descrição da Obra: Casa de Parto

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BRUMADO

Código: 200473 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 21/11/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : CAATIBA

Código: 200764 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CACHOEIRA

Código: 100382 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção da variante do Paraguaçu - RFFSA

Data de Início: 01/02/90

Data de Paralisação: 31/03/91

Percentual Concluído: 3

Valor para Conclusão:

R\$150.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : CACULE Código: 100385 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem do Truvisco
Data de Início: 02/01/91 Data de Paralisação: 31/12/91 Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão: R\$5.000.000,00

Município : CACULE Código: 100911 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Posto agropecuário, situado na periferia da cidade, com uma área de 175 ha, pertencente ao Ministério da Agricultura
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$800.000,00

Município : CAEM Código: 200765 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão:

Município : CAMACARI Código: 200474 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : CAMACARI Código: 200766 Ministérios
Descrição da Obra: Centro de Saúde
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : CAMACAN Código: 100374 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Restauração de 65,6 Km da BR 101, Entr. BA 270(B)/678 - Rio Jequitinhonha.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : CAMACAN

Código: 100960 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação / pavimentação da BR-101, trecho Camacã - Itapebi, com 81 Km de extensão.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$4.800.000,00

Município : CAMAMU

Código: 100270 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Infra-estrutura urbana

Data de Início: 24/08/93

Data de Paralisação: 02/01/95

Percentual Concluído: 77

Valor para Conclusão:

R\$151.346,00

Município : CAMAMU

Código: 100271 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de cais de proteção para redução de problemas causados por enchentes e alagamentos de áreas urbanas.

Data de Início: 24/08/93

Data de Paralisação: 23/02/95

Percentual Concluído: 39

Valor para Conclusão:

R\$746.313,00

Município : CAMAMU

Código: 200767 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Código: 200046 Ministérios

Descrição da Obra: Execução das Obras da Barragem Brasileiro

Data de Início: 11/08/89

Data de Paralisação: 30/06/91

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão: R\$300.000,00

Município : CANDEIAS

Código: 200141 Ministérios

Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA VARIANTE COM 76 KM DE EXTENSÃO ENTRE AS CIDADES DE CANDEIAS E SALVADOR PINTO VISANDO ELIMINAR AS RESTRIÇÕES AO TRAFEGO EXISTENTES NO TRECHO

Data de Início: 02/02/90

Data de Paralisação: 30/03/91

Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão: R\$150.200.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : CAPELA DO ALTO ALEGRE

Código: 200768 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão:

Município : CAPELA DO ALTO ALEGRE

Código: 200769 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CAPIM GROSSO

Código: 200770 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CARAVELAS

Código: 200771 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CARDEAL DA SILVA

Código: 100396 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de um Matadouro Público.

Data de Início: 18/10/91

Data de Paralisação: 18/12/91

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

R\$50.000,00

Município : CASA NOVA

Código: 200045 Ministérios

Descrição da Obra: Construção de uma barragem de retenção no Lago de Sobradinho.

Data de Início: 11/08/89

Data de Paralisação: 30/06/91

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão: R\$170.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : CHORROCHO

Código: 100389 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Projetos de Piscigranjas vinculadas ao Projeto de reassentamento do Lago de Itaparica

Data de Início: 02/01/90

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CICERO DANTAS

Código: 200772 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CONCEICAO DO COITE

Código: 200395 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : CONCEICAO DO COITE

Código: 200475 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/06/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 49

Valor para Conclusão:

Município : CONTENDAS DO SINCORA

Código: 100454 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Matadouro

Data de Início: 01/06/92

Data de Paralisação: 31/01/93

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

R\$200.000,00

Município : CORACAO DE MARIA

Código: 200773 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **BA****Município : CORDEIROS****Código: 200774** - Ministérios**Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/91**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : CRAVOLANDIA****Código: 200775** - Ministérios**Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/90**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : DOM MACEDO COSTA****Código: 100274** - Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Sistema de esgotamento sanitário**Data de Início:** 22/10/93**Data de Paralisação:** 05/06/95**Percentual Concluído:** 59**Valor para Conclusão:**

R\$202.705,00

Município : ENTRE RIOS**Código: 200396** - Ministérios**Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras.**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:****Município : ESPLANADA****Código: 100375** - Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Restauração de 35,5 Km da BR 101 - Div. SE/BA - Entr. BA 233 (Esplanada).**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

R\$1.000.000,00

Município : ESPLANADA**Código: 100958** - Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Recuperação / pavimentação da BR/101, trecho Esplanada - Entre Rios com 26 Km de extensão.**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

R\$1.500.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA**Município : EUCLIDES DA CUNHA****Código: 100944** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Implantação / pavimentação da BR-116, trecho Euclides da Cunha - Entr. BR-235 com 62 Km de extensão**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

R\$6.200.000,00

Município : EUNAPOLIS**Código: 200451** Ministérios**Descrição da Obra:** Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 50****Valor para Conclusão:****Município : EUNAPOLIS****Código: 200776** Ministérios**Descrição da Obra:** Hemocentro**Data de Início: 01/01/94****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : FEIRA DE SANTANA****Código: 200476** Ministérios**Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início: 22/04/94****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 98****Valor para Conclusão:****Município : FILADELFIA****Código: 200777** Ministérios**Descrição da Obra:** Unidade de Saúde**Data de Início: 01/01/91****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : FLORESTA AZUL****Código: 200778** Ministérios**Descrição da Obra:** Hospital Regional**Data de Início: 01/01/91****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 60****Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : GOVERNADOR MANGABEIRA

Código: 200780 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : GUANAMBI

Código: 200464 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : GUANAMBI

Código: 200701 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Complementação da Rodovia BR-122/BA - Subtrecho - Guanambi - Urandi - Extensão 72 km

Data de Início: 07/10/93

Data de Paralisação: 30/12/93

Percentual Concluído: 64

Valor para Conclusão: R\$7.700.000,00

Município : IBOTIRAMA

Código: 100384 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem Itapeba

Data de Início: 01/01/87

Data de Paralisação: 31/12/91

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

R\$250.000,00

Município : IBOTIRAMA

Código: 100951 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação / pavimentação da BR-242, no trecho Argoim - Ibotirama - Barreiras com 685 Km de extensão.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$16.700.000,00

Município : IGUAI

Código: 200781 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : ILHEUS

Código: 200477 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/04/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 48

Valor para Conclusão:

Município : IRARA

Código: 100273 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Infra-estrutura urbana

Data de Início: 04/08/93

Data de Paralisação: 30/11/93

Percentual Concluído: 23

Valor para Conclusão:

R\$772.274,00

Município : IRARA

Código: 200782 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ITABELA

Código: 100172 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 02/01/93

Data de Paralisação: 30/09/93

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

R\$1.256.780,00

Município : ITABERABA

Código: 100272 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de acesso à Itaberaba - BR.242

Data de Início: 03/11/93

Data de Paralisação: 08/04/94

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

R\$8.853.592,00

Município : ITABUNA

Código: 200785 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município :	ITABUNA	Código:	100910	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Regional de Itabuna			
Data de Início:	01/12/89	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$7.200.000,00			

Município :	ITABUNA	Código:	100959	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Recuperação / pavimentação da BR-101, trecho Itabuna - Camacã, com 77 Km de extensão.			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$2.000.000,00			

Município :	ITABUNA	Código:	200478	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	22/04/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 27
Valor para Conclusão:				

Município :	ITABUNA	Código:	200783	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$190.000,00			

Município :	ITABUNA	Código:	200784	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital de Base			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município :	ITAMARAJU	Código:	100376	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Restauração de 40,8 Km da BR 101 - Rio Caraiva/Entr. BR 489 (Itamaraju)			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$2.820.000,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : ITAMARI

Código: 200786 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ITAPE

Código: 200787 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ITAPETINGA

Código: 200479 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/04/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 45

Valor para Conclusão:

Município : ITAPITANGA

Código: 200788 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ITAQUARA

Código: 100325 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município. Foram instalados a tubulação (malha de distribuição). Não foram iniciados, a adutora nem o reservatório.

Data de Início: 02/01/92

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído: 35

Valor para Conclusão:

R\$2.000.000,00

Município : ITARANTIM

Código: 200789 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : ITIUBA

Código: 200790 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : JAGUAQUARA

Código: 200791 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : JANDAIRA

Código: 200792 Ministérios

Descrição da Obra: Casa de Parto

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : JEQUIE

Código: 200696 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-330/BA - Trecho - Jequié Ubata -
Extensão 85,5 km

Data de Início: 28/03/93

Data de Paralisação: 30/04/95

Percentual Concluído: 57

Valor para Conclusão: R\$5.515.000,00

Município : JEQUIE

Código: 100378 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Restauração de 85,5 Km da BR 330 - Jequié/Ubata

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 42,7

Valor para Conclusão:

R\$5.400.000,00

Município : JEQUIE

Código: 100952 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação / pavimentação da BR-330 no trecho Jequié - Ipiacó com 53 Km de
extensão.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$2.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : JEQUIE

Código: 200480 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 23/06/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 49

Valor para Conclusão:

Município : JEREMOABO

Código: 100369 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de 14,0 Km da BR 110 Jeremoabo/Entr. BA 220 (Cícero Dantas)

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : JOAO DOURADO

Código: 200047 Ministérios

Descrição da Obra: Construção da Barragem da Mata do Milho, no Riacho do mesmo nome.

Data de Início: 10/10/89

Data de Paralisação: 30/06/93

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$110.000,00

Município : JOAO DOURADO

Código: 100386 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem Mata do Milho

Data de Início: 01/01/87

Data de Paralisação: 31/12/91

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

R\$500.000,00

Município : JUAZEIRO

Código: 200127 Ministérios

Descrição da Obra: EXECUÇÃO DA 1ª FASE DO NOVO PORTO DE JUAZEIRO, LOCALIZADO À MARGEM DIREITA DO RIO SÃO FRANCISCO.

Data de Início: 02/02/90

Data de Paralisação: 04/03/94

Percentual Concluído: 1,35

Valor para Conclusão:

Município : JUAZEIRO

Código: 100380 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção e implantação do Porto Fluvial de Juazeiro no rio São Francisco

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão:

R\$45.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : JUAZEIRO

Código: 200695 - Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-407/BA - Trecho - Juazeiro - km 63,2

Data de Início: 08/11/93

Data de Paralisação: 30/12/93

Percentual Concluído: 1,5

Valor para Conclusão: R\$9.340.000,00

Município : JUAZEIRO

Código: 100383 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Restauração de 63,2 Km da BR 407 Juazeiro/Km 63,2

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1,7

Valor para Conclusão:

R\$1.995.000,00

Município : JUAZEIRO

Código: 200048 - Ministérios

Descrição da Obra: Construção de sobrelevação de bordas de canais e de estruturas de controle nos canais do perímetro irrigado de Curacá.

Data de Início: 14/12/94

Data de Paralisação: 01/07/95

Percentual Concluído: 48

Valor para Conclusão: R\$444.166,00

Município : JUAZEIRO

Código: 200049 - Ministérios

Descrição da Obra: Construção de sobrelevação de bordas de canal nos canais do Perímetro Irrigado de Maniçoba.

Data de Início: 04/10/94

Data de Paralisação: 01/07/95

Percentual Concluído: 46

Valor para Conclusão: R\$246.073,00

Município : JUAZEIRO

Código: 200481 - Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/05/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 46

Valor para Conclusão:

Município : LAURO DE FREITAS

Código: 200482 - Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 13/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : LIVRAMENTO DO BRUMADO Código: 200018 Ministérios
Descrição da Obra: BARRAGEM RIACHO DO PAULO - Barragem de terra homogênea, com 28,00 de altura máxima, 1.895,00 m de extensão, e volume de 812.00 m³ de terra, capaz de acumular 53.000.000 m³ de água.

Data de Início: 17/10/91 Data de Paralisação: 30/03/93 Percentual Concluído: 38

Valor para Conclusão: R\$6.995.000,00

Município : LIVRAMENTO DO BRUMADO Código: 100084 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem do Rio do Paulo

Data de Início: 17/10/91 Data de Paralisação: 09/02/93 Percentual Concluído: 38

Valor para Conclusão: R\$7.000.000,00

Município : LIVRAMENTO DO BRUMADO Código: 200019 Ministérios

Descrição da Obra: PROJETO DE IRRIGAÇÃO BRUMADO - O projeto conta com uma área irrigada já concluída de 2.470 ha, restante ainda os Blocos I e II para serem concluídos com uma área de 2.639 ha.

Data de Início: 28/08/77 Data de Paralisação: 30/03/93 Percentual Concluído: 82

Valor para Conclusão: R\$7.103.000,00

Município : LIVRAMENTO DO BRUMADO Código: 100085 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Perímetro Irrigado do Brumado - Conclusão das Obras do Bloco II para irrigação de 1.853 Ha.

Data de Início: 14/06/84 Data de Paralisação: 09/02/93 Percentual Concluído: 82

Valor para Conclusão: R\$11.500.000,00

Município : LIVRAMENTO DO BRUMADO Código: 100086 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Escola de 5ª a 8ª séries com pré qualificação agrícola. O convênio nº 00001696/92 forneceu recursos para construção de 10 salas de aula/refeitório/cozinha, dormitório, biblioteca/laboratório, administração. Para atingir seus objetivos, torna-se necessário

Data de Início: 15/07/92 Data de Paralisação: 30/11/92 Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$700.000,00

Município : MACAUBAS Código: 100018 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de 100 casas populares na área urbana.

Data de Início: 01/02/91 Data de Paralisação: 30/12/91 Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$550.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : MAETINGA**Código:** 200794 Ministérios**Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/91**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município :** MARAU**Código:** 100313 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Assentamento da Santa Maria, Km 22,50 da Rodovia Maraú-Ubaitabá, com extensão com a BR 030, contém 58 famílias morando em estado precário. Tem uma escola que está sendo mantida pelo Município, um Posto de Saúde abandonado.**Data de Início:** 02/01/68**Data de Paralisação:** 31/12/92**Percentual Concluído:** 60**Valor para Conclusão:****Município :** MARAU**Código:** 100314 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** BR 047 hoje BR 030 obra introduzida na Plano de Viação Nacional com o nome de BR 047 permanecendo até 1964, hoje BR 030, com 1.038 Km de extensão. Rodovia que liga Brasília a Porto de Campinho em Maraú-BA, passa o oeste e centro-oeste. Cruza o Rio São Fra**Data de Início:** 02/01/51**Data de Paralisação:** 31/12/69**Percentual Concluído:** 30**Valor para Conclusão:****Município :** MARAU**Código:** 100315 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Porto de atracção para navios de altos calados, com objetivo de reforçar o complexo portuário de exportação da Bahia, formado por Salvador, Aratu e Ilhéus, para escoar produção de grãos de soja, café e o grande volume de minério do oeste e centro-oeste.**Data de Início:** 02/01/51**Data de Paralisação:** 31/12/69**Percentual Concluído:** 55**Valor para Conclusão:****Município :** MILAGRES**Código:** 200699 Ministérios**Descrição da Obra:** Execução de Obras de Restauração na BR-116/BA - Trecho - Rio Paraguaçu - Milagres, Extensão 52 km**Data de Início:** 03/05/93**Data de Paralisação:** 30/06/94**Percentual Concluído:** 90,4**Valor para Conclusão:** R\$810.000,00**Município :** MILAGRES**Código:** 100377 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Restauração de 52,0 Km da Br 116 - Entr. BR 242/BA/Argoim - Milagres.**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 90,4**Valor para Conclusão:**

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : MILAGRES

Código: 200698 **Ministérios**

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-116/BA - Trecho - Milagres - Rio Jaquiriça. Extensão 62 km

Data de Início: 05/05/93 **Data de Paralisação:** 31/03/95 **Percentual Concluído:** 91,1

Valor para Conclusão: R\$850.000,00

Município : MIRANTE

Código: 100212 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Construção de uma creche em fase inicial, tendo até o momento construído paredes em blocos cerâmicos com aproximadamente 1,00 metro de altura.

Data de Início: 25/07/90 **Data de Paralisação:** 30/08/90 **Percentual Concluído:** 10

Valor para Conclusão: R\$60.000,00

Município : MORPARA

Código: 200795 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : MORRO DO CHAPEU

Código: 100390 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Área com 10,740 ha desapropriada pelo Governo Federal em 03/04/87, e até hoje abandonada. Nunhuma família foi assentada e a área é considerada imprestável. Valor da desapropriação Cr\$ 440.404,25.

Data de Início: 03/04/87 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : MUCURI

Código: 200796 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : MUNIZ FERREIRA

Código: 200797 **Ministérios**

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : NAZARE

Código: 200798 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : NILO PECANHA

Código: 200799 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Maternidade

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : NOVA REDENCAO

Código: 200800 Ministérios

Descrição da Obra: Casa de Parto

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : NOVA SOURE

Código: 200801 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : OLINDINA

Código: 200802 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Código: 100173 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sede do Município de Oliveira dos Brejinhos e o Pov. de Riacho Frio na extensão de 10,5 Km, e rede de distribuição rural com extensão de 2,5 Km, na tensão de 34,5 Kv. Sistema aéreo, tipo radial, tensão nominal de 380/220 V, constando de 01 (um) alimentado

Data de Início: 29/01/93

Data de Paralisação: 19/03/93

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$82.650,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : OLIVEIRA DOS BREJINHOS Código: 100278 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação do sistema de abastecimento de água.
Data de Início: 20/07/93 Data de Paralisação: 22/11/93 Percentual Concluído: 22
Valor para Conclusão: R\$2.395.945,00

Município : PALMEIRAS Código: 100317 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Escola, com 02 salas de aula no Povoado Carmona.
Data de Início: 12/11/91 Data de Paralisação: 31/01/92 Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão: R\$32.488,00

Município : PALMEIRAS Código: 100318 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Escola com 02 salas de aula no Povoado de Campo de São João.
Data de Início: 12/11/91 Data de Paralisação: 31/01/92 Percentual Concluído: 45
Valor para Conclusão: R\$30.588,00

Município : PALMEIRAS Código: 200803 Ministérios
Descrição da Obra: Centro de Saúde
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PARAMIRIM Código: 200050 Ministérios
Descrição da Obra: Construção da Barragem de Zabumbão, no Rio Paramirim.
Data de Início: 28/12/88 Data de Paralisação: 31/01/95 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$15.000.000,00

Município : PARAMIRIM Código: 100387 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem do Zabumbão
Data de Início: 02/01/89 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$10.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : PEDRAO

Código: 200804 Ministérios

Descrição da Obra: Casa de Parto

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PINDAI

Código: 100946 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação / pavimentação da BR-122, trecho Pindaí - Urandi, com 24 Km de extensão.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$2.400.000,00

Município : PIRITIBA

Código: 100459 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Centro educacional com 8 salas de aula, secretaria e auditório.

Data de Início: 01/03/90

Data de Paralisação: 30/06/91

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

R\$250.000,00

Município : PLANALTINO

Código: 200805 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : POCOES

Código: 100961 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação / pavimentação da BR-116, trecho Poções - Jequié, com 88 Km de extensão.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$6.500.000,00

Município : PORTO SEGURO

Código: 200806 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : QUEIMADAS

Código: 200807 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : RAFAEL JAMBEIRO

Código: 200808 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : RIACHAO DAS NEVES

Código: 200809 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : RODELAS

Código: 100388 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Pequenos projetos de irrigação para reassentamento do Lago de Itaparica: Projeto Rodelas, Projeto Jusante de Paulo Afonso, Projeto Curaça e Projeto Abaré.

Data de Início: 02/01/80

Data de Paralisação: 31/12/90

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SAO FELIPE

Código: 200815 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SAO FELIX

Código: 100022 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Desvio das linhas férreas para retirar do centro da cidade a Rede Federal S/A(Leste Brasileira)

Data de Início: 30/12/90

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : SALVADOR

Código: 200126 Ministérios

Descrição da Obra: Reforço da estrutura do cais de 10 metros do Porto de Salvador visando a instalação de um portêiner.

Data de Início: 31/12/93 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$424.407,00

Município : SALVADOR

Código: 100370 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Reforço do Cais de 40,00 m

Data de Início: 01/12/93 Data de Paralisação: 31/05/95 Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$900.000,00

Município : SALVADOR

Código: 100371 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Restauração de 34,0.Km da BR 324 Salvador/Cova de Defunto

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$5.933.000,00

Município : SALVADOR

Código: 200125 Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação do cais do Porto de Salvador consistindo em alargamento e recuperação de um trecho de 60 m de cais.

Data de Início: 30/09/94 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão: R\$1.288.094,00

Município : SALVADOR

Código: 100372 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação e alargamento do cais de 60,0 m Armazem nº 5.

Data de Início: 01/09/94 Data de Paralisação: 31/03/95 Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão: R\$1.000.000,00

Município : SALVADOR

Código: 101052 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Infra-estrutura urbana do bairro de Nova Brasília - urbanização, drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação, contenções em alvenaria

Data de Início: 01/10/88 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 23

Valor para Conclusão: R\$1.147.788,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : SALVADOR Código: 101053 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Infra-estrutura e drenagem no bairro de Sussuarana - urbanização, drenagem, esgotamento sanitário, construção de escadarias para acesso e pavimentação
Data de Início: 19/10/92 Data de Paralisação: 31/10/93 Percentual Concluído: 16
Valor para Conclusão: R\$571.106,00

Município : SALVADOR Código: 101054 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canais - Itaigara e Estrada da Rainha - drenagem e pavimentação
Data de Início: 28/11/88 Data de Paralisação: 31/01/94 Percentual Concluído: 14
Valor para Conclusão: R\$3.864.000,00

Município : SALVADOR Código: 101055 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Transporte moderno de Salvador (etapa I) - construção de via exclusiva para o transporte público, compreendendo moco drenagem e pavimentação
Data de Início: 14/07/87 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$157.330.724,00

Município : SALVADOR Código: 101056 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Obras especiais e complementares das vias Saboeiro e Jaguaribe - galerias, canais, drenagem, terraplenagem e pavimentação.
Data de Início: 14/01/91 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 3
Valor para Conclusão: R\$35.195.843,00

Município : SALVADOR Código: 101057 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Infra-estrutura urbana do bairro de São Caetano - urbanização, drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação asfáltica e contenções em alvenaria
Data de Início: 29/10/92 Data de Paralisação: 30/09/93 Percentual Concluído: 14
Valor para Conclusão: R\$45.489,00

Município : SANTA INES Código: 200463 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : SANTANA **Código:** 100174 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Ampliação do Hospital Municipal Dr. Francisco Flores.
Data de Início: 01/04/94 **Data de Paralisação:** 30/09/94 **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão: R\$120.000,00

Município : SANTANA **Código:** 100175 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Construção de olaria comunitária, para produção tijolos e telhas cerâmicas.

Data de Início: 01/04/94 **Data de Paralisação:** 30/08/94 **Percentual Concluído:** 70

Valor para Conclusão: R\$40.000,00

Município :	SANTANA	Código:	100176	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção barragem do Riacho da Ema			
Data de Início:	04/11/91	Data de Paralisação:	30/04/94	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$1.160.000,00			

Município :	SANTANA	Código:	200810	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município : SANTO AMARO **Código:** 200811 **Ministérios**
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1
Valor para Conclusão:

Município : SANTO ANTONIO DE JESUS **Código:** 100275 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de abastecimento de água.

Data de Início: 26/08/93 **Data de Paralisação:** 18/04/95 **Percentual Concluído:** 9

Valor para Conclusão: R\$19.970.488,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : SANTO ANTONIO DE JESUS Código: 100276 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Infra-estrutura urbana em áreas degradadas
Data de Início: 17/08/92 Data de Paralisação: 02/05/95 Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão: R\$1.262.623,00

Município : SANTO ANTONIO DE JESUS Código: 100310 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização do riacho Andaiá.
Data de Início: 01/09/92 Data de Paralisação: 31/03/94 Percentual Concluído: 5,14
Valor para Conclusão: R\$4.058.634,00

Município : SANTO ANTONIO DE JESUS Código: 200813 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Regional
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$900.000,00

Município : SANTO ANTONIO DE JESUS Código: 100311 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus.
Data de Início: 01/09/92 Data de Paralisação: 30/09/94 Percentual Concluído: 7,47
Valor para Conclusão: R\$15.957.704,00

Município : SANTO ANTONIO DE JESUS Código: 100312 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Esgotamento Sanitário da Rua Wellington Figueredo e adjacências
Data de Início: 02/05/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 41,08
Valor para Conclusão: R\$549.390,00

Município : SANTO ANTONIO DE JESUS Código: 200812 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : SANTO ESTEVAO.

Código: 200814 **Ministérios**

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 30

Valor para Conclusão:

Município : SAUDE

Código: 200816 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

Município : SENHOR DO BONFIM

Código: 200694 **Ministérios**

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração na Rodovia BR-407/BA - Trecho - km 63,2 - Sr. do Bonfim

Data de Início: 08/11/93

Data de Paralisação: 30/12/93

Percentual Concluido: 1,5

Valor para Conclusão: R\$9.740.000,00

Município : SENHOR DO BONFIM

Código: 100379 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Restauração de 65,9 Km da BR 407 - Km 63,2 - Senhor do Bomfim

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido: 1,4

Valor para Conclusão:

R\$2.503.000,00

Município : SENHOR DO BONFIM

Código: 100955 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Recuperação / pavimentação da BR-407, trecho Senhor do Bonfim - Juazeiro com extensão de 197 Km.

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

R\$8.000.000,00

Município : SENHOR DO BONFIM

Código: 200465 **Ministérios**

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido: 50

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : SENTO SE

Código: 100391 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Área com 25.379 ha, desapropriada pelo Governo Federal em 19/05/88, capacidade para assentamento de 812 famílias e assentadas até hoje somente 55 famílias. Valor da desapropriação Cr\$ 538.040,00

Data de Início: 19/05/88

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SENTO SE

Código: 200051 Ministérios

Descrição da Obra: Execução das obras do Projeto de Irrigação Tombador de Cima.

Data de Início: 01/02/91

Data de Paralisação: 30/06/92

Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão: R\$30.000,00

Município : SERRA PRETA

Código: 200817 Ministérios.

Descrição da Obra: Unidade de Saúde'

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SITIO DO MATO

Código: 200818 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SOBRADINHO

Código: 100023 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Canal adutor da Serra da Batateira com 13.500m de extensão que possibilitará, por gravidade, a irrigação de 20.000 ha de terra à jusante da Barragem de Sobradinho, promovendo a criação de 10.000 empregos diretos.

Data de Início: 10/10/93

Data de Paralisação: 30/04/94

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

R\$5.500.000,00

Município : SOUTO SOARES

Código: 200819 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : TEIXEIRA DE FREITAS

Código: 200820 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

Município : TEIXEIRA DE FREITAS

Código: 100397 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Hospital Regional de Teixeira de Freitas, localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, s/n.

Data de Início: 02/01/91

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

R\$100.000,00

Município : UAUÁ

Código: 200821 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : UBAIRA

Código: 200822 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : UBAIRA

Código: 200823 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

Município : UBATA

Código: 100953 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Recuperação / pavimentação da BR-330 no trecho Ubatã - Ibirapitanga com 13 Km de extensão.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$1.200.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : UNA Código: 200824 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Maternidade
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : URUCUCA Código: 200825 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão:

Município : VALENCA Código: 100277 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Infra-estrutura urbana/cais/dragagem e desassoriamento do rio Una. Execução de obras em áreas degradadas.
Data de Início: 30/08/93 Data de Paralisação: 07/01/94 Percentual Concluído: 6
Valor para Conclusão: R\$10.664.190,00

Município : VALENCA Código: 100909 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ponte sobre o Rio Una na área urbana da cidade de Valença
Data de Início: 01/09/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 7,37
Valor para Conclusão: R\$2.478.124,00

Município : VALENCA Código: 200452 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : VALENCA Código: 200826 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: BA

Município : VALENTE

Código: 200827 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : VEREDA

Código: 200700 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Obras de Melhoramentos e Restauração na Rodovia BR-116/BA -
Trecho - Veredinha - Divisa BA/MG Extensão 56 km

Data de Início: 02/06/88

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$2.520.000,00

Município : VITORIA DA CONQUISTA

Código: 100373 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Restauração de 56,0 Km da BR 116, Km 912,9 (Veredinha) Div. BA/MG.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$5.880.000,00

Município : VITORIA DA CONQUISTA

Código: 200450 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos
orçamentários da SEMTEC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : VITORIA DA CONQUISTA

Código: 200483 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/04/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 87

Valor para Conclusão:

Município : WENCESLAU GUIMARAES

Código: 200828 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: BA**

Unidade da Federação: BA**Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios : R\$252.643.261,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios : 125****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios: R\$646.031.784,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios : 85**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município :	CEARÁ	Código:	100925	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Açudes de Barragem de Terra Batida e Barragem de Alvenaria			
Data de Início:		Data de Paralisação:	31/03/94	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$2.049.500,00			

Município :	CEARÁ	Código:	201186	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade Mista			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	ACARAU	Código:	100177	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hotel Turístico Municipal de Acaraú			
Data de Início:	01/03/92	Data de Paralisação:	30/08/94	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$432.000,00			

Município :	ACARAU	Código:	200399	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município :	ALTO SANTO	Código:	200015	Ministérios
Descrição da Obra:	BARRAGEM CASTANHÃO - Barragem de terra homogênea, com 60,00 m de altura máxima, 3.500,00 m de extensão, com volume de 7.728.800 m³ de terra, capaz de acumular 6.761.000.000 m³ de água.			
Data de Início:	05/12/91	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$62.952.893,00			

Município :	ALTO SANTO	Código:	100922	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Açude público Castanhão			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$62.952.893,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : ARACATI Código: 200154 Ministérios

Descrição da Obra: Sinalização horizontal e vertical na Rodovia BR-304.

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$87.637,00

Município : ARACATI Código: 100942 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sinalização horizontal e vertical da Rodovia BR-304

Data de Início: Data de Paralisação: 31/01/95 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$87.637,00

Município : ASSARE Código: 200014 Ministérios

Descrição da Obra: BARRAGEM SÃO MIGUEL (CANOAS) - Barragem em concreto compactado a rolo, submersível, com 50 m de altura máxima, 100m de extensão, volume de 86.590,00 m³ de concreto, capaz de acumular 69.300.000 m³ de água. 1

Data de Início: 10/08/93 Data de Paralisação: 28/02/95 Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão: R\$1.380.000,00

Município : ASSARE Código: 100918 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem Canoas

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : AURORA Código: 200829 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 74

Valor para Conclusão: R\$180.000,00

Município : BANABUIU Código: 100002 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Restauração BR 122 trecho Quixadá/Jaquaretama Subtrecho: Juatama/Banabuiú

Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: 30/11/92 Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município :	BANABUIU	Código:	100932	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de trecho BR 122 Juaiamia - Banabuiú			
Data de Início:	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:	R\$3.405.217,00			

Município :	BANABUIU	Código:	200149	Ministérios
Descrição da Obra:	Melhoramentos da terraplenagem e pavimentação da BR-122, subtrecho Banabuiú - Quixadá.			
Data de Início:	29/12/89	Data de Paralisação:	31/12/93	Percentual Concluído: 86
Valor para Conclusão:	R\$800.000,00			

Município :	BANABUIU	Código:	100938	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Melhoramento da terraplanagem e pavimentação da BR 122, sub-trecho Banabuiú-Quixadá			
Data de Início:		Data de Paralisação:	30/12/93	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$800.000,00			

Município :	BOA VIAGEM	Código:	200400	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convenios com as prefeiturase			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município :	BOA VIAGEM	Código:	200830	Ministérios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde			
Data de Início:	01/01/92	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	BREJO SANTO	Código:	200831	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município :	CANINDE	Código:	100936	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Levantamento Aerofotogrametrico			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$5.045.811,00			

Município :	CARIRE	Código:	100935	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção do trecho BR 402 Cariré - Ipu			
Data de Início:	Data de Paralisação:	30/08/94 Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$5.850.426,00			

Município :	CARIRE	Código:	200832	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	CEDRO	Código:	200453	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 50		
Valor para Conclusão:				

Município :	CRATEUS	Código:	100931	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de trecho BR 226 - Crateús - Independência			
Data de Início:	Data de Paralisação:	30/11/94 Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$11.575.746,00			

Município :	CRATEUS	Código:	200484	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	17/09/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 89	
Valor para Conclusão:				

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : CRATEUS **Código:** 200685 **Ministérios**

Descrição da Obra: Transnordestina 2ª etapa: construção de 179 km de linha férrea entre Crateús e Piquet Carneiro, recuperação/modernização dos trechos Juazeiro - Senhor do Bonfim e Teresina - Crateús. Reconstrução do trecho Senhor do Bonfim - Icó.

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Município : CRATO Código: 100090 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Saneamento básico - Abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede do município do Crato.

Data de Início: 01/09/92 **Data de Paralisação:** 31/01/94 **Percentual Concluído:** 5

Valor para Conclusão: R\$35.000.000,00

Município : CRATO Código: 100091 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Drenagem de águas pluviais - Implantação de drenagem de 05 bacias na sede do município.

Data de Início: 01/08/88 **Data de Paralisação:** 28/02/94 **Percentual Concluído:** 20

Valor para Conclusão: R\$25.000.000,00

Município : CRATO Código: 200485 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/10/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 94

Valor para Conclusão:

Município: CRATO Código: 200833 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : FORTALEZA Código: 200148 Ministérios

Descrição da Obra: Correção de pontos críticos do km 0 ao km 5 da BR-222/CE.

Data de Início: 14/09/95 **Data de Paralisação:** 30/12/94 **Percentual Concluído:** 90

Valor para Conclusão: R\$380.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : FORTALEZA Código: 100937 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Correção de Pontos críticos do Km 0 ao km 5, da BR 222/CE

Data de Início: Data de Paralisação: 30/12/94 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$380.000,00

Município : FORTALEZA Código: 200151 Ministérios

Descrição da Obra: Conservação de rodovia: lama asfáltica na BR-116/C.

Data de Início: 22/12/94 Data de Paralisação: 28/02/95 Percentual Concluído: 35

Valor para Conclusão: R\$75.000,00

Município : FORTALEZA Código: 100940 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Conservação de Rodovia (lama asfáltica) BR-116

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$75.000,00

Município : FORTALEZA Código: 200152 Ministérios

Descrição da Obra: Sinalização horizontal e vertical nas Rodovias BR-116/CE, BR-020/CE e BR-222/CE.

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$109.650,00

Município : FORTALEZA Código: 100941 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sinalização horizontal e vertical na Rodovia BR-116, BR-020, e BR-222

Data de Início: Data de Paralisação: 30/01/95 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$109.650,00

Município : FORTALEZA Código: 200486 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 23/06/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 27

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : FORTALEZA

Código: 200683 Ministérios

Descrição da Obra: Ponte sobre o Rio Mangueira Pinho

Data de Início: 27/09/91

Data de Paralisação: 09/03/92

Percentual Concluído: 17

Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município : FORTALEZA

Código: 200834 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : FORTALEZA

Código: 200835 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Distrital

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : GRANJA

Código: 200052 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Paula Pessoa. Barragem de terra zoneada, com 32,30m de altura máxima, 1.110,00 m de extensão, com volume de 1.121.699m³ de terra, capaz de acumular 194.700.000 m³ de água.

Data de Início: 31/03/92

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído: 0,36

Valor para Conclusão: R\$25.247.907,00

Município : GRANJA

Código: 100923 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Açude público Paula Pessoa

Data de Início:

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$25.247.907,00

Município : GRANJA

Código: 100933 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do trecho BR 402 Granja - Camocim

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$5.202.604,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : GUARACIABA DO NORTE

Código: 200836 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

Município : ICAPUI

Código: 200837 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

Município : ICO

Código: 100912 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de unidade mista com capacidade de 30 leitos.

Data de Início:

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$600.000,00

Município : IGUATU

Código: 200016 Ministérios

Descrição da Obra: BARRAGEM TRUSSU - Barragem de terra homogênea, com 36,30m de altura máxima, 1.200,251 m³ de terra capaz de acumular 263.000.000 m³ de água.

Data de Início: 10/03/90

Data de Paralisação: 01/12/93

Percentual Concluído: 63,45

Valor para Conclusão: R\$6.000.000,00

Município : IGUATU

Código: 100924 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem do Rio Trussu

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : IGUATU

Código: 200487 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 14/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : IGUATU

Código: 200838 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : IPAUMIRIM

Código: 100287 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de um Hospital. Prédio concluído, faltando para o funcionamento: casa de força, lavanderia, apartamentos e necrotérios.

Data de Início: 01/09/94

Data de Paralisação: 30/04/95

Percentual Concluído: 95

Valor para Conclusão:

R\$85.000,00

Município : IPAUMIRIM

Código: 200839 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : IPAUMIRIM

Código: 200840 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : IPU

Código: 100927 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Unidades Mistas com capacidade de 30 leitos

Data de Início:

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$800.000,00

Município : ITAPIOCA

Código: 200841 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : JUAZEIRO DO NORTE Código: 200069 Ministérios
Descrição da Obra: Construção da Penitenciária do Cariri - CE
Data de Início: 04/11/91 Data de Paralisação: 01/03/94 Percentual Concluído: 15,38
Valor para Conclusão: R\$8.298.246,00

Município : JUAZEIRO DO NORTE Código: 100934 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Penitenciária
Data de Início: Data de Paralisação: 31/03/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$5.887.879,00

Município : JUAZEIRO DO NORTE Código: 101020 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Parque ecológico do timbaúba.
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : JUAZEIRO DO NORTE Código: 200454 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : JUAZEIRO DO NORTE Código: 200488 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 25/08/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 95
Valor para Conclusão:

Município : LIMOEIRO DO NORTE Código: 100913 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação de unidades mistas de 30 para 40 leitos
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$50.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : LIMOEIRO DO NORTE Código: 200003 Ministérios

Descrição da Obra: Obra de implantação do Projeto de Irrigação Jaguaribe Apodi.

Data de Início: 19/05/87 Data de Paralisação: 31/12/91 Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão: R\$10.000.000,00

Município : LIMOEIRO DO NORTE Código: 100914 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Distrito de irrigação Jaguaribe-Apodi. Área beneficiada: 5.054 ha

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : LIMOEIRO DO NORTE Código: 200842 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : MARACANAÚ Código: 200843 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : MARANGUAPE Código: 200489 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/10/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : MARCO Código: 200021 Ministérios

Descrição da Obra: PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXO ACARAÚ - Implatação de uma área irrigável de 8.438 ha, diividida em dua etapas de 4.000 ha e 4.438 ha.

Data de Início: Data de Paralisação: 28/02/94 Percentual Concluído: 6

Valor para Conclusão: R\$41.599.708,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : MARCO Código: 100178 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Irrigação do Baixo Acaraú, aproximadamente 12.000 Ha.

Data de Início: 01/05/93 Data de Paralisação: 30/03/94 Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

Município : MARCO Código: 200153 Ministérios

Descrição da Obra: Construção da Rodovia BR-402/CE, trecho Granja-Entr. BR-403/CE.

Data de Início: 03/11/87 Data de Paralisação: 30/10/91 Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão: R\$11.000.000,00

Município : MARCO Código: 100930 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do trecho - BR 402 Marco Granja

Data de Início: Data de Paralisação: 30/05/95 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$10.884.991,00

Município : MARCO Código: 100943 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção da rodovia BR-407/CE, trecho Granja - Entroncamento BR-403/CE

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$11.000,00

Município : MOMBACA Código: 200053 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Serafim Dias. Baragem de terra homogênea , com 26,00 m de altura máxima, 726,00 m de extensão, com volume de 467,000 m³ de terra, capaz de acumular 43,000,000 m³ de água.

Data de Início: 30/12/89 Data de Paralisação: 29/03/95 Percentual Concluído: 79,5

Valor para Conclusão: R\$768.000,00

Município : MOMBACA Código: 100921 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem Serafim Dias

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$768.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município :	MORADA NOVA	Código:	100928	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação de um Centro de Saúde			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:			R\$20.000,00	

Município :	MORADA NOVA	Código:	200020	Ministérios
Descrição da Obra:	PROJETO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE RUSSAS - Implantação de área irrigável de 10.666 ha sendo 5.716 p/ colonização e 4.950 ha p/ Empresas, com um total de 1.009 beneficiários.			
Data de Início:		Data de Paralisação:	30/01/94	Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão:	R\$78.611.800,00			

Município :	MORADA NOVA	Código:	200844	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município :	NOVO ORIENTE	Código:	100398	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Unidade Mista de Saúde com 24 leitos. Construído a 1ª etapa sendo 1º Pavilhão. Faltando dois pavilhões. Já existe projeto na FNS para conclusão do mesmo.			
Data de Início:	03/03/93	Data de Paralisação:	31/08/93	Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:	R\$122.121,00			

Município :	PALHANO	Código:	100929	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação de um Centro de Saúde			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$15.000,00			

Município :	PARAIPABA	Código:	200054	Ministérios
Descrição da Obra:	Projeto de irrigação de Curu-Paraipaba. Implantação da 3ª Etapa, num total de 4.720 ha, sendo 3.902 ha referentes a área Sul e 814 ha do setor "J", que serão operados por 152 colonos, 34 técnicos agrícolas, 25 agrônomos e 41 empresas.			
Data de Início:		Data de Paralisação:	01/03/93	Percentual Concluído: 53
Valor para Conclusão:	R\$31.472.444,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : PARAIPABA **Código:** 100917 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Projeto de irrigação Caruparaipaba - 3ª etapa - área beneficiada: 4.721 ha**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : QUIXERAMOBIM **Código:** 200013 **Ministérios****Descrição da Obra:** Barragem Fogareiro de terra homogênea, com 29,80 m de altura máxima, 860,00 m de extensão, com volume de 1,425,950 m³ de terra, capaz de acumular 118,000,000 m³ de água.**Data de Início:** 22/05/92 **Data de Paralisação:** 25/04/95 **Percentual Concluído:** 43**Valor para Conclusão:** R\$6.000.000,00

Município : QUIXERAMOBIM **Código:** 100919 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Barragem Fogareiro**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : QUIXERAMOBIM **Código:** 200397 **Ministérios****Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:**

Município : REDENCAO **Código:** 200845 **Ministérios****Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : REDENCAO **Código:** 200846 **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : RUSSAS **Código:** 100926 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Projeto de irrigação do Tabuleiro de Russas - área beneficiada 10.666 ha

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município :	RUSSAS	Código:	200490	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	17/09/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 97	
Valor para Conclusão:				

Município : SAO BENEDITO **Código:** 200083 **Ministérios**
Descrição da Obra: Construção Posto de Benefícios com 366,90 m²
Data de Início: 15/06/88 **Data de Paralisação:** 04/09/89 **Percentual Concluído:** 67
Valor para Conclusão: R\$60.000,00

Município :	TAUA	Código:	200398	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 50		
Valor para Conclusão:				

Município : TIANGUA **Código:** 200150 **Ministérios**
Descrição da Obra: Recuperação (recapeamento) na Rodovia BR-222/CE.
Data de Início: 31/12/94 **Data de Paralisação:** 28/02/95 **Percentual Concluído:** 6
Valor para Conclusão: R\$587.345,00

Município :	TIANGUA	Código:	100939	Estados / Municípios
Descrição da Obra: Recuperação (recapeamento) da Rodovia BR-222/CE				
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$587.345,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Município : UMIRIM

Código: 200401 **Ministérios**

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido: 50

Valor para Conclusão:

Município : VARJOTA

Código: 200022 **Ministérios**

Descrição da Obra: PROJETO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE - CE - O projeto contempla 08 setores que estão sendo implantados em duas etapas: a 1ª etapa com 1.606 ha (setores 1 a 4) em fase final de implantação. a 2ª etapa com 1.415 ha (setores 5 a 8), cujas obras de distribuição já

Data de Início: 28/01/87

Data de Paralisação: 28/02/94

Percentual Concluido: 92

Valor para Conclusão: R\$1.200.000,00

Município : VARJOTA

Código: 100916 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Projeto de irrigação Araras-Norte.Área beneficiada: 3.225,06 ha

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

Município : VARZEA ALEGRE

Código: 200017 **Ministérios**

Descrição da Obra: BARRAGEM OLHO D'ÁGUA - barragem de terra homogênea, com 26,00 m de altura máxima, 381,00 m de extensão, cpaz de acumular 21.300.000.m³ de água.

Data de Início: 20/10/93

Data de Paralisação: 28/02/95

Percentual Concluido: 11

Valor para Conclusão: R\$4.427.828,00

Município : VARZEA ALEGRE

Código: 100920 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Barragem Olho D'agua

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: CE

Unidade da Federação: CE

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :	R\$292.738.458,00
--	-------------------

Total de Obras, informado pelos Ministérios :	56
---	----

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:	R\$205.045.727,00
--	-------------------

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :	39
--	----

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: DF

Município : DISTRITO FEDERAL Código: 201188 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional do Paranoá - construção

Data de Início: 08/07/91 Data de Paralisação: 26/01/94 Percentual Concluído: 16

Valor para Conclusão: R\$15.456.000,00

Município : DISTRITO FEDERAL Código: 100950 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Regional do Paranoá para 150 leitos com estrutura parcialmente concluída

Data de Início: 12/07/91 Data de Paralisação: 26/01/94 Percentual Concluído: 16

Valor para Conclusão: R\$15.456.000,00

Município : DISTRITO FEDERAL Código: 201189 Ministérios

Descrição da Obra: Implantar a rede metroviária no Distrito Federal, interligando as cidades satélites de Ceilândia, Samambaia, Taguatinga e Guará ao Plano Piloto de Brasília.

Data de Início: 16/09/91 Data de Paralisação: 31/10/94 Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$97.900.000,00

Município : DISTRITO FEDERAL Código: 201190 Ministérios

Descrição da Obra: Construção do Centro de Ensino com 15 salas de aula na CL 213 lote G - Santa Maria/DF

Data de Início: 30/12/94 Data de Paralisação: 19/07/95 Percentual Concluído: 73

Valor para Conclusão: R\$180.000,00

Município : BRASILIA Código: 100949 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação do sistema de transporte de massa no Distrito Federal, interligando Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras e Guará ao Plano Piloto.

Data de Início: 02/01/92 Data de Paralisação: 30/10/94 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$362.846.000,00

Município : BRASILIA Código: 100948 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Centro de Ensino com 15 salas de aula na CL 213 - Lote G - Santa Maria/DF.

Data de Início: 30/12/94 Data de Paralisação: 19/07/95 Percentual Concluído: 73

Valor para Conclusão: R\$180.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: DF

Município :	BRASILIA	Código:	200064	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção do Setor C do Centro de Internamento e Reeducação do DF			
Data de Início:	24/10/91	Data de Paralisação:	30/06/93	Percentual Concluído: 3
Valor para Conclusão:	R\$58.142.560,00			

Município :	BRASILIA	Código:	200073	Ministérios
Descrição da Obra:	AMPLIAÇÃO DE 6,300 m² E REFORMA GLOBAL DAS INSTALAÇÕES DAS SR/DPF/DF			
Data de Início:	27/11/87	Data de Paralisação:	31/03/94	Percentual Concluído: 89
Valor para Conclusão:	R\$970.000,00			

Município :	BRASILIA	Código:	200295	Ministérios
Descrição da Obra:	Serviços de Conservação Rodoviária na BR 040/GO - 251 DF/GO - Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/BA - Extensão: 213,0 Km			
Data de Início:	11/02/92	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 83,16
Valor para Conclusão:	R\$413.823,00			

Município :	BRASILIA	Código:	200296	Ministérios
Descrição da Obra:	Serviços de Conservação Rodoviária na BR 020/040/060/070/DF - Trecho: Div. DF/GO - Extensão: 143,0 Km			
Data de Início:	19/10/92	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 36,57
Valor para Conclusão:	R\$1.549.193,00			

Município :	BRASILIA	Código:	200847	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Regional de Samambaia			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	BRASILIA	Código:	200849	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital J.K. (MEDICOR)			
Data de Início:	01/01/92	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **DF**Município : **BRASILIA**

Código: 201191 Ministérios

Descrição da Obra: Construção do Centro de Ensino com 14 salas na QE 38 - lote D - Guará II/DF

Data de Início: 01/02/95

Data de Paralisação: 14/06/95

Percentual Concluído: 13

Valor para Conclusão: R\$473.145,00

Município : **BRASILIA**

Código: 100947 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Centro de Ensino com 14 salas na QE 38 - lote D - Guará II / DF

Data de Início: 28/03/95

Data de Paralisação: 14/06/95

Percentual Concluído: 13

Valor para Conclusão:

R\$473.145,00

Unidade da Federação: **DF**

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :

R\$175.084.721,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios :

10

Total dos recursos para conclusão, informado pelos
Estados/Municípios:

R\$378.955.145,00

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :

4

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Município :	ESPÍRITO SANTO	Código:	200339	Ministérios
Descrição da Obra:	Execução de Obras de Rest. Rod. BR-101/ES - Div. BA/ES-Div. ES/RJ km 0,0 ao km 78,0			
Data de Início:	22/11/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 22,8
Valor para Conclusão:	R\$6.370.000,00			

Município :	AGUIA BRANCA	Código:	100020	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Reforma e ampliação da unidade sanitária 3			
Data de Início:	10/01/94	Data de Paralisação:	20/04/94	Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:	R\$200.000,00			

Município :	AGUIA BRANCA	Código:	200850	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Código:	100592	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção da 3ª etapa - Estação Ferroviária, desvio, pátio de manobras e obras complementares			
Data de Início:		Data de Paralisação:	28/06/91	Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:	R\$3.470.000,00			

Município :	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Código:	200063	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção do Estabelecimento Polivalente de Cachoeiro do Itapemirim-ES			
Data de Início:	14/06/89	Data de Paralisação:	08/02/93	Percentual Concluído: 95
Valor para Conclusão:	R\$1.573.476,00			

Município :	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Código:	200491	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	17/09/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 99
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Município :	CARIACICA	Código:	200337	Ministérios
Descrição da Obra:	Obras de duplicação da Rod. BR-262/ES, trecho: Vitória-Div. ES/MG, subtrecho: Alto Lage (km 3,4)-CEASA-Entr. BR-101 (km 7,3) (saída sul de Vitória), ext. 3,9 km			
Data de Início:	26/05/92	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 15,6
Valor para Conclusão:	R\$7.005.127,00			

Município :	CARIACICA	Código:	100555	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Obras de duplicação da BR-262/ES - Trecho Vitória - Div. ES/MG, sub-trecho: Alto Lage (km 3,4) - CEASA - Entre BR-101 (km 7,3).			
Data de Início:	05/06/92	Data de Paralisação:	30/04/95	Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:	R\$14.000.000,00			

Município :	CARIACICA	Código:	200851	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão:				

Município :	COLATINA	Código:	200338	Ministérios
Descrição da Obra:	Convênio de Delegação de Encargos entre o DNER e o DER/ES, que tem p/objeto a exec. pelo DER/ES de uma ponte sobre Rio Doce de 673,70m na BR-259/ES			
Data de Início:	22/10/86	Data de Paralisação:	30/05/89	Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:	R\$15.288.721,00			

Município :	COLATINA	Código:	100428	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	2ª Ponte de Colatina.			
Data de Início:	13/10/86	Data de Paralisação:	01/06/89	Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:	R\$10.000.000,00			

Município :	COLATINA	Código:	100429	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Variante - Trecho Resplendor/Colatina - Rodovia BR 259 ES/MG - Lote 3 - Travessa Rio Doce - Colatina.			
Data de Início:	01/08/82	Data de Paralisação:	30/06/92	Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:	R\$6.000.000,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Município : COLATINA

Código: 100554 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Execução dos serviços de complementação, implantação e pavimentação, trecho Resplendor - Colatina - Sub-Trecho Div. MG/ES - Travessa do Rio Doce - KM 83,6 a KM 117,6.

Data de Início: 02/05/89 **Data de Paralisação:** 06/11/93 **Percentual Concluído:** 91,49

Valor para Conclusão: R\$2.800.000,00

Município : COLATINA

Código: 200492 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 17/09/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 99

Valor para Conclusão:

Município : CONCEICAO DA BARRA

Código: 200852 **Ministérios**

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : DOMINGOS MARTINS

Código: 100179 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Sistema de esgotamento sanitário da cidade de Domingos Martins - Sede, compreendendo: 10.487 metros de redes coletoras, 720 ligações domiciliares, 02 estações elevatórias potência 3 CV e 5 CV respectivamente, 133m tubulação p/ emissário, 44 m de tubulação

Data de Início: 29/09/94 **Data de Paralisação:** 31/03/95 **Percentual Concluído:** 50

Valor para Conclusão: R\$574.081,00

Município : DORES DO RIO PRETO

Código: 200853 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 30

Valor para Conclusão: R\$97.890,00

Município : GUACUI

Código: 200493 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 17/09/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 82

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Município :	GUACUI	Código:	200854	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	GUARAPARI	Código:	200494	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	01/11/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 1	
Valor para Conclusão:				

Município :	GUARAPARI	Código:	200855	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:	R\$1.753.000,00			

Município :	ITAGUACU	Código:	100021	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de uma escola com 10 salas de aulas no Bairro Florêncio Herzog.			
Data de Início:	08/05/91	Data de Paralisação:	31/12/92	Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:	R\$150.000,00			

Município :	ITAPEMIRIM	Código:	200495	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	25/08/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 95	
Valor para Conclusão:				

Município :	ITAPEMIRIM	Código:	101061	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital da Cana.			
Data de Início:		Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 0	
Valor para Conclusão:	R\$0,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Município : LARANJA DA TERRA

Código: 200856 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : LARANJA DA TERRA

Código: 100689 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : LINHARES

Código: 200858 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Geral

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : LINHARES

Código: 100556 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Geral de Linhares. Obra de aproximadamente 500m², em terreno doado pela prefeitura.

Data de Início:

Data de Paralisação: 31/12/87

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão:

R\$1.760.000,00

Município : LINHARES

Código: 200857 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : MARILANDIA

Código: 200859 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **ES**

Município :	MARILANDIA	Código:	100119	Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação do Hospital de 12 leitos para a sede do Município de Marilândia.				
Data de Início:	18/08/94	Data de Paralisação:	20/10/94	Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão:	R\$600.000,00			

Município :	MONTANHA	Código:	200860	Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde				
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	MUQUI	Código:	100455	Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de uma unidade escolar profissionalizante destinada a crianças carentes.				
Data de Início:	03/04/95	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 52,79	
Valor para Conclusão:	R\$160.000,00			

Município :	PIUMA	Código:	100093	Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação de pólo turístico - Urbanização (Beira Mar)				
Data de Início:	02/01/93	Data de Paralisação:	31/12/93	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$36.187,00			

Município :	PIUMA	Código:	100094	Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do parque de exposição de Piúma - Av. Beira Mar.				
Data de Início:	02/01/93	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão:	R\$8.800,00			

Município :	PIUMA	Código:	100095	Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do Ginásio Poliesportivo - Av. Rio Mar - Praia Doce				
Data de Início:	02/01/84	Data de Paralisação:	31/12/85	Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:	R\$49.950,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Município :	PIUMA	Código:	100096	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Combate a erosão - Av. Beira Mar - Trecho de 3 Km.			
Data de Início:	02/01/93	Data de Paralisação:	31/12/93	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$12.375,00			

Município :	PIUMA	Código:	100097	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ponte sobre Rio Piúma - S. João de Ibitiba			
Data de Início:	02/01/93	Data de Paralisação:	31/12/93	Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:	R\$17.500,00			

Município :	SAO JOSE DO CALCADO	Código:	200861	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	SAO MATEUS	Código:	200496	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	21/07/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 29
Valor para Conclusão:				

Município :	SAO MATEUS	Código:	100092	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CAIC			
Data de Início:	26/10/94	Data de Paralisação:	10/01/95	Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão:	R\$2.100.000,00			

Município :	SAO MATEUS	Código:	200862	Ministérios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Município : SERRA

Código: 200863 * Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Infantil

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 95

Valor para Conclusão:

Município : SERRA

Código: 100548 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Hospital Infantil

Data de Início: 14/10/93

Data de Paralisação: 03/01/94

Percentual Concluído: 7,17

Valor para Conclusão:

Município : SERRA

Código: 200455 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : SERRA

Código: 200497 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 19/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 44

Valor para Conclusão:

Município : VIANA

Código: 100019 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sistema de tratamento de esgoto sanitário

Data de Início: 16/08/94

Data de Paralisação: 30/03/95

Percentual Concluído: 27

Valor para Conclusão:

R\$688.550,00

Município : VIANA

Código: 200498 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 16/06/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 64

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Município : VILA VELHA Código: 100559 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do Centro Regional de Especialidades de Vila Velha, anexo ao Hospital Geral e Infantil de Vila Velha.
Data de Início: 06/08/90 Data de Paralisação: 01/06/91 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$800.000,00

Município : VILA VELHA Código: 100590 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação de 8.369 m de rede coletora, com diâmetros variados, execução de 1798 ligações domiciliares, 02 estações elevatórias de esgoto e 01 estação de tratamento de esgoto (sistema australiano).
Data de Início: 31/01/94 Data de Paralisação: 30/09/94 Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão: R\$1.385.316,00

Município : VILA VELHA Código: 200135 Ministérios
Descrição da Obra: Serviço de pavimentação/iluminação e orçamento de retroárea de Capuaba.
Data de Início: 11/01/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 83,47
Valor para Conclusão: R\$139.988,00

Município : VILA VELHA Código: 200136 Ministérios
Descrição da Obra: Serviço de recuperação estrutural dos dolphins do Cais de Capuaba.
Data de Início: 23/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 48,6
Valor para Conclusão: R\$113.040,00

Município : VILA VELHA Código: 101058 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Geral e Infantil de Vila Velha - com 150 leitos, sendo 45 exclusivos para Pediatria.
Data de Início: 06/08/90 Data de Paralisação: 01/06/91 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$4.472.466,00

Município : VITORIA Código: 100557 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do Hemocentro de Vitória, na área do Hospital das Clínicas.
Data de Início: 31/12/91 Data de Paralisação: 15/04/94 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$520.000,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : VITORIA

Código: 100558 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Complementação do sistema de abastecimento de água da Grande Vitória - 3ª fase.

Data de Início: 30/11/91 **Data de Paralisação:** 30/06/94 **Percentual Concluído:** 80

Valor para Conclusão: R\$8.967.967,00

Município : VITORIA

Código: 200084 **Ministérios**

Descrição da Obra: Reformas e adaptações gerais, do Edifício Eloy Chaves (pavimentações, revestimentos, instalações elétricas, hidro-sanitárias, divisões internas, elevadores, etc.)

Data de Início: 04/07/89 **Data de Paralisação:** 01/03/90 **Percentual Concluído:** 40

Valor para Conclusão: R\$384.736,00

Município : VITORIA

Código: 200085 **Ministérios**

Descrição da Obra: Recuperação e Reforço de Estruturas do Edifício Eloy Chaves.

Data de Início: 15/12/88 **Data de Paralisação:** 01/03/90 **Percentual Concluído:** 80

Valor para Conclusão: R\$380.000,00

Município : VITORIA

Código: 200137 **Ministérios**

Descrição da Obra: Reforma geral nas instalações elétricas do prédio anexo ao armazém nº 4

Data de Início: 09/11/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 81,44

Valor para Conclusão: R\$8.558,00

Município : VITORIA

Código: 200499 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 01/09/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: ES

Unidade da Federação: ES

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :	R\$33.114.536,00
--	------------------

Total de Obras, informado pelos Ministérios :	33
---	----

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:	R\$58.773.192,00
--	------------------

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :	26
--	----

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO

Município : GOIÁS Código: 200140 Ministérios

Descrição da Obra: Construção do trecho Porangatu (GO) - Senador Canedo (GO)

Data de Início: Data de Paralisação: 31/12/90 Percentual Concluído: 11

Valor para Conclusão: R\$610.000.000,00

Município : ALEXANIA Código: 200291 Ministérios

Descrição da Obra: Serviços de conservação rodoviária na BR 060/070/414/DF - Extensão 331,6 Km.

Data de Início: 20/10/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 61,4

Valor para Conclusão: R\$1.402.095,00

Município : ALTO PARAISO DE GOIAS Código: 200864 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ALTO PARAISO DE GOIAS Código: 100219 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Regional de Alto Paraíso - Conclusão e equipagem, para atendimento de 50 leitos.

Data de Início: 02/01/81 Data de Paralisação: 06/10/94 Percentual Concluído: 57,92

Valor para Conclusão:

Município : ALVORADA DO NORTE Código: 200865 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ANAPOLIS Código: 200301 Ministérios

Descrição da Obra: Terraplenagem e Pavimentação para Duplicação da Rodovia BR-060 - Trecho: Anápolis - Goiânia. Segmento: Km 125,8 - Km 171,0 - Extensão: 45,2

Data de Início: 01/09/88 Data de Paralisação: 30/11/93 Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão: R\$14.327.755,00

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : ANAPOLIS

Código: 200286 **Ministérios**

Descrição da Obra: Serviços de melhoramentos e restauração na Rodovia BR-060/GO - Trecho: Anápolis - Goiânia - lote Km 131,6 - Km 170,9.

Data de Início: 10/05/89 **Data de Paralisação:** 17/07/92 **Percentual Concluído:** 84

Valor para Conclusão: R\$11.672.400,00

Município : ANAPOLIS

Código: 200500 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 08/09/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1

Valor para Conclusão:

Município : APARECIDA DE GOIANIA

Código: 100437 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Ampliação de 09 salas, biblioteca, cantina no colégio Estadual Cruzeiro do Sul.

Data de Início: 16/03/94 **Data de Paralisação:** 30/09/94 **Percentual Concluído:** 65

Valor para Conclusão:

R\$100.000,00

Município : APARECIDA DE GOIANIA

Código: 100438 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Ampliação de 07 salas e adequação de bloco existente na escola estadual Rui Barbosa.

Data de Início: 17/05/94 **Data de Paralisação:** 30/09/94 **Percentual Concluído:** 75

Valor para Conclusão:

R\$50.000,00

Município : APARECIDA DE GOIANIA

Código: 200287 **Ministérios**

Descrição da Obra: Serviço de Melhoramentos e Restauração na Rodovia BR-153/GO - Trecho: Goiânia - Profº Jamil - Lote 18B/Km 1295 - 1345,1

Data de Início: 22/09/87 **Data de Paralisação:** 25/11/92 **Percentual Concluído:** 30

Valor para Conclusão: R\$6.700.000,00

Município : APARECIDA DE GOIANIA

Código: 200501 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/12/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 94

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO

Município : APARECIDA DE GOIANIA

Código: 200866 - Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : ARAGARCAS

Código: 200288 - Ministérios

Descrição da Obra: Serviços de Conservação e Recuperação da Rodoviária - Rodovia BR-158/GO -
Subte. Div. MT/GO - 060 (ac. Piranhas) - Extensão: 89,9 Km

Data de Início: 05/10/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50,89

Valor para Conclusão: R\$110.989,00

Município : CACHOEIRA DOURADA

Código: 200867 - Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CAIAPONIA

Código: 100439 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR.158, trecho: Caiaponia/Piranhas. Pavimentação asfáltica de 63,90 km.

Data de Início: 30/11/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$10.059.357,00

Município : CAIAPONIA

Código: 100440 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR.158, trecho: Estaca 2.680+12,88 - Caiapônia. Pavimentação asfáltica com
extensão 53,70 km.

Data de Início: 28/07/94

Data de Paralisação: 13/01/95

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$13.341.340,00

Município : CALDAS NOVAS

Código: 200868 - Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **GO**Município : **CAMPOS BELOS**

Código: 200869 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **CAMPOS VERDES**

Código: 200870 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

Município : **CATALAO**

Código: 200297 Ministérios

Descrição da Obra: Serviços de Conservaç Rodoviária na BR-050/GO - Trecho: Div.DF/GO - Div.GO/MG - Ext. 218,5km

Data de Início: 30/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 10,75

Valor para Conclusão: R\$546.028,00

Município : **CATALAO**

Código: 200502 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/12/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 98

Valor para Conclusão:

Município : **CERES**

Código: 200290 Ministérios

Descrição da Obra: Serviços de Conservação Rodoviária na BR-143/414 GO - Extensão 255,5 Km.

Data de Início: 29/09/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 61,76

Valor para Conclusão: R\$1.001.544,00

Município : **CERES**

Código: 200298 Ministérios

Descrição da Obra: Serviços de Conservação Rodoviária na BR-153/GO - Trecho: Div.TO/GO - Div.GO/MG - Extensão: 304,0km

Data de Início: 08/12/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 31,18

Valor para Conclusão: R\$644.151,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO

Município : CORUMBA DE GOIAS Código: 200871 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : CRISTALINA Código: 100406 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Reforma e ampliação do Hospital Municipal Chaud Salles e equipamentos.
Data de Início: 01/08/94 Data de Paralisação: 31/03/95 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$700.000,00

Município : CRISTALINA Código: 200872 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:

Município : DAVINOPOLIS Código: 100117 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ponte de 250m, interestadual, sobre o Rio Paranaíba, nos municípios de Davinópolis-
GO e Abadia dos Dourados-MG, ligando as regiões sudeste e centro-oeste.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : FORMOSA Código: 200294 Ministérios
Descrição da Obra: Serviços de Conservação Rodoviária na BR 020/GO - Trecho: Div. DF/GO - Div.
GO/BA - Extensão: 251,7 Km
Data de Início: 14/07/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 91,85
Valor para Conclusão: R\$166.201,00

Município : GOIANAPOLIS Código: 200289 Ministérios
Descrição da Obra: Serviço de Manutenção, Conservação e Recuperação Rodoviária na BR-
060/153/GO - Subtrecho: BR-060: Saída p/ Guapó - Entr. GO-217; BR-153; Entr.
GO-415 - 2º Entr. GO-217 - Ext.: 189,9 KM.
Data de Início: 08/11/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60,23
Valor para Conclusão: R\$255.303,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **GO**Município : **GOIANIA**

Código: 100441 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR 060/153 trecho Goiânia /Anápolis, duplicação e pavimentação asfáltica- 40,0km.

Data de Início: 07/02/94 Data de Paralisação: 01/11/94 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$25.310.453,00

Município : **GOIANIA**

Código: 100442 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação de 05 salas na Escola Estadual Sebastião Alves de Souza. Vila Finsocial.

Data de Início: 10/03/94 Data de Paralisação: 31/10/94 Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$60.000,00

Município : **GOIANIA**

Código: 100443 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Geral de Goiânia - H.G.G - Reforma e adequação.

Data de Início: 26/12/91 Data de Paralisação: 31/10/94 Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$2.700.000,00

Município : **GOIANIA**

Código: 100444 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Interceptor do Ribeirão Anicuns. Estação elevatória final de esgotos. Estação de tratamento de esgoto na confluência do Ribeirão Anicuns com Rio Meia Ponte.

Data de Início: 30/08/88 Data de Paralisação: 31/10/93 Percentual Concluído: 15

Valor para Conclusão: R\$70.000.000,00

Município : **GOIANIA**

Código: 200875 - Ministérios

Descrição da Obra: Instituto da Criança

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : **GOIANIA**

Código: 100445 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Instituto da Criança.

Data de Início: 19/01/90 Data de Paralisação: 30/09/94 Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão: R\$1.350.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO**Município : GOIANIA****Código: 200282 - Ministérios****Descrição da Obra:** Obra de duplicação na BR-153/GO - trecho: Acesso Norte - Aparecida, subtrecho Contorno de Goiânia.**Data de Início:** 17/08/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 19,5**Valor para Conclusão:** R\$3.953.334,00**Município : GOIANIA****Código: 100446 Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Contorno Sudoeste de Goiânia, ligando a GO. 070 à BR. 153 com 29,30 km.**Data de Início:** 11/05/95**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

R\$22.015.324,00

Município : GOIANIA**Código: 200503 Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 22/10/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 91**Valor para Conclusão:****Município : GOIANIA****Código: 200504 Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 01/11/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 1**Valor para Conclusão:****Município : GOIANIA****Código: 200873 Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Memor Centenário**Data de Início:** 01/01/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : GOIANIA****Código: 200874 Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital dos Olhos**Data de Início:** 01/01/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO

Município : GOIANIA

Código: 200876 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : GUAPO

Código: 200877 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Materno Infantil

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : GUAPO

Código: 200878 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : GUARANI DE GOIAS

Código: 100399 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Serviço de tratamento d'agua - F.N.S.

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

Município : HEITORAI

Código: 200879 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : IPAMERI

Código: 200402 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **GO**

Município : **ITAGUARU** Código: 200880 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **ITAPIRAPUA** Código: 100447 Estados / Municípios
Descrição da Obra: BR. 070, trecho: Itapirapuã/Jussara, extensão 30 km.
Data de Início: 01/10/92 Data de Paralisação: 01/09/94 Percentual Concluído: 49,8
Valor para Conclusão: R\$2.870.531,00

Município : **JATAI** Código: 100448 Estados / Municípios
Descrição da Obra: BR. 158, trecho: Jataí/Estaca 2.680 + 12,88, pavimentação asfáltica, extensão 53,61 km.
Data de Início: 04/04/94 Data de Paralisação: 01/12/94 Percentual Concluído: 40,3
Valor para Conclusão: R\$3.747.351,00

Município : **JATAI** Código: 200293 Ministérios
Descrição da Obra: Serviços de conservação e recuperação rodoviária na BR 060/364/GO - Extensão 391,8 Km.
Data de Início: 18/08/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 40,4
Valor para Conclusão: R\$731.615,00

Município : **JATAI** Código: 200303 Ministérios
Descrição da Obra: Terraplenaagem e Pavimentação da Rodovia: BR-158/GO - Trecho: Jataí - Piranhas - Extensão: 171,21 Km.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 8
Valor para Conclusão: R\$29.636.089,00

Município : **JATAI** Código: 200505 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 01/09/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO

Município : LUZIANIA

Código: 100165 Estados / Municípios

Descrição da Obra: HOSPITAL REGIONAL

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : LUZIANIA

Código: 100166 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sistema de abastecimento de água da grande Luziânia c/ captação no Rio Corumbá.
Sistema de esgoto sanitário da grande Luziânia - exceto a sede de Luziânia.

Data de Início: 01/10/89

Data de Paralisação: 28/02/91

Percentual Concluído: 55

Valor para Conclusão:

R\$55.000.000,00

Município : LUZIANIA

Código: 200881 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : MINACU

Código: 100449 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma ponte em concreto sobre o Rio Maranhão com 516,3 m.

Data de Início: 14/10/88

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 48,9

Valor para Conclusão:

R\$6.045.429,00

Município : MINEIROS

Código: 200882 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 35

Valor para Conclusão:

Município : MINEIROS

Código: 200883 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO

Município : MORRINHOS **Código:** 200284 **Ministérios**
Descrição da Obra: Serviços de Melhoramentos e Restauração na Rodovia BR-153/GO - Trecho: Morrinhos - Divisa GO/MG - lote 20/Km 1390 - Km 1483,8
Data de Início: 24/11/87 **Data de Paralisação:** 15/12/92 **Percentual Concluído:** 53,4
Valor para Conclusão: R\$7.932.600,00

Município : NOVO PLANALTO **Código:** 200884 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : PIRACANJUBA **Código:** 200292 **Ministérios**
Descrição da Obra: Serviços de conservação rodoviária na BR 153/452/GO - Trecho: 1ª Entr. GO 217 - Div. GO/MG - Extensão 262,1 Km.
Data de Início: 02/07/92 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 60,51
Valor para Conclusão: R\$1.080.862,00

Município : PORANGATU **Código:** 200281 **Ministérios**
Descrição da Obra: Restauração e Melhoramento na rodovia BR-153/GO, trecho Entrº GO-418 - Stª Teresa, subtrecho: km 812 - km 887,4
Data de Início: 14/09/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 64,8
Valor para Conclusão: R\$1.677.877,00

Município : PORANGATU **Código:** 200283 **Ministérios**
Descrição da Obra: Serviços de Supervisão na rodovia BR-153/GO - trecho de Entr. GO-448. Santa tereza - sub-trecho km 812 - km 887,4
Data de Início: 25/11/92 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 80
Valor para Conclusão: R\$123.912,00

Município : POSSE **Código:** 100220 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Ampliação e reforma do Hospital Municipal de Posse.
Data de Início: 01/06/94 **Data de Paralisação:** 28/02/95 **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão: R\$60.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **GO**Município : **POSSE**

Código: 100221 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ambulatório anexo a UHP - Unidade Hospitalar de Posse. Maternidade concluída - 16 leitos. Fechada. Aguardando verbas.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

R\$70.000,00

Município : **RIO QUENTE**

Código: 200885 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **RUBIATABA**

Código: 200886 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **RUBIATABA**

Código: 100411 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Unidade Hospitalar: com dois blocos em um pavimento, composta por: enfermarias, recepção, sala cirurgica, cozinha, banheiros e sanitários, copas, sala de raio x, consultórios, laboratórios, lavanderia, etc.

Data de Início: 18/07/90

Data de Paralisação: 07/02/94

Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão:

R\$200.000,00

Município : **S.LUIS DE MONTES BELOS**

Código: 100549 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação do sistema de esgoto sanitário.

Data de Início: 01/06/94

Data de Paralisação: 28/02/95

Percentual Concluído: 15

Valor para Conclusão:

R\$3.500.000,00

Município : **SAO MIGUEL DO ARAGUAIA**

Código: 200889 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO

Município : SANTA HELENA DE GOIAS

Código: 100326 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Escola Agrícola de 1º Grau.

Data de Início: 03/01/94

Data de Paralisação: 30/06/94

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

R\$1.500.000,00

Município : S.ANTONIO DO DESCOBERTO

Código: 200285 Ministérios

Descrição da Obra: Serviço de Melhoramentos e Restauração na Rodovia BR-60/GO - Trecho Brasília/Anápolis - Lote 19 - Km 46,0 - Km 125,8.

Data de Início: 24/11/87

Data de Paralisação: 29/03/93

Percentual Concluído: 38,2

Valor para Conclusão:

Município : S.ANTONIO DO DESCOBERTO

Código: 200887 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : S.ANTONIO DO DESCOBERTO

Código: 200888 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SILVANIA

Código: 200890 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SIMOLANDIA

Código: 200891 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: GO

Município : TRINDADE

Código: 200892 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : TRINDADE

Código: 100180 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Municipal - A obra projetada se constitui de 03 blocos térreos, interligados, com capacidade inicial de 20 leitos. O referido hospital constitui-se hoje componente indispensável para a consolidação do Sistema de Saúde do Município de Trindade.

Data de Início: 03/02/94 Data de Paralisação: 31/05/95 Percentual Concluído: 41,21

Valor para Conclusão: R\$175.672,00

Município : TRINDADE

Código: 100181 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Conclusão de 3 unidades de saúde - Com os recursos liberados foram executados as fundações, estrutura e alvenaria das 5 unidades projetadas. A Prefeitura concluiu com recursos próprios duas dessas unidades. Falta a conclusão das outras três.

Data de Início: 01/03/94 Data de Paralisação: 30/08/94 Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão: R\$99.000,00

Município : URUACU

Código: 200302 Ministérios

Descrição da Obra: Terraplenagem pavimentação, obras de arte correntes especiais, e serviços complementares - Rodovia BR-080 - Trecho: Uruaçu - Padre Bernardo. Extensão: 133,0 Km.

Data de Início: 17/12/91 Data de Paralisação: 30/11/93 Percentual Concluído: 2,4

Valor para Conclusão: R\$25.716.291,00

Município : URUACU

Código: 100450 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR. 080, trecho: Uruaçu/Barro Alto, com 133,0 km.

Data de Início: 14/05/92 Data de Paralisação: 01/01/94 Percentual Concluído: 4,2

Valor para Conclusão: R\$26.352.885,00

Município : VICENTINOPOLIS

Código: 100125 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Unidade Mista de Saúde.

Data de Início: Data de Paralisação: 30/12/92 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$300.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS****INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS**

14-nov-95

Unidade da Federação: GO**Município: VILA BOA****Código: 200893, Ministérios****Descrição da Obra: Hospital Municipal****Data de Início: 01/01/93****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Unidade da Federação: GO****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios:****R\$717.679.046,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios:****57****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:****R\$245.607.342,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios:****28**

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : MARANHÃO

Código: 200139 **Ministérios**

Descrição da Obra: Construção do trecho colinas de Tocantin (TO) Açailândia (MA)

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 29

Valor para Conclusão: R\$557.290.000,00

Município : MARANHÃO

Código: 200320 **Ministérios**

Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração Rodovia na BR-316/MA

Data de Início: 24/06/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 70

Valor para Conclusão: R\$2.800.000,00

Município : MARANHÃO

Código: 200322 **Ministérios**

Descrição da Obra: Execução de Obras de Melhoramentos e Pavimentação na BR-226/MA

Data de Início: 10/11/86 **Data de Paralisação:** 10/11/91 **Percentual Concluído:** 10

Valor para Conclusão: R\$20.000.000,00

Município : ACAILANDIA

Código: 200086 **Ministérios**

Descrição da Obra: Construção de Posto de Benefícios com 1 pavimento e 300m²

Data de Início: 16/12/87 **Data de Paralisação:** 16/04/87 **Percentual Concluído:** 70

Valor para Conclusão: R\$38.400,00

Município : ALCANTARA

Código: 100182 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Colégio Agrícola de Grande Porte, com 65% da obra concluída, faltando sistema de água, galpões, término do sistema elétrico, máquinas e equipamentos agrícolas, preparo de campo experimental, restauração do prédio principal e residência dos professores.

Data de Início: 02/01/84 **Data de Paralisação:** 31/12/90 **Percentual Concluído:** 65

Valor para Conclusão: R\$1.200.000,00

Município : ALCANTARA

Código: 100183 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: 14.6 Kilômetros de Estrada Principal de Acesso ao Município usado pela Base Aérea Espacial e Comunidade.

Data de Início: 02/01/84 **Data de Paralisação:** 31/12/89 **Percentual Concluído:** 80

Valor para Conclusão: R\$1.890.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MA

Município : ALCANTARA

Código: 200404 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : ARAME

Código: 200894 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BACABAL

Código: 100363 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Retificação do Rio Mearim, trecho entre as cidades de Bacabal e Pedreiras.

Data de Início: 01/11/87

Data de Paralisação: 31/03/90

Percentual Concluído: 38

Valor para Conclusão:

R\$9.300.000,00

Município : CAXIAS

Código: 200895 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital do Câncer

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CODO

Código: 200466 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : COLINAS

Código: 100359 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR 135. Trecho Presidente Dutra/Orozimbo. Subtrecho Colinas/Orozimbo. Extensão de 86,0 Km

Data de Início: 07/08/84

Data de Paralisação: 01/03/90

Percentual Concluído: 49

Valor para Conclusão:

R\$18.735.403,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MA**Município : **COLINAS**

Código: 200087 - Ministérios

Descrição da Obra: Construção do Posto de Benefícios com 1 pavimento e 300m²

Data de Início: 15/02/89 Data de Paralisação: 15/06/89 Percentual Concluído: 42

Valor para Conclusão: R\$55.872,00

Município : **ESTREITO**

Código: 200896 - Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **GOVERNADOR ARCHER**

Código: 100479 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de dois açudes.

Data de Início: 09/09/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **GOVERNADOR ARCHER**

Código: 100480 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma estrada vicinal ligando a sede do município ao Povoado Centro das Lagoas 4,5 km.

Data de Início: 27/08/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **GOVERNADOR ARCHER**

Código: 100481 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma linha de Transmissão Trifásica, de 13,8 kv, entre as cidades de Governador Archer e Codozinho, com 7,95 km.

Data de Início: 09/09/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **GOVERNADOR ARCHER**

Código: 100482 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Poços Artesianos.

Data de Início: 13/10/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MA

Município : GOVERNADOR ARCHER Código: 100483 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da 1ª etapa da Barragem Três Cedros da localidade do mesmo nome.
Data de Início: 29/12/93 Data de Paralisação: 27/01/94 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$16.000.000,00

Município : GOVERNADOR ARCHER Código: 100484 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de uma unidade escolar c/ 3 salas.
Data de Início: 30/11/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : JOSELANDIA Código: 100367 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem do Rio Flores.
Data de Início: 01/07/82 Data de Paralisação: 30/08/90 Percentual Concluído: 96
Valor para Conclusão: R\$2.270.000,00

Município : LAGO DA PEDRA Código: 200088 Ministérios
Descrição da Obra: Construção Posto de Benefício de 1 pavimento, com 300m²
Data de Início: 10/01/89 Data de Paralisação: 10/05/89 Percentual Concluído: 85
Valor para Conclusão: R\$14.400,00

Município : MAGALHAES DE ALMEIDA Código: 100361 Estados / Municípios
Descrição da Obra: 1ª etapa (608 ha) do Projeto Hidroagrícola dos tabuleiros de São Bernardo, do total de 4.550 ha.
Data de Início: 01/08/87 Data de Paralisação: 31/03/90 Percentual Concluído: 58
Valor para Conclusão: R\$5.700.000,00

Município : MAGALHAES DE ALMEIDA Código: 200006 Ministérios
Descrição da Obra: Obras de implantação do projeto de irrigação Tabuleiros de São Bernardo.
Data de Início: 05/08/87 Data de Paralisação: 15/03/90 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$39.100.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MA

Município : PALMEIRANDIA Código: 200004 Ministérios
Descrição da Obra: Obra de implantação do projeto de irrigação Baixada Ocidental Maranhense
Data de Início: 19/12/86 Data de Paralisação: 31/12/91 Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão: R\$3.900.000,00

Município : PALMEIRANDIA Código: 100362 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução do Projeto Hidroagrícola da Baixada Ocidental Maranhense, para irrigar 3.200 ha, (1ª e 2ª etapas) de um total de 5000ha
Data de Início: 01/12/86 Data de Paralisação: 31/03/90 Percentual Concluído: 51
Valor para Conclusão: R\$27.800.000,00

Município : PALMEIRANDIA Código: 100364 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem de Santa Eulália
Data de Início: 01/02/88 Data de Paralisação: 31/03/90 Percentual Concluído: 13
Valor para Conclusão: R\$4.700.000,00

Município : PALMEIRANDIA Código: 100365 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução do Projeto Hidroagrícola da Baixada Ocidental Maranhense, 1ª etapa - 1.200 ha de um total de 5.000 ha.
Data de Início: 01/12/86 Data de Paralisação: 31/03/90 Percentual Concluído: 75
Valor para Conclusão: R\$7.500.000,00

Município : PINHEIRO Código: 100366 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem Eclusa do Rio Pericumã
Data de Início: 01/08/80 Data de Paralisação: 31/03/90 Percentual Concluído: 95
Valor para Conclusão: R\$1.000.000,00

Município : PRESIDENTE DUTRA Código: 200089 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de Posto de Benefício com 1 pavimento
Data de Início: 20/03/89 Data de Paralisação: 20/07/89 Percentual Concluído: 53
Valor para Conclusão: R\$45.312,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MA

Município : RIACHAO

Código: 200090 Ministérios

Descrição da Obra: Construção de Posto de Benefício com 1 pavimento e 200m²

Data de Início: 05/03/89 Data de Paralisação: 05/07/89 Percentual Concluído: 54

Valor para Conclusão: R\$29.440,00

Município : SAO BENTO

Código: 200897 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SAO LUIS

Código: 100358 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR 135. Trecho São Luiz/Estiva. Extensão de 24,8 Km

Data de Início: 09/02/88 Data de Paralisação: 01/01/90 Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$13.588.366,00

Município : SAO LUIS

Código: 200138 Ministérios

Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DO PÍER PETROLEIRO DO PORTO DO ITAQUI

Data de Início: 26/02/88 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 77

Valor para Conclusão: R\$19.336.943,00

Município : SAO MATEUS DO MARANHAO

Código: 200005 Ministérios

Descrição da Obra: Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Salangô/MA.

Data de Início: 30/04/93 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 6,5

Valor para Conclusão: R\$25.900.000,00

Município : TIMON

Código: 200323 Ministérios

Descrição da Obra: Construção de Ponte Rodoviária sobre o rio Parnaíba

Data de Início: 29/12/87 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 25

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MA

Município :	TIMON	Código:	100360	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ponte sobre o Rio Parnaíba. Ligando a cidade de Timon-MA a cidade de Teresina-PI. Extensão de 1.070 m.			
Data de Início:	09/02/88	Data de Paralisação:	22/12/92	Percentual Concluído: 58
Valor para Conclusão:	R\$12.000.000,00			

Município :	TIMON	Código:	100368	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR 226. Trecho Timon/Presidente Dutra. Sub-trecho Timon - Km-100. Extensão de 100,0 KM			
Data de Início:	15/04/86	Data de Paralisação:	01/03/87	Percentual Concluído: 95
Valor para Conclusão:	R\$21.785.352,00			

Município :	TIMON	Código:	200091	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção do Posto de benefício com pavimento de 300m²			
Data de Início:	15/02/89	Data de Paralisação:	15/06/89	Percentual Concluído: 71
Valor para Conclusão:	R\$27.168,00			

Município :	TIMON	Código:	200507	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	13/09/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 42
Valor para Conclusão:				

Município :	TURIACU	Código:	200403	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município :	TUTOIA	Código:	200092	Ministérios
Descrição da Obra:	Constr. de Posto de Benefícios com 1 pavimento e 400 m²			
Data de Início:	17/12/87	Data de Paralisação:	17/04/87	Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão:	R\$38.400,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MA

Município : VARGEM GRANDE

Código: 200093 Ministérios

Descrição da Obra: Constr. de Posto de benefícios com 1 pavimento e 300 m²

Data de Início: 01/03/89 Data de Paralisação: 01/07/89 Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$67.200,00

Unidade da Federação: MA

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios : R\$668.643.135,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios : 24

Total dos recursos para conclusão, informado pelos
Estados/Municípios: R\$143.469.121,00

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios : 19

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município :	MINAS GERAIS	Código:	101021	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR 262 trecho entre a divisa ES/MG e divisa MG/SP km 100 e km 196,5.			
Data de Início:	01/09/87	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 76
Valor para Conclusão:	R\$4.000.000,00			

Município :	MINAS GERAIS	Código:	101022	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR 262 - Trecho entre divisa ES/MG e divisa MG/SP km 0 a km 100.			
Data de Início:	01/09/87	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 82
Valor para Conclusão:	R\$4.400.000,00			

Município :	MINAS GERAIS	Código:	200164	Ministérios
Descrição da Obra:	ROD. BR-040/MG TRECHO;DIVISA GO/MG-DIVISA MG/RJ SUB-TR; ENTRº MG 275-ENTR º MG 452 KM 707, 7 OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE.			
Data de Início:	01/12/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão:	R\$6.907.129,00			

Município :	MINAS GERAIS	Código:	200165	Ministérios
Descrição da Obra:	Rod: BR-040/MG Trecho: Divisa Go/MG-Divisa Entrº MG 452-KM 682,5 ao Km 707,7 Obras de Adequação de Capacidade.			
Data de Início:	30/11/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão:	R\$2.300.007,00			

Município :	MINAS GERAIS	Código:	200166	Ministérios
Descrição da Obra:	Rod: BR-040/MG(Duplicação) Trecho; Divisa Go/MG-Belo Horizonte Sub-Tr; KM 472,0-km 533,0 (Sete Lagoas-Palmita) Obras de Duplicação.			
Data de Início:	13/03/90	Data de Paralisação:	01/01/94	Percentual Concluído: 32
Valor para Conclusão:	R\$8.256.476,00			

Município :	MINAS GERAIS	Código:	200167	Ministérios
Descrição da Obra:	BR-352/MG Trecho: Divisa GO/MG - Entrº. BR-262/MG (Pará de Minas) Sub-Tr.: Divisa GO/MG - Entrº. MG - 188 (Coromandel). Construção de o.a. especiais			
Data de Início:	08/10/93	Data de Paralisação:	01/01/94	Percentual Concluído: 19
Valor para Conclusão:	R\$1.144.920,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : MINAS GERAIS Código: 200168 Ministérios
Descrição da Obra: BR - 259/MG trecho Resplendor/MG - Colatina/ES Sub-Tr.: Aimorés-Resplendor
35,00 km e Aces. a Ituêta 1,54 km a Quatituba 3,5 km a Resplendor 1,31 km, trav.
Aimorés 2,97 km, Ponte S/R Manhauçu Obr. Const. Pav.

Data de Início: 14/04/89 Data de Paralisação: 01/01/94 Percentual Concluído: 44

Valor para Conclusão: R\$5.468.929,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200169 Ministérios
Descrição da Obra: BR - 040/MG Trecho Divisa GO/MG - Divisa MG/RJ Sub-Tr.: Entrº MG 275 - Entrº
MG 452 (lote 05) - O.A.E. - Acessos Obras de Adequação de Capacidade - O.A.E.

Data de Início: 13/12/94 Data de Paralisação: 02/01/95 Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$922.912,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200170 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR-040/MG Trecho : Divisa GO/MG-Divisa MG/RJ SUB-Tr: EntrºMG 275-
EntrºMG452-KM 707,7-KM 731,0 (Lote) Obras de Adequação de capacidade

Data de Início: 30/11/94 Data de Paralisação: 02/01/95 Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$10.568.066,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200171 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR-494/MG - Subtrecho São João Del Rei - Morro dos Ferros Obras de
Construção e Pavimentação

Data de Início: 22/10/93 Data de Paralisação: 15/12/93 Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão: R\$4.584.633,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200172 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR - 040/MG Trecho ; Divisa GO/MG - Divisa MG/RJ Sub. Tr. EntrºMG -
452(Lote 4) Obras de Adequação de Capacidade - O.A.E

Data de Início: 28/12/94 Data de Paralisação: 01/02/95 Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$1.051.524,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200173 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR - 040/MG Trecho: Divisa GO/MG - Divisa MG/RJ Sub- tr: Entrº MG -
275- Entrº MG - 452 (Lote 03) Obras de Adequação de Capacidade O.A.E

Data de Início: 19/12/94 Data de Paralisação: 01/02/95 Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$969.091,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : **MINAS GERAIS** Código: 200174 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR- 381/MG e BR- 116/MG Trecho; Div. ES/MG - Div. ES/MG - Div MG/SP
Sub- Tr: Gov. Valadares - Ipatinga
Data de Início: 23/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 58
Valor para Conclusão: R\$316.077,00

Município : **MINAS GERAIS** Código: 200175 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR - 153/MG Sub. Tr. Divisa GO/MG (Ponte sobre o Rio Paranaíba)
Recuperação de O.A E,
Data de Início: 25/04/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 54
Valor para Conclusão: R\$442.799,00

Município : **MINAS GERAIS** Código: 200176 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR-116/MG Trecho: Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ Sub-Tr; Itambacuri-Entrº
MG-311 (P/Pescador) - Segmento KM 310 Construção de Passagem Inferior
Data de Início: 30/09/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 4
Valor para Conclusão: R\$943.015,00

Município : **MINAS GERAIS** Código: 200177 Ministérios
Descrição da Obra: Rod: BR-251/MG Trecho Divisa BA/MG-Divisa MG/GO Sub. Tr. Montes Claros-
Salinas - Ponto Localizado KM 202,4 Recuperação de aterro e buero
Data de Início: 25/04/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 58
Valor para Conclusão: R\$474.927,00

Município : **MINAS GERAIS** Código: 200178 Ministérios
Descrição da Obra: Rod: BR-116/MG Trecho KM 793-KM 819/823 Obras de Restauração
Data de Início: 29/12/89 Data de Paralisação: 01/01/95 Percentual Concluído: 58
Valor para Conclusão: R\$4.332.794,00

Município : **MINAS GERAIS** Código: 200179 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR-262/MG Trecho: KM 448 - KM 511 e 550 - KM 573 Obras de Restauração
Data de Início: 16/10/89 Data de Paralisação: 01/01/94 Percentual Concluído: 42
Valor para Conclusão: R\$6.679.570,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : MINAS GERAIS Código: 200180 Ministérios

Descrição da Obra: Rod: BR-116/MG Trecho KM 148 - KM 202 Obras de Restauração

Data de Início: 25/10/93 Data de Paralisação: 01/01/94 Percentual Concluído: 2

Valor para Conclusão: R\$14.937.411,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200181 Ministérios

Descrição da Obra: Rod: BR-116/MG Trecho: Divisa BA/MG-Divisa MG/RJ Sub-Tr: KM 378,8 Obras de Restauração

Data de Início: 22/10/93 Data de Paralisação: 01/01/94 Percentual Concluído: 6

Valor para Conclusão: R\$12.184.035,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200182 Ministérios

Descrição da Obra: Rod: BR-116/MG Trecho: Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ Sub. Tr, KM 378,8 - KM 413,1 Obras de Restauração

Data de Início: 14/10/93 Data de Paralisação: 15/12/93 Percentual Concluído: 27

Valor para Conclusão: R\$2.218.174,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200183 Ministérios

Descrição da Obra: Rod: BR-116/MG Trecho KM 435- KM- 491 Obras de Restauração

Data de Início: 22/10/93 Data de Paralisação: 23/09/94 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$13.041.238,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200184 Ministérios

Descrição da Obra: Rod: BR-116/MG Trecho KM 663 - KM 744 Obras de Restauração

Data de Início: 14/09/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 94

Valor para Conclusão: R\$905.254,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200185 Ministérios

Descrição da Obra: Rod: BR-153/MG Trecho Entrº BR-452- Divisa GO/MG Sub:Tr: KM 0 - KM 58 Obras de Restauração

Data de Início: 17/04/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$1.124.025,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : MINAS GERAIS **Código:** 200186 **Ministérios**
Descrição da Obra: Rod.: BR-153/MG Trecho: Entrº BR-452- Divisa GO/MG Sub-Tr. KM 58- KM 108
Obras de Restauração
Data de Início: 17/04/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0
Valor para Conclusão: R\$1.065.256,00

Município : MINAS GERAIS **Código:** 200187 **Ministérios**
Descrição da Obra: Rod.: BR-040/MG Trecho: KM 371,7 - KM 424,0 Obras de Restauração
Data de Início: 16/12/93 **Data de Paralisação:** 01/02/95 **Percentual Concluído:** 46
Valor para Conclusão: R\$305.195,00

Município : MINAS GERAIS **Código:** 200188 **Ministérios**
Descrição da Obra: Rod.: BR-050/MG Trecho: KM 0,0 - KM 47,0 Obras de Restauração
Data de Início: 29/12/92 **Data de Paralisação:** 01/02/95 **Percentual Concluído:** 37
Valor para Conclusão: R\$4.344.546,00

Município : MINAS GERAIS **Código:** 200189 **Ministérios**
Descrição da Obra: Rod.: BR-050/MG Trecho: KM 164,3 - KM 208,9 Obras de Restauração
Data de Início: 03/11/93 **Data de Paralisação:** 01/01/94 **Percentual Concluído:** 5
Valor para Conclusão: R\$6.086.909,00

Município : MINAS GERAIS **Código:** 200190 **Ministérios**
Descrição da Obra: Rod.: BR-262/MG Trecho: KM 730,6 - KM 803,7 Obras de Restauração
Data de Início: 29/09/92 **Data de Paralisação:** 01/01/93 **Percentual Concluído:** 89
Valor para Conclusão: R\$847.577,00

Município : MINAS GERAIS **Código:** 200191 **Ministérios**
Descrição da Obra: Rod.: BR-364/MG Trecho: Entrº MG-050 - BR-381 Sub-Tr.: KM 548,5 - KM 595
Obras de Restauração
Data de Início: 20/04/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0
Valor para Conclusão: R\$1.218.005,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : MINAS GERAIS

Código: 200192 **Ministérios**

Descrição da Obra: Rod.: BR-364/MG Trecho: Entrº MG050 - BR-381 Sub-Tr.: KM 500 - KM 548
Obras de Restauração

Data de Início: 28/04/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0

Valor para Conclusão: R\$1.278.980,00

Município : MINAS GERAIS

Código: 200193 **Ministérios**

Descrição da Obra: Rod: BR-365/MG Trecho: Entrº BR-122/135/251 - Entrº BR-364-B Sub-TR.: KM 210,3 - KM 277,8 Obras de Restauração

Data de Início: 07/04/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0

Valor para Conclusão: R\$1.895.405,00

Município : MINAS GERAIS

Código: 200194 **Ministérios**

Descrição da Obra: Rod: BR-365/MG Trecho: Entrº BR-122/135/251- Entrº BR-364-B Sub-Tr.: KM 160 - KM 210,3 Obras de Restauração

Data de Início: 05/04/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0

Valor para Conclusão: R\$1.382.202,00

Município : MINAS GERAIS

Código: 200195 **Ministérios**

Descrição da Obra: Rod.: BR-381/MG Trecho: KM 255,6 - KM 285,7 Obras de Restauração

Data de Início: 16/11/93 **Data de Paralisação:** 15/12/93 **Percentual Concluído:** 2

Valor para Conclusão: R\$1.877.859,00

Município : MINAS GERAIS

Código: 200196 **Ministérios**

Descrição da Obra: Rod.: BR-381/MG Trecho: KM 285,7 - KM 320,8 Obras de Restauração

Data de Início: 29/04/93 **Data de Paralisação:** 01/01/95 **Percentual Concluído:** 35

Valor para Conclusão: R\$8.210.671,00

Município : MINAS GERAIS

Código: 200197 **Ministérios**

Descrição da Obra: Rod: BR-356/MG e BR-040/MG Trecho: Belo Horizonte-Div. MG/RJ e Div. GO/MG - Div. MG/RJ Sub-TR.: KM 538,0-KM 629,2 Obras de Restauração

Data de Início: 16/12/93 **Data de Paralisação:** 01/01/95 **Percentual Concluído:** 90

Valor para Conclusão: R\$85.400,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : MINAS GERAIS Código: 200198 Ministérios
Descrição da Obra: Rodovia: BR-381 (Fernão Dias) Trecho: Belo Horizonte - km 441 - km 652 Obras de Duplicação
Data de Início: 17/05/93 Data de Paralisação: 01/03/95 Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão: R\$276.911.037,00

Município : MINAS GERAIS Código: 200199 Ministérios
Descrição da Obra: Rod. BR-040/MG - Trecho: Divisa GO/MG - Belo Horizonte Sub-Tr. Anel Rodoviário Belo Horizonte - Sete Lagoas - Obras de Duplicação e O.A.E.
Data de Início: 21/01/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 71
Valor para Conclusão: R\$4.000.000,00

Município : MINAS GERAIS Código: 101050 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ponte de Porto Alencastro na rodovia 497 com 0,6 Km de extensão sobre o rio Paranaíba, na divisa MG/MS
Data de Início: 01/06/94 Data de Paralisação: 01/11/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$30.000.000,00

Município : ABADIA DOS DOURADOS Código: 100430 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ponte sobre o Rio Paranaíba - Divisa MG/GO Rodovia BR-352 - ligação Belo Horizonte-MG à Goiânia (GO) Está com a infra e meso estruturas concluídas.
Data de Início: 01/01/81 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:

Município : ALFENAS Código: 200520 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 22/10/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 98
Valor para Conclusão:

Município : ALMENARA Código: 200712 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-367/MG, extensão: 88,6 km.
Data de Início: Data de Paralisação: 01/10/94 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$30.035.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município :	ALMENARA	Código:	100713	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia: BR/367; Extensão: 88,6 Km; Trecho Almenara / Salto da Divisa; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.			
Data de Início:	06/10/89	Data de Paralisação:	01/05/95	Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:	R\$30.035.000,00			
Município :	ALMENARA	Código:	200521	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	20/07/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 8
Valor para Conclusão:				
Município :	ALMENARA	Código:	200898	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				
Município :	ANDRADAS	Código:	100167	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL (BAIRRO JARDIM PRIMAVERA). NUMA ÁREA TOTAL DE 880.89m² DA QUAL SENDO COSTRUIDA 576,39m².			
Data de Início:	01/03/94	Data de Paralisação:	31/07/94	Percentual Concluído: 34,57
Valor para Conclusão:	R\$76.125,00			
Município :	ANDRADAS	Código:	100168	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL " PAULO AUGUSTO DRUMOND DE SOUZA" NUMA ÁREA TOTAL DE 1.314,67m² DA QUAL FOI CONCLUÍDA 1.066,61m²., FALTANDO A CONSTRUÇÃO DA ÁREA RESTANTE.			
Data de Início:	01/05/93	Data de Paralisação:	31/05/94	Percentual Concluído: 18,87
Valor para Conclusão:	R\$62.015,00			
Município :	ANDRADAS	Código:	100732	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Canalização do córrego do Mosquito, pavimentação de vias, drenagem e esgoto sanitário numa extensão aproximadamente de 1.400 m.			
Data de Início:	02/05/95	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:	R\$1.500.000,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : ARACAI

Código: 200899 * Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ARACUAI

Código: 200717 Ministérios

Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-342/MG; extensão: 105 km. Nº contrato: PJU-22.034/89.

Data de Início:

Data de Paralisação: 01/10/94

Percentual Concluído: 3,6

Valor para Conclusão: R\$40.681.000,00

Município : ARACUAI

Código: 100711 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia: BR/342; Extensão: 105,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.

Data de Início: 02/10/89

Data de Paralisação: 01/10/94

Percentual Concluído: 3,6

Valor para Conclusão:

R\$40.681.000,00

Município : ARACITABA

Código: 200900 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ARAXA

Código: 200721 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração, Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-452/MG; extensão: 41,5 km de restauração, 17,9 km de implantação/pavimentação.

Data de Início:

Data de Paralisação: 15/06/95

Percentual Concluído: 24

Valor para Conclusão: R\$3.813.000,00

Município : ARAXA

Código: 100722 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia: BR/452; Extensão: 41,5 Km de Restauração, 17,9 Km de Implantação/Pavimentação; Natureza dos trabalhos: Restauração/Implantação e Pavimentação.

Data de Início: 01/12/93

Data de Paralisação: 15/06/95

Percentual Concluído: 24

Valor para Conclusão:

R\$3.813.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : ARAXA Código: 200706 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração da Rodovia BR-452/MG, extensão: 38,25 km.

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ARAXA Código: 100724 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia: BR/452; Extensão: 38,25 Km; Natureza dos Trabalhos: Restauração.

Data de Início: 01/12/93 Data de Paralisação: 15/06/95 Percentual Concluído: 24

Valor para Conclusão: R\$4.537.000,00

Município : ARAXA Código: 200727 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração da Rodovia BR-452/MG; extensão: Lote 04 = 47,25 km; Acesso à Araxá - 4,0 km.

Data de Início: Data de Paralisação: 15/06/95 Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$8.097.000,00

Município : ARAXA Código: 100726 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia: BR/452; Extensão: Lote 04 = 47,25 Km, Acesso a Araxá = 4,0 Km; Natureza dos Trabalhos: Restauração.

Data de Início: 01/12/93 Data de Paralisação: 15/06/95 Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$8.097.000,00

Município : ARAXA Código: 200901 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ARAXA Código: 200716 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração da Rodovia BR-452/MG; extensão: 38,25 km. Nº contrato: PJU-22.085/93.

Data de Início: Data de Paralisação: 15/06/95 Percentual Concluído: 24

Valor para Conclusão: R\$4.537.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : BELO HORIZONTE **Código:** 200903 **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Cardiominas**Data de Início:** 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : BELO HORIZONTE **Código:** 100728 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção do Hospital CARDIOMINAS: 64.000 m² de área construída, distribuídas em 12 Pav., incluindo uma torre de 04 Pav., destinadas a internação. Será equipado para atender pacientes nas áreas de Cardiologia, Nefrologia, Pneumologia e Imunologia onde se**Data de Início:** 07/11/88 **Data de Paralisação:** 01/09/94 **Percentual Concluído:** 39,67**Valor para Conclusão:** R\$40.000.000,00

Município : BELO HORIZONTE **Código:** 200905 **Ministérios****Descrição da Obra:** Pronto Socorro Venda Nova**Data de Início:** 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : BELO HORIZONTE **Código:** 100730 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção do Pronto Socorro de Venda Nova. A edificação possui uma área total de construção de 21.364,70 m², divididos em três blocos principais, sendo o bloco "A" destinado a manutenção em um pavimento, o bloco "B" em três pavimentos destinados aos seto**Data de Início:** 17/07/90 **Data de Paralisação:** 31/07/95 **Percentual Concluído:** 27,52**Valor para Conclusão:** R\$21.154.700,00

Município : BELO HORIZONTE **Código:** 100737 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Jaqueline, constando de 29.050 m de redes coletoras e 2.700 ligações prediais de esgotos sanitários.**Data de Início:** 01/12/93 **Data de Paralisação:** 31/01/95 **Percentual Concluído:** 26**Valor para Conclusão:** R\$1.500.000,00

Município : BELO HORIZONTE **Código:** 200160 **Ministérios****Descrição da Obra:** Substituição de Grada Corpo por Barreira (New Jersey) Anel Rodoviário BH.**Data de Início:** 18/05/94 **Data de Paralisação:** 01/12/94 **Percentual Concluído:** 60**Valor para Conclusão:** R\$323.226,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município :	BELO HORIZONTE	Código:	200162	Ministérios
Descrição da Obra:	Iluminação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte/MG.			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão:	R\$5.740.000,00			

Município :	BELO HORIZONTE	Código:	200646	Ministérios
Descrição da Obra:	Implantação sistema telecomunicação TMBH			
Data de Início:	30/06/81	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 75
Valor para Conclusão:	R\$1.941.081,00			

Município :	BELO HORIZONTE	Código:	200649	Ministérios
Descrição da Obra:	Rede aérea do TMBH			
Data de Início:	30/06/81	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 75
Valor para Conclusão:	R\$7.125.259,00			

Município :	BELO HORIZONTE	Código:	200650	Ministérios
Descrição da Obra:	Sinalização do TMBH			
Data de Início:	30/06/81	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 55
Valor para Conclusão:	R\$3.114.424,00			

Município :	BELO HORIZONTE	Código:	200651	Ministérios
Descrição da Obra:	Implantação do Sistema de Alimentação de Energia do TMBH			
Data de Início:	30/06/81	Data de Paralisação:	31/12/88	Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão:	R\$1.172.631,00			

Município :	BELO HORIZONTE	Código:	200902	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**Município : **BELO HORIZONTE**

Código: 200904 - Ministérios

Descrição da Obra: Policlínica

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **BETIM**

Código: 200906 - Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **BOM DESPACHO**

Código: 200522 - Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/12/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 98

Valor para Conclusão:

Município : **BOM JESUS DA PENHA**

Código: 200907 - Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$120.000,00

Município : **CACHOEIRA DE MINAS**

Código: 200908 - Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **CAETANOPOLIS**

Código: 100731 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Canalização do Córrego Trairas, pavimentação de vias, drenagem e esgoto sanitário numa extensão de 1.300 m.

Data de Início: 11/11/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

R\$1.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**Município : **CAETANOPOLIS**

Código: 200909 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$20.000,00

Município : **CAETE**

Código: 100470 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Posto de Saúde - edificação, fornecimento e montagem, em fibrocimento, num total de 162,99 m², em bairro de periferia urbana, para atendimento médico e usual de aproximadamente 6.000 pessoas/mês.

Data de Início: 11/03/94

Data de Paralisação: 24/03/94

Percentual Concluído: 14,81

Valor para Conclusão:

R\$51.144,00

Município : **CAETE**

Código: 100471 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Creche - construção industrializada de fibrocimento, modelo FC, com 504,98 m², para atendimento de 120 crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, com atendimento integral e implantação gradativa da Pré-escola.

Data de Início: 08/04/94

Data de Paralisação: 20/04/94

Percentual Concluído: 5,61

Valor para Conclusão:

R\$166.437,00

Município : **CAETE**

Código: 100472 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Ponte - Construção de Avenida para ligação dos Bairros Pedra Branca e José Brandão, incluindo construção de galerias de concreto armado e pavimentação asfáltica.

Data de Início: 07/11/94

Data de Paralisação: 30/01/95

Percentual Concluído: 62

Valor para Conclusão:

R\$230.000,00

Município : **CAETE**

Código: 200412 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : **CAMPINA VERDE**

Código: 200723 Ministérios

Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-154/MG; extensão: 36 km.

Data de Início:

Data de Paralisação: 15/06/95

Percentual Concluído: 12,3

Valor para Conclusão: R\$14.069.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município :	CAMPINA VERDE	Código:	100715	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia: BR/154; Extensão: 36,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.			
Data de Início:	04/07/90	Data de Paralisação:	15/06/95	Percentual Concluído: 12,3
Valor para Conclusão:	R\$14.069.000,00			

Município :	CAMPOS ALTOS	Código:	100102	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Reforma e conclusão da Escola Municipal Amélia Franco - Construção de Quadra Poliesportiva.			
Data de Início:	24/03/95	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:	R\$100.000,00			

Município :	CAMPOS ALTOS	Código:	100103	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Complementação da Escola Municipal Julio Cesar de Oliveira			
Data de Início:	19/04/95	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:	R\$130.000,00			

Município :	CAMPOS ALTOS	Código:	100104	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de Anexo Santa Casa de Misericórdia de Campos Altos.			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$300.000,00			

Município :	CAMPOS ALTOS	Código:	100105	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de Creche.			
Data de Início:	02/01/93	Data de Paralisação:	30/12/93	Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão:	R\$200.000,00			

Município :	CANAA	Código:	200910	Ministérios
Descrição da Obra:	Posto de Saúde			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : CAPETINGA **Código:** 100032 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Prédio com 360m² de construção, destinada ao centro cirúrgico do hospital
Data de Início: 01/04/94 **Data de Paralisação:** 01/10/94 **Percentual Concluído:** 30
Valor para Conclusão: R\$75.000,00

Município : CARATINGA **Código:** 200911 **Ministérios**
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : CARLOS CHAGAS **Código:** 200707 **Ministérios**
Descrição da Obra: Restauração da Rodovia BR-418/MG, extensão: 59 km.
Data de Início: **Data de Paralisação:** 01/03/94 **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão: R\$19.957.000,00

Município : CARLOS CHAGAS **Código:** 100721 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Rodovia: BR/418; Extensão: 59,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Restauração.
Data de Início: 01/06/93 **Data de Paralisação:** 01/03/94 **Percentual Concluído:** 0,1
Valor para Conclusão: R\$19.957.000,00

Município : CARNEIRINHO **Código:** 200710 **Ministérios**
Descrição da Obra: Ponte sobre o Rio Paranaíba na Rodovia BR-497/MG; dimensões: 662,7 m X 16,0 m.
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 15
Valor para Conclusão: R\$23.501.000,00

Município : CARNEIRINHO **Código:** 100727 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Rodovia: BR/497; Dimensões: 662,70 m X 16,00 m; Natureza dos Trabalhos:
Ponte sobre o Rio Paranaíba.
Data de Início: 01/06/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 15
Valor para Conclusão: R\$23.501.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**Município : **CASSIA**

Código: 200912 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **CATAGUASES**

Código: 200411 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : **CAXAMBU**

Código: 100718 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia: BR/267; Extensão: 68,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Melhoramentos e Restauração.

Data de Início: 01/12/94

Data de Paralisação: 01/01/95

Percentual Concluído: 13,8

Valor para Conclusão:

R\$2.471.186,00

Município : **CAXAMBU**

Código: 200719 Ministérios

Descrição da Obra: Melhoramentos e Restauração na Rodovia BR-267/MG; extensão: 68 km.

Data de Início:

Data de Paralisação: 01/01/95

Percentual Concluído: 13,8

Valor para Conclusão: R\$2.471.186,00

Município : **CHACARA**

Código: 100184 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Asfaltamento de 12 Km trecho Filgueiras a Chácara, com terraplanagem pronta.

Data de Início: 02/01/90

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **CHALE**

Código: 200913 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**Município : **CLARO DOS POÇOS**

Código: 200914 - Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **CONGONHAS**

Código: 100030 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Esgotamento sanitário (falta a construção de 3 estações de tratamento de esgoto nos distritos do Pires e do Alto Maranhão.

Data de Início: 01/08/94

Data de Paralisação: 07/03/95

Percentual Concluído: 63

Valor para Conclusão:

R\$155.000,00

Município : **CONSELHEIRO LAFAIETE**

Código: 200523 - Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 17/09/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão:

Município : **CONSELHEIRO LAFAIETE**

Código: 101051 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR-482 - Pavimentação de trecho com 71 Km de extensão, incluído no eixo de interligação das rodovias BR-040 e BR-120

Data de Início: 01/06/88

Data de Paralisação: 01/11/90

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$10.000.000,00

Município : **CONSELHEIRO PENA**

Código: 101023 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Trecho de BR 359 entre Conselheiro Pena Aimorés e São Gonçalo do abaeté.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **CONTAGEM**

Código: 200524 - Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 01/11/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : CONTAGEM Código: 200915 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : CORACAO DE JESUS Código: 100264 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização e urbanização do córrego Buriti.
Data de Início: 01/02/93 Data de Paralisação: 30/10/94 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$1.000.000,00

Município : CORACAO DE JESUS Código: 100265 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Macro drenagem na sede do município.
Data de Início: 01/02/93 Data de Paralisação: 30/10/94 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$1.000.000,00

Município : CORACAO DE JESUS Código: 100266 Estados / Municípios
Descrição da Obra: CAIC
Data de Início: 01/04/94 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : CORACAO DE JESUS Código: 200525 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 08/09/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : CORDISLANDIA Código: 100327 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação e Pavimentação - Lote 01 - MOnsenhor Paulo / Cordislândia (25 Km).
Lote 02 - Cordislândia / Carvalhópolis (25 Km)
Data de Início: 08/10/93 Data de Paralisação: 31/03/94 Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão: R\$3.070.430,00

14-nov-95

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : CORONEL PACHECO

Código: 200916 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : CORREGO NOVO

Código: 200917 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : CURVELO

Código: 200918 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CURVELO

Código: 200919 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : DIAMANTINA

Código: 200713 Ministérios

Descrição da Obra: Complementação dos trabalhos de restauração e construção de passarela nas Rodovias BR-259 e BR-367/MG; extensão: 73,9 km.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : DIAMANTINA

Código: 100719 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovias: BR/259 e BR/367; Extensão: 73,9 Km; Natureza dos Trabalhos: Complementação dos trabalhos de restauração e construção de passarela.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : DIVINOLANDIA DE MINAS Código: 200711 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-259/MG, extensão: 24 km.
Data de Início: Data de Paralisação: 01/12/93 Percentual Concluído: 64,2
Valor para Conclusão: R\$8.066.000,00

Município : DIVINOLANDIA DE MINAS Código: 100708 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia: BR/259; Extensão: 24,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.
Data de Início: 20/09/89 Data de Paralisação: 01/12/93 Percentual Concluído: 64,2
Valor para Conclusão: R\$8.066.000,00

Município : DIVINOPOLIS Código: 200526 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 17/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 66
Valor para Conclusão:

Município : DORES DE CAMPOS Código: 200920 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : ERVALIA Código: 200718 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-356/MG; extensão: 52 km.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 35,8
Valor para Conclusão: R\$15.544.000,00

Município : ERVALIA Código: 100720 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia: BR/356; Extensão: 52,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.
Data de Início: 01/04/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 35,8
Valor para Conclusão: R\$15.544.000,00

14-nov-95

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : **ESTRELA DO INDAIA** Código: 100026 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Término da construção do Hospital Municipal c/ 1.137 m² de área construída, c/ 19 leitos para atender a população de 4.000 habitantes de Estrela e 860 habitantes de Serra da Saudade.
 Data de Início: 20/09/94 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 25
 Valor para Conclusão: R\$350.000,00

Município : **ESTRELA DO SUL** Código: 100028 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Construção de uma creche municipal com 400m² na sede do Município.
 Data de Início: 01/12/93 Data de Paralisação: 30/11/94 Percentual Concluído: 60
 Valor para Conclusão: R\$32.000,00

Município : **ESTRELA DO SUL** Código: 200921 Ministérios
 Descrição da Obra: Posto de Saúde
 Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
 Valor para Conclusão:

Município : **EWBANK DA CAMARA** Código: 100031 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Barragem chapéu d'uvas
 Data de Início: 01/01/86 Data de Paralisação: 31/12/86 Percentual Concluído:
 Valor para Conclusão:

Município : **FELICIO DOS SANTOS** Código: 100319 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Prédio em construção da Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro, na localidade de Canela.
 Data de Início: 02/01/89 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 60
 Valor para Conclusão: R\$3.571,00

Município : **FORTUNA DE MINAS** Código: 200922 Ministérios
 Descrição da Obra: Unidade de Saúde
 Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60
 Valor para Conclusão: R\$78.795,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município :	FRONTEIRA DOS VALES	Código:	200923	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:	R\$100.000,00			

Município :	FRUTAL	Código:	200924	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/92	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	FUNILANDIA	Código:	200925	Ministérios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	GOVERNADOR VALADARES	Código:	100705	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia: BR/259; Extensão: 9,80 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.			
Data de Início:	01/05/95	Data de Paralisação:	15/06/95	Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão:	R\$3.883.000,00			

Município :	GOVERNADOR VALADARES	Código:	200704	Ministérios
Descrição da Obra:	Implantação e pavimentação na Rodovia BR-259/MG, extensão: 45 km. Nº contrato: PJU-22.023/90.			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 47,1
Valor para Conclusão:	R\$9.642.000,00			

Município :	GOVERNADOR VALADARES	Código:	100706	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia: BR/259; Extensão: 45,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.			
Data de Início:	02/04/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 47,1
Valor para Conclusão:	R\$9.642.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : GOVERNADOR VALADARES **Código: 100729** **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção do Centro de Reeducação compreende os seguintes serviços:
Abastecimento de água potável, Drenagem Pluvial, Esgotamento sanitário, Rede externa e interna de luz, Força e Telefonia, sistema de sonorização e segurança, Reservatório, Poço artesiano**Data de Início:** 14/06/88 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 80,16**Valor para Conclusão:** R\$3.977.000,00

Município : GOVERNADOR VALADARES **Código: 200527** **Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 17/05/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 91**Valor para Conclusão:**

Município : GOVERNADOR VALADARES **Código: 200926** **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Regional**Data de Início:** 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : GOVERNADOR VALADARES **Código: 200725** **Ministérios****Descrição da Obra:** Implantação e pavimentação da Rodovia BR-259/MG; extensão: 9,8 km.**Data de Início:** **Data de Paralisação:** 15/06/95 **Percentual Concluído:** 65**Valor para Conclusão:** R\$3.883.000,00

Município : GUAXUPE **Código: 200528** **Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 24/10/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1**Valor para Conclusão:**

Município : GUIDOVAL **Código: 200927** **Ministérios****Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município :	GUIRICEMA	Código:	200928	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	GURINHATA	Código:	200929	Ministérios
Descrição da Obra:	Posto de Saúde			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	IBIRITE	Código:	100100	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de Ambulatório de Alta Resolutividade - área 2.000m².			
Data de Início:	01/08/94	Data de Paralisação:	28/02/95	Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:	R\$200.000,00			

Município :	IBIRITE	Código:	100101	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Implantação de Rede Coletora de Esgoto (19,9 Km)			
Data de Início:	01/02/95	Data de Paralisação:	30/05/95	Percentual Concluído: 45
Valor para Conclusão:	R\$185.000,00			

Município :	IPATINGA	Código:	200930	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	ITACARAMBI	Código:	200931	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : ITAGUARA Código: 100036 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Duplicação da BR 381 - Fernão Dias

Data de Início: 01/06/94 Data de Paralisação: 01/12/94 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ITAOBIM Código: 100734 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação do sistema de esgotamento sanitário constando de elevatória de esgotos, 37.350 m de redes coletoras, 2.230 m de interceptores, 3.400 ligações prediais de esgotos sanitários.

Data de Início: 01/09/92 Data de Paralisação: 31/03/94 Percentual Concluído: 24

Valor para Conclusão: R\$1.800.000,00

Município : ITAPECERICA Código: 200932 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : ITATIAIUCU Código: 100037 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de escola de ensino fundamental

Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: 01/05/94 Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$150.000,00

Município : ITAUNA Código: 200529 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 25/08/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 95

Valor para Conclusão:

Município : ITAUNA Código: 200933 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Dr. Nogueira

Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município :	ITUETA	Código:	100029	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	BR 259			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:				

Município :	ITUIUTABA	Código:	100033	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Escola municipal de 1º grau denominada São Lourenço, zona rural área de 788,19m².			
Data de Início:	12/11/92	Data de Paralisação:	04/02/93	Percentual Concluído: 45,66
Valor para Conclusão:	R\$109.045,00			

Município :	ITUIUTABA	Código:	100034	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de uma escola de 1º grau na zona rural denominada mateirinha com área de 788, 19m².			
Data de Início:	11/11/92	Data de Paralisação:	03/02/93	Percentual Concluído: 38,05
Valor para Conclusão:	R\$122.400,00			

Município :	ITUIUTABA	Código:	100035	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Escola municipal Nadime Derze Jorge construída no bairro Jerônimo Mendonça com área de 1326,59m².			
Data de Início:	23/12/92	Data de Paralisação:	03/03/93	Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:	R\$265.911,69			

Município :	ITUIUTABA	Código:	200726	Ministérios
Descrição da Obra:	Implantação e pavimentação da Rodovia BR-154/MG; extensão: 35 km.			
Data de Início:		Data de Paralisação:	01/02/91	Percentual Concluído: 29,3
Valor para Conclusão:	R\$12.565.000,00			

Município :	ITUIUTABA	Código:	100714	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia: BR/154; Extensão: 35,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.			
Data de Início:	04/07/90	Data de Paralisação:	01/02/91	Percentual Concluído: 29,3
Valor para Conclusão:	R\$12.565.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : ITUIUTABA

Código: 200530 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/07/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 39

Valor para Conclusão:

Município : ITURAMA

Código: 200415 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : JANAUBA

Código: 200934 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : JANUARIA

Código: 100477 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Continuidade do asfaltamento da BR-135 de Januária a Montalvânia, divisa do Estado de Minas com o Estado da Bahia - Trecho total de 200 Kms - Trecho já asfaltado +/- 40 Kms.

Data de Início: 02/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

Município : JANUARIA

Código: 100478 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ponte sobre o Rio São Francisco - BR-135 - Entre as cidades de Pedras de Maria da Cruz e Januária vão aproximado de 1.020 mts.

Data de Início: 02/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão:

Município : JANUARIA

Código: 200724 Ministérios

Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-135/MG; extensão: 60 km.

Data de Início:

Data de Paralisação: 15/06/95

Percentual Concluído: 76

Valor para Conclusão: R\$8.008.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : JANUARIA Código: 100710 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia: BR/135; Extensão: 65,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.
Data de Início: 01/02/90 Data de Paralisação: 15/06/95 Percentual Concluído: 76
Valor para Conclusão: R\$8.008.000,00

Município : JEQUERI Código: 200935 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : JOAO PINHEIRO Código: 100884 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação e complementação dos sistemas de drenagem pluvial e esgotamento sanitário da sede do município - Fase I
Data de Início: 10/10/93 Data de Paralisação: 27/12/93 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : JUATUBA Código: 200936 Ministérios
Descrição da Obra: Centro de Saúde
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$190.000,00

Município : LAGOA DA PRATA Código: 100400 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução dos serviços e obras de construção de coletores de esgoto e interceptores junto ao Córrego Chico Silveira e construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), incluindo desenvolvimento dos projetos executados a partir do projeto básico.
Data de Início: 14/09/93 Data de Paralisação: 30/11/93 Percentual Concluído: 4,09
Valor para Conclusão: R\$3.521.620,00

Município : LAGOA FORMOSA Código: 200937 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**Município : **LAGOA GRANDE**

Código: 200938 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **LAJINHA**

Código: 100121 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Policlínica Municipal, com Pronto Socorro, Sala Cirúrgica, Gabinete Dentário, 30 leitos.

Data de Início: 08/02/94

Data de Paralisação: 26/09/94

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

R\$200.000,00

Município : **LAJINHA**

Código: 100122 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ginásio Poliesportivo, com área de 1.200 m², quadra poliesportiva, arquibancadas laterais, 04 banheiros, 02 lanchonetes, destinado a proporcionar aos jovens e adolescentes, a prática de diversos esportes.

Data de Início: 30/11/94

Data de Paralisação: 07/04/95

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

R\$150.000,00

Município : **LASSANCE**

Código: 200939 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **LEOPOLDINA**

Código: 200456 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : **LUZ**

Código: 200940 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : MACHADO**Código:** 200531 **Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 27/06/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 43**Valor para Conclusão:**

Município : MANGA**Código:** 100885 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Ponte sobre o Rio São Francisco, ligando Januária a Maria da Cruz.**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : MANGA**Código:** 100886 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Asfaltamento da BR-135 - Trecho ligando Januária a Montalvânia**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 15**Valor para Conclusão:**

Município : MANGA**Código:** 200941 **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** 01/01/91**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : MANHUACU**Código:** 200532 **Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 08/09/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 96**Valor para Conclusão:**

Município : MARILAC**Código:** 200942 **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** 01/01/90**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : MARIPA DE MINAS

Código: 200943 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 45

Valor para Conclusão: R\$80.000,00

Município : MATO VERDE

Código: 200944 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : MATOZINHOS

Código: 200533 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 07/11/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : MATOZINHOS

Código: 100039 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de um Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente CAIC 12 - localizado no bairro Bom Jesus numa área de 16.000 m².

Data de Início: 23/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

R\$2.000.000,00

Município : MATOZINHOS

Código: 100040 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Matozinhos - MG. Redes coletoras, interceptor, estações elevatórias, estação de tratamento de esgotos e linhas de recalque.

Data de Início: 01/02/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 64

Valor para Conclusão:

R\$885.000,00

Município : MATOZINHOS

Código: 100041 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Abertura e Encascalhamento da Estrada da Roseira - Matozinhos a BR 040.

Data de Início: 08/10/95

Data de Paralisação: 07/02/94

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : MESQUITA Código: 100027 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Saneamento básico, constituído de construção de 7.000m de rede de esgoto.
Data de Início: 01/12/94 Data de Paralisação: 30/04/95 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$501.000,00

Município : MONSENHOR PAULO Código: 200708 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-267/MG, extensão: 25 km.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$4.577.449,00

Município : MONSENHOR PAULO Código: 100591 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR.267, trecho Monsenhor Paulo -
Carvalhópolis, Lote 01. Extensão 25 km.
Data de Início: 01/11/93 Data de Paralisação: 01/12/93 Percentual Concluído: 85,5
Valor para Conclusão: R\$5.036.000,00

Município : MONSENHOR PAULO Código: 100716 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia: BR/267; Extensão: 25,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e
Pavimentação.
Data de Início: 01/11/93 Data de Paralisação: 01/12/93 Percentual Concluído: 0,3
Valor para Conclusão: R\$4.239.000,00

Município : MONTES CLAROS Código: 100738 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Córrego Melancias, constando de
46.000 m de redes coletoras e 3.410 ligações prediais de esgotos sanitários.
Data de Início: 01/08/94 Data de Paralisação: 31/07/95 Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão: R\$2.300.000,00

Município : MONTES CLAROS Código: 200945 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$660.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

14-nov-95

Unidade da Federação: **MG**Município : **MONTES CLAROS**

Código: 200946 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão:

Município : **MORRO DA GARÇA**

Código: 200947 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão: R\$10.000,00

Município : **NOVA LIMA**

Código: 200534 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/10/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 96

Valor para Conclusão:

Município : **OLIVEIRA**

Código: 100124 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Canalização e drenagem no córrego Maracanã.

Data de Início: 03/03/93

Data de Paralisação: 24/02/94

Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão:

R\$2.000.000,00

Município : **OLIVEIRA**

Código: 200161 Ministérios

Descrição da Obra: Implantação e Pavimentação do Acesso Norte a cidade de Oliveira/MG.

Data de Início: 26/06/94

Data de Paralisação: 01/04/95

Percentual Concluído: 42,87

Valor para Conclusão: R\$1.232.320,00

Município : **OLIVEIRA**

Código: 200163 Ministérios

Descrição da Obra: Serviços de Supervisão de Obras na BR-494/MG - trecho: Entroncamento BR-262/MG - Div. MG/SP, subtrecho Entr. BR-369/Oliveira-MG.

Data de Início: 20/09/94

Data de Paralisação: 01/01/95

Percentual Concluído: 9,99

Valor para Conclusão: R\$90.984,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : OURO PRETO

Código: 200948 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PALMOPOLIS

Código: 200949 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PALMOPOLIS

Código: 100401 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de um Hospital.

Data de Início: 01/02/94

Data de Paralisação: 01/08/94

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

R\$500.000,00

Município : PATOS DE MINAS

Código: 200950 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PATOS DE MINAS

Código: 200951 Ministérios

Descrição da Obra: Hemocentro

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PATOS DE MINAS

Código: 101060 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital regional Antônio Dias - HRAD de Patos de Minas com 130 leitos e área construída de 3.373 m².

Data de Início: 08/10/91

Data de Paralisação: 30/07/95

Percentual Concluído: 62

Valor para Conclusão:

R\$3.500.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : PATROCINIO Código: 100247 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Remodelação da Ferrovia RFPsa - trecho Macaúbas-Patrocínio
Data de Início: 02/01/88 Data de Paralisação: 31/12/90 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão:

Município : PAULISTAS Código: 200952 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : POMPEU Código: 200953 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Pompeu
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PORTEIRINHA Código: 200055 Ministérios
Descrição da Obra: Reabilitação e modernização do canal principal e rede secundário do perímetro irrigado de Gorutuba.
Data de Início: 29/08/94 Data de Paralisação: 01/07/95 Percentual Concluído: 56
Valor para Conclusão: R\$1.666.000,00

Município : POUSO ALEGRE Código: 100451 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Infra-Estrutura urbana/drenagem de águas pluviais, constando da execução de redes em tubos de concreto armado de diâmetros 800mm a 1500 mm para drenagem de águas pluviais.
Data de Início: 01/08/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 18,07
Valor para Conclusão: R\$4.424.000,00

Município : POUSO ALEGRE Código: 100452 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Estação de Tratamento de água para 450 l/s denominado Sistema Novo São João, constando das seguintes unidades localizadas: - Captação: - Estações Elevatórias de Águas Bruta e Tratada; - Unidade de Tratamento: Casa de Química; Subestação.
Data de Início: 01/08/93 Data de Paralisação: 31/01/94 Percentual Concluído: 10,38
Valor para Conclusão: R\$8.616.000,00

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : RIBEIRAO DAS NEVES

Código: 200955 **Ministérios**

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

Município : RIO NOVO

Código: 200536 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 04/11/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 1

Valor para Conclusão:

Município : RIO PARANAIBA

Código: 200416 **Ministérios**

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido: 50

Valor para Conclusão:

Município : RUBIM

Código: 100733 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de abastecimento de água constando de captação, reformas nas elevatórias, estação tratamento de água, reservatórios, redes de distribuição e ligações prediais de água.

Data de Início: 01/05/93

Data de Paralisação: 30/12/93

Percentual Concluido: 17

Valor para Conclusão:

R\$1.000.000,00

Município : **SAO GONCALO DO ABAETE**

Código: 100407 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Canalização do córrego São Gonçalo, na área urbana da cidade.

Data de Início: 01/08/93

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluido: 50

Valor para Conclusão:

R\$400.000,00

Município : **SAO GONCALO DO SAPUCAI**

Código: 200540 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/06/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 1

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : **SAO GOTARDO** **Código:** 100476 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Construção da Escola Municipal do Bairro Taquaril, com 08 (oito) salas de aula, biblioteca, laboratório, circulação, banheiros e desporto, num total de 980 m².
Data de Início: 29/12/94 **Data de Paralisação:** 02/03/95 **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão: R\$140.000,00

Município : **SAO JOAO NEPOMUCENO** **Código:** 200541 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 27/09/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 35
Valor para Conclusão:

Município : **SAO JOSE DO JACURI** **Código:** 200961 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : **SAO PEDRO DO SUACUI** **Código:** 100038 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Construção de prédio escolar municipal Pedro Caldeira Erant à rua Cândido Ferreira nº 50
Data de Início: 20/07/94 **Data de Paralisação:** 23/02/95 **Percentual Concluído:** 83
Valor para Conclusão: R\$35.000,00

Município : **SAO ROQUE DE MINAS** **Código:** 100887 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Construção da estrada do entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra no trecho: Vão dos Cândidos, Canastra, São Roque de Minas, Leites, Mata, São João Batista e Parida.
Data de Início: 01/01/86 **Data de Paralisação:** 31/12/87 **Percentual Concluído:** 90
Valor para Conclusão: R\$5.000.000,00

Município : **S.SEBASTIAO DO PARAISO** **Código:** 200542 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 27/09/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : SABARA

Código: 200537 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 19/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão:

Município : SABINOPOLIS

Código: 101034 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Eletrificação rural - Região Correntinho/São Domingos - 14,42 km de rede, dos quais foram feitos somente 4,00 km. Esta obra foi posta no Orçamento (1992), para vigorar em 93. Foi liberada no final de 93 a verba, sem atualização. Foi, pois, insuficiente.

Data de Início: 02/01/94

Data de Paralisação: 28/02/94

Percentual Concluído: 27,73

Valor para Conclusão:

R\$83.360,00

Município : SALINAS

Código: 100288 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR-251 - Trecho entre a BR-116 - Salinas.

Data de Início: 01/07/86

Data de Paralisação: 01/11/93

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$24.950.000,00

Município : SALINAS

Código: 200722 Ministérios

Descrição da Obra: Implantação, Pavimentação e Obras de Arte Especiais; rodovia: BR-251/MG; extensão: 58,2 km.

Data de Início:

Data de Paralisação: 01/12/94

Percentual Concluído: 98,7

Valor para Conclusão: R\$145.000,00

Município : SALINAS

Código: 100702 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia: BR/251; Extensão: 58,20 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação, Pavimentação e Obras de Arte Especiais.

Data de Início: 15/05/87

Data de Paralisação: 01/12/94

Percentual Concluído: 98,7

Valor para Conclusão:

R\$145.000,00

Município : SALINAS

Código: 200715 Ministérios

Descrição da Obra: Implantação, Pavimentação e Obras de Arte Especiais; rodovia: BR-251/MG; extensão: 55,7 km.

Data de Início:

Data de Paralisação: 01/11/94

Percentual Concluído: 45,3

Valor para Conclusão: R\$37.327.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município :	SALINAS	Código:	100703	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia: BR/251; Extensão: 55,70 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação, Pavimentação e Obras de Arte Especiais.			
Data de Início:	15/05/87	Data de Paralisação:	01/11/94	Percentual Concluído: 45,3
Valor para Conclusão:	R\$37.327.000,00			

Município :	SALINAS	Código:	200956	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Código:	200958	Ministérios
Descrição da Obra:	CENTRO DE SAÚDE			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 45	
Valor para Conclusão:	R\$112.940,00			

Município :	SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Código:	100413	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção do Centro Municipal de Saúde, com 02 blocos: administrativo e de atendimento, com 371,75m².			
Data de Início:	01/09/94	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído: 45
Valor para Conclusão:	R\$112.940,00			

Município :	SANTA CRUZ DO ESCALVADO	Código:	200957	Ministérios
Descrição da Obra:	Posto de Saúde			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 90	
Valor para Conclusão:	R\$5.000,00			

Município :	SANTA EFIGENIA DE MINAS	Código:	200705	Ministérios
Descrição da Obra:	Implantação e pavimentação da Rodovia BR-259/MG, extensão: 32 km. N° contrato: PJU-22.016/90.			
Data de Início:		Data de Paralisação:	15/06/95	Percentual Concluído: 10,9
Valor para Conclusão:	R\$9.633.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : SANTA EFIGENIA DE MINAS Código: 100707 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia: BR/259; Extensão: 32,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.
Data de Início: 02/04/90 Data de Paralisação: 15/06/95 Percentual Concluído: 10,9
Valor para Conclusão: R\$9.633.000,00

Município : SANTA LUZIA Código: 200538 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 22/10/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 77
Valor para Conclusão:

Município : SANTANA DO MANHUACU Código: 200959 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : SANTANA DOS MONTES Código: 200960 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : SANTO ANTONIO DO MONTE Código: 100467 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução de trechos de canalização dos córregos D. Bicota e D. Jovita.
Data de Início: 01/09/82 Data de Paralisação: 30/10/84 Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$3.000.000,00

Município : SANTO ANTONIO DO MONTE Código: 100468 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Reforma de prédios escolares em comunidades rurais do município.
Data de Início: 20/02/95 Data de Paralisação: 12/05/95 Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$30.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : SANTO ANTONIO DO MONTE Código: 100469 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção pré-escola de ensino fundamental em área urbana do município.
Data de Início: 12/07/94 Data de Paralisação: 10/11/94 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$180.000,00

Município : SANTOS DUMONT Código: 200539 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 17/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 67
Valor para Conclusão:

Município : SERICITA Código: 200962 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : SERRA DOS AIMORES Código: 101024 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Esgotamento sanitário urbano.
Data de Início: 01/09/93 Data de Paralisação: 30/11/93 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : SERRA DOS AIMORES Código: 200963 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Regional
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : SERRA DOS AIMORES Código: 101025 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Regional com 86 leitos.
Data de Início: 01/09/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 87
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : SERRA DOS AIMORES

Código: 200413 - Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : SERRO

Código: 200729 - Ministérios

Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-259/MG; extensão: 39,99 km.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 66,5

Valor para Conclusão: R\$4.681.000,00

Município : SERRO

Código: 100709 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia: BR/259; Extensão: 39,99 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.

Data de Início: 01/10/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 66,5

Valor para Conclusão:

R\$4.681.000,00

Município : SETE LAGOAS

Código: 100222 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Urbanização da Lagoa do Cercadinho

Data de Início: 01/09/93

Data de Paralisação: 10/06/94

Percentual Concluído: 16

Valor para Conclusão:

R\$789.820,00

Município : SETE LAGOAS

Código: 100305 - Estados / Municípios

Descrição da Obra: Canalização do Córrego Boqueirão

Data de Início: 01/10/91

Data de Paralisação: 26/11/94

Percentual Concluído: 25

Valor para Conclusão:

R\$4.753.055,00

Município : TAIÓBEIRAS

Código: 200964 - Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**Município : **TAPIRAI**

Código: 200965 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 37

Valor para Conclusão: R\$23.600,00

Município : **TEOFILO OTONI**

Código: 100735 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de abastecimento de água constando de captação de água, elevatória de água bruta, adutora de água bruta e estação de tratamento de água.

Data de Início: 02/01/93

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído: 65

Valor para Conclusão:

R\$600.000,00

Município : **TEOFILO OTONI**

Código: 200543 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 17/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 91

Valor para Conclusão:

Município : **TOCANTINS**

Código: 100248 Estados / Municípios

Descrição da Obra: CANALIZAÇÃO DO CORREGO BOA VISTA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO SANITÁRIO.

Data de Início: 01/09/93

Data de Paralisação: 31/01/94

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

R\$510.000,00

Município : **TOCANTINS**

Código: 100249 Estados / Municípios

Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

Data de Início: 01/12/94

Data de Paralisação: 31/05/95

Percentual Concluído: 65

Valor para Conclusão:

R\$60.000,00

Município : **TOCANTINS**

Código: 200966 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$170.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MG**

Município : TRES CORACOES **Código:** 101035 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de escola urbana no bairro Jardim Paraíso, na cidade de Três Corações.
Data de Início: 02/01/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 35
Valor para Conclusão: R\$341.320,00

Município : TRES PONTAS **Código:** 200414 Ministérios
Descrição da Obra: Escola de 1º grau, com percentual executado acima de 50% e recursos reapassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras.
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão:

Município : TRES PONTAS **Código:** 200967 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : TUPACIGUARA **Código:** 100723 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia: BR/452; Extensão: 59,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Restauração.
Data de Início: 01/06/94 **Data de Paralisação:** 15/06/95 **Percentual Concluído:** 17
Valor para Conclusão: R\$9.789.000,00

Município : TUPACIGUARA **Código:** 200709 Ministérios
Descrição da Obra: Restauração da Rodovia BR-452/MG, extensão: 59 km.
Data de Início: **Data de Paralisação:** 15/06/95 **Percentual Concluído:** 17
Valor para Conclusão: R\$9.789.000,00

Município : UBERABA **Código:** 200714 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-262/MG, extensão: 86 km.
Data de Início: **Data de Paralisação:** 01/05/90 **Percentual Concluído:** 88
Valor para Conclusão: R\$6.126.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MG

Município : UBERABA

Código: 100712 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia: BR/262; Extensão: 86,00 Km; Natureza dos Trabalhos: Implantação e Pavimentação.

Data de Início: 20/10/87

Data de Paralisação: 01/05/90

Percentual Concluído: 88

Valor para Conclusão:

R\$6.126.000,00

Município : UBERABA

Código: 200544 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 06/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : UNAI

Código: 100223 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação da BR-251, Brasília/Sul da Bahia, via Montes Claros-MG, (implantada, com asfaltamento, de Brasília a Unai, até o Km 27 da MG-188. Aberta, sem asfaltamento, do Km 27 da MG-188 até Km 32 da MG-181, em Bonfinópolis-MG. Da MG-181 até Ibiaí-MG, não

Data de Início: 02/01/76

Data de Paralisação: 31/12/78

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

Município : UNAI

Código: 200968 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital São João

Data de Início: 01/01/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : VARGINHA

Código: 100736 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário constando de redes coletoras, interceptores e ligações prediais de esgotos sanitários.

Data de Início: 01/10/93

Data de Paralisação: 31/01/94

Percentual Concluído: 15

Valor para Conclusão:

R\$4.500.000,00

Município : VARGINHA

Código: 200545 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 14/06/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 67

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: MG****Município : VESPASIANO****Código: 200969 : Ministérios****Descrição da Obra: Unidade de Saúde****Data de Início: 01/01/93****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : VIRGINIA****Código: 200970 : Ministérios****Descrição da Obra: Unidade de Saúde****Data de Início: 01/01/93****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 50****Valor para Conclusão:****Unidade da Federação: MG****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :****R\$729.062.943,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios :****176****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:****R\$523.441.579,69****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :****108**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : AGUA CLARA

Código: 100755 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital de Água Clara - Qd. G. Jd. Nova Água Clara, frente p/ Rua 14

Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão:

R\$161.944,00

Município : AGUA CLARA

Código: 200378 Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação Rodoviária da BR 262/ MS. Subtrecho km 107,0 - km 144,0

Data de Início: 07/11/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 4

Valor para Conclusão: R\$554.557,00

Município : AGUA CLARA

Código: 200370 Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação Rodoviária da BR-262/MS Subtrecho: km 144,0 - km 189,0

Data de Início: 01/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1,5

Valor para Conclusão: R\$945.680,00

Município : AGUA CLARA

Código: 200971 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : ALCINOPOLIS

Código: 100756 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital de Alcinópolis

Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 30/07/94 Percentual Concluído: 3

Valor para Conclusão:

R\$970.000,00

Município : ALCINOPOLIS

Código: 200972 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 2,41

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município :	ANASTACIO	Código:	100757	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Hospital de Anastácio				
Data de Início:	01/04/91	Data de Paralisação:	30/07/94	Percentual Concluído:	96
Valor para Conclusão:	R\$2.095,00				

Município :	ANASTACIO	Código:	200362	Ministérios	
Descrição da Obra:	Conservação da Rodovia BR-419/MS Subtrecho: Anastácio - Jardim				
Data de Início:	24/08/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	12
Valor para Conclusão:	R\$695.419,00				

Município :	ANTONIO JOAO	Código:	100011	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Unidade Escolar, com 1.100m² de área, localizada na Vila Penzo				
Data de Início:	05/01/94	Data de Paralisação:	20/04/94	Percentual Concluído:	15
Valor para Conclusão:	R\$440.000,00				

Município :	ANTONIO JOAO	Código:	200973	Ministérios	
Descrição da Obra:	Hospital Municipal				
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	20
Valor para Conclusão:					

Município :	ANTONIO JOAO	Código:	100012	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Hospital Municipal com capacidade para 14 leitos - 780m² de área				
Data de Início:	10/08/94	Data de Paralisação:	15/11/94	Percentual Concluído:	20
Valor para Conclusão:	R\$702.146,00				

Município :	APARECIDA DO TABOADO	Código:	100128	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Construção da ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná, com 3.600m de extensão.				
Data de Início:	15/10/90	Data de Paralisação:	30/01/95	Percentual Concluído:	60
Valor para Conclusão:	R\$150.000.000,00				

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : APARECIDA DO TABOADO

Código: 100758 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Hospital de Aparecida do Taboado

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 30/07/94

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

Município : APARECIDA DO TABOADO

Código: 200381 **Ministérios**

Descrição da Obra: Recuperação rodoviária da BR 158/MS. Subtrecho km 141,9 - km 195,4

Data de Início: 01/03/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 22

Valor para Conclusão: R\$605.275,00

Município: AOUIDAUANA

Código: 100754 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Hemocentro de Aquidauana - Rua Duque de Caxias S/N

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

Município : AOUIDAUANA

Código: 200513 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 01/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 1

Valor para Conclusão:

Município : AQUIDAUANA

Código: 100830 : Estados / Municipios

Descrição da Obra: CAIC - Centro de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

Município : BANDEIRANTES

Código: 100010 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Recapeamento da BR 163 - trecho que demanda do Município de Campo Grande à divisa do Município de Bandeirantes com Camapoã.

Data de Início: 01/08/94

Data de Paralisação: 30/12/94

Percentual Concluido: 60

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : BANDEIRANTES

Código: 100759 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 30/07/94

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BATAGUASSU

Código: 100760 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital de Bataguassu

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 30/07/94

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BATAGUASSU

Código: 200348 Ministérios

Descrição da Obra: Coordenação, Supervisão e Controle das Obras de Restauração da Ponte Maurício Joppert na BR-267/MS

Data de Início: 16/12/92

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído: 25

Valor para Conclusão: R\$174.275,00

Município : BATAGUASSU

Código: 100811 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR 267 - Trecho: Ponte Maurício Joppert - Obra: Supervisão

Data de Início: 01/12/92

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído: 25

Valor para Conclusão:

R\$174.275,00

Município : BATAGUASSU

Código: 200342 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração Rodoviária da BR-267/MS - Subtrecho Div. SP/MS - km 60

Data de Início: 28/07/92

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído: 18

Valor para Conclusão: R\$500.086,00

Município : BATAGUASSU

Código: 100812 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR 267 - Trecho: Divisa SP/MS - Km 60 - Obra: Recuperação

Data de Início: 14/08/92

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído: 18

Valor para Conclusão:

R\$500.086,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : BATAGUASSU Código: 200347 Ministérios
Descrição da Obra: Restauração da Ponte Maurício Joppert na BR-267/MS - Módulo 27 ao Módulo 52
Data de Início: 02/11/92 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 33
Valor para Conclusão: R\$1.083.263,00

Município : BATAGUASSU Código: 100813 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR 267 - Trecho: Ponte Maurício Joppert - Obra: Restauração
Data de Início: 01/12/92 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 33
Valor para Conclusão: R\$1.083.263,00

Município : BATAGUASSU Código: 200346 Ministérios
Descrição da Obra: Restauração da Ponte Maurício Joppert na BR-267/MS - Módulo 01 ao Módulo 26.
Data de Início: 23/11/92 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 31
Valor para Conclusão: R\$1.149.580,00

Município : BELA VISTA Código: 100099 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Bela Vista/MS, composto por:
sistema coletores com respectivos emissários, estações elevatórias e estações de
tratamento.
Data de Início: 02/01/91 Data de Paralisação: 31/05/93 Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão: R\$13.650.000,00

Município : BODOQUENA Código: 100761 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital de Bodoquena
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 30/07/94 Percentual Concluído: 95
Valor para Conclusão: R\$3.194,00

Município : BONITO Código: 100762 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 30/07/94 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$79.881,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : CAARAPO Código: 200360 Ministérios
Descrição da Obra: Conservação da Rodovia BR-163/MS-Subtrecho Entrº MS 156/280/378 (Caarapó)-
Entrº BR-463/MS (A) (Dourados)
Data de Início: 10/08/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 51
Valor para Conclusão: R\$144.374,00

Município : CAMAPUA Código: 200382 Ministérios
Descrição da Obra: Recuperação rodoviária da BR 060/MS. Subtrecho km 145,0 - km 242,3
Data de Início: 30/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 31
Valor para Conclusão: R\$1.394.379,00

Município : CAMPO GRANDE Código: 100763 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Sociedade Beneficente de Campo Grande
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 30/07/94 Percentual Concluído: 51
Valor para Conclusão: R\$1.400.844,00

Município : CAMPO GRANDE Código: 100764 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital do Câncer - Rua Cândido Mariano S/N
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 68
Valor para Conclusão: R\$146.874,00

Município : CAMPO GRANDE Código: 100765 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hemocentro de Campo Grande - Av. Senador Filinto Müller S/N
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : CAMPO GRANDE Código: 100766 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Odontológico da UFMS - End. Hospital Universitário
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : CAMPO GRANDE Código: 100767 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Regional de Campo Grande - Av. Marechal Deodoro S/N
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 81
Valor para Conclusão: R\$2.916.673,00

Município : CAMPO GRANDE Código: 100814 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Rodoviária - Área: 13.500,00 m²
Data de Início: 30/07/93 Data de Paralisação: 09/12/94 Percentual Concluído: 67,2
Valor para Conclusão: R\$2.300.000,00

Município : CAMPO GRANDE Código: 100828 Estados / Municípios
Descrição da Obra: CAIC MILITAR - Centro de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 43
Valor para Conclusão:

Município : CAMPO GRANDE Código: 100829 Estados / Municípios
Descrição da Obra: CAIC AERO RANCHO - Centro de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:

Município : CAMPO GRANDE Código: 100834 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Anel Viário de Campo Grande e acessos - extensão de 44 km
Data de Início: 01/06/90 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão: R\$21.000.000,00

Município : CAMPO GRANDE Código: 100835 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização de Córrego Sóter - trecho Av. Mato Grosso - Rua Furnas
Data de Início: 02/01/95 Data de Paralisação: 30/04/95 Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$3.500.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município: CAMPO GRANDE Código: 100836 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização do Córrego Segredo. Urbanização de Fundo de Vale - trecho rua Eça de Queirós e Av. Mascarenhas de Moraes
Data de Início: 02/01/93 Data de Paralisação: 30/11/94 Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão: R\$10.600.000,00

Município: CAMPO GRANDE Código: 100837 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Controle de Enchentes de Campo Grande - Canalização do Córrego Prosa - Urbanização de Fundo de Vale
Data de Início: 02/01/93 Data de Paralisação: 30/10/94 Percentual Concluído: 12
Valor para Conclusão: R\$7.658.000,00

Município: CAMPO GRANDE Código: 100838 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização do Córrego Anhanduí - Urbanização Fundo de Vale - trecho Av. Salgado Filho a Av. Manoel Costa Lima
Data de Início: 01/07/93 Data de Paralisação: 30/08/93 Percentual Concluído: 0,01
Valor para Conclusão: R\$17.000.000,00

Município: CAMPO GRANDE Código: 100839 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização do Córrego Bálsamo
Data de Início: 02/01/93 Data de Paralisação: 30/07/93 Percentual Concluído: 6
Valor para Conclusão: R\$2.250.000,00

Município: CAMPO GRANDE Código: 100840 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Drenagem do Córrego Cascudo
Data de Início: 02/01/93 Data de Paralisação: 31/01/94 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município: CAMPO GRANDE Código: 100841 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola Agrotécnica de Campo Grande
Data de Início: 01/12/91 Data de Paralisação: 30/05/94 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$720.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : CAMPO GRANDE

Código: 200094 - Ministérios

Descrição da Obra: Construção do Edifício - Sede da Superintendência Estadual em Mato Grosso do Sul - INSS

Data de Início: 29/12/89

Data de Paralisação: 30/04/92

Percentual Concluído: 74

Valor para Conclusão: R\$1.900.000,00

Município : CAMPO GRANDE

Código: 200357 - Ministérios

Descrição da Obra: Conservação da Rodovia BR-262/MS - Subtrecho - BR-060/163 (Campo Grande) - Entrº. MS 339/446/448 (Miranda).

Data de Início: 26/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 55

Valor para Conclusão: R\$427.299,00

Município : CAMPO GRANDE

Código: 200359 - Ministérios

Descrição da Obra: Conservação das Rodovias BR-060/MS, BR-163/MS e BR-262/MS Subtrechos: na BR-060/MS: Campo Grande/Sidrolândia; na BR-163/MS: Nova Alvorada/Campo Grande; na BR-262/MS: R. do Rio Pardo/Campo Grande.

Data de Início: 10/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão: R\$611.972,00

Município : CAMPO GRANDE

Código: 200361 - Ministérios

Descrição da Obra: Conservação das Rodovias - BR-060/MS e 163/MS - Subtrecho na BR-060/MS: Paraíso - Capim Verde - na BR-163/MS: Campo Grande - Capim Verde

Data de Início: 24/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 29

Valor para Conclusão: R\$564.416,00

Município : CAMPO GRANDE

Código: 200377 - Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação rodoviária da BR 163/ MS. Subtrecho km 415,0 - km 504,0

Data de Início: 22/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 71

Valor para Conclusão: R\$352.545,00

Município : CAMPO GRANDE

Código: 200380 - Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação Rodovia da Br 262/MS. Subtrecho km 237,5 - km 318,5

Data de Início: 22/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 61

Valor para Conclusão: R\$441.875,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : CASSILANDIA

Código: 200351 Ministérios

Descrição da Obra: Conservação rodoviária na BR-158/MS - Subtrecho: Div. GO/MS (Cassilândia) - Entr. MS 444 (Selviria)

Data de Início: 26/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 44

Valor para Conclusão: R\$302.998,00

Município : CHAPADAO DO SUL

Código: 100279 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Drenagem de águas pluviais na área urbana, totalizando 3.680 metros lineares de galerias pluviais com 122 bocas de lobo com abertura dupla e 22 poços de visita de alvenaria para águas pluviais.

Data de Início: 01/05/93

Data de Paralisação: 30/08/93

Percentual Concluído: 15

Valor para Conclusão:

R\$280.000,00

Município : CHAPADAO DO SUL

Código: 200369 Ministérios

Descrição da Obra: IMP, PAV, OAE, da Rodovia BR 060/MS Subtrecho: Chapadão do Sul - Paraíso

Data de Início: 19/07/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$20.128.641,00

Município : CHAPADAO DO SUL

Código: 100815 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR 060 - Subtrecho: Paraíso - Chapadão do Sul - Extensão 51 Km. Obra: Pavimentação asfáltica compreendendo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente e obras complementares

Data de Início: 08/04/92

Data de Paralisação: 01/12/94

Percentual Concluído: 57

Valor para Conclusão:

R\$6.200.000,00

Município : CORGUINHO

Código: 100770 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão:

R\$8.000,00

Município : CORONEL SAPUCAIA

Código: 200976 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Código: 100771 **Estados / Municipios**

R\$29.520,00

Código: 100773 **Estados / Municípios**

Valor para Conclusão:

Código: 200366 **Ministérios**

Valor para Conclusão: R\$2.831.675,00

Código: 100817 **Estados / Municipios**

R\$4.850.000,00

Código: 100818 **Estados / Municipios**

R\$8.300.000,00

Código: 200515 **Ministérios**

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS/MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : CORUMBA

Código: 100831 Estados / Municípios

Descrição da Obra: CAIC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 15

Valor para Conclusão:

Município : CORUMBA

Código: 200367 Ministérios

Descrição da Obra: Pavimentação Asfáltica da BR-262/MS - Subtrecho: Fim da PAV - Rio Paraguai

Data de Início: 02/10/92

Data de Paralisação: 30/11/93

Percentual Concluído: 14

Valor para Conclusão: R\$7.539.682,00

Município : COXIM

Código: 100774 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Regional - Capacidade: 86 leitos - Área: 4.312,00 m²

Data de Início: 19/11/91

Data de Paralisação: 07/05/92

Percentual Concluído: 0,5

Valor para Conclusão:

R\$5.501.000,00

Município : COXIM

Código: 100775 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hemocentro Regional de Coxim - Rua Antônio Rief, S/N

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : COXIM

Código: 200345 Ministérios

Descrição da Obra: Complementação Serviços Emergenciais de Recuperação da BR-163/MD - Subtrecho: km 610,0 - km 668,5

Data de Início: 29/11/91

Data de Paralisação: 17/08/92

Percentual Concluído: 22

Valor para Conclusão: R\$493.438,00

Município : COXIM

Código: 100819 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR 163 - Trecho: Rio Verde - Coxim - Obra: Recuperação

Data de Início: 05/12/91

Data de Paralisação: 17/08/92

Percentual Concluído: 22

Valor para Conclusão:

R\$493.438,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS**

Unidade da Federação: MS

Município : DOIS IRMAOS DO BURITI

Código: 100776 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital de Dois Irmãos do Buriti - Rua Tomás Trindade S/N

Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 78

Valor para Conclusão: R\$18.832,00

Município : DOURADINA

Código: 100777 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital de Douradina - Rua São Domingos, Esquina c/ Rua São José

Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/95 Percentual Concluído: 94

Valor para Conclusão: R\$3.479,00

Município : DOURADOS

Código: 100778 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Maternidade de Dourados

Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 94

Valor para Conclusão: R\$88.575,00

Município : DOURADOS

Código: 100779 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Santa Casa de Dourados - Rua Toshinoza Katayama n° 949

Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão: R\$542.029,00

Município : DOURADOS

Código: 100820 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção da Penitenciária - Capacidade: 600 detentos - Área: 13.150,00 m²

Data de Início: 21/03/88 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 68

Valor para Conclusão: R\$6.035.000,00

Município : DOURADOS

Código: 200344 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração Rodoviária da BR-163/262/MS - Subtrecho Dourados - Rio Laranja Doce

Data de Início: 20/10/92 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 47

Valor para Conclusão: R\$226.555,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município :	DOURADOS	Código:	100821	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR 163 - Trecho: Dourados - Rio Laranja Doce - Obra: Recuperação			
Data de Início:	24/10/92	Data de Paralisação:	31/12/92	Percentual Concluído: 46
Valor para Conclusão:	R\$226.555,00			

Município :	DOURADOS	Código:	200516	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	17/09/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 72
Valor para Conclusão:				

Município :	DOURADOS	Código:	100832	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CAIC			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 85
Valor para Conclusão:				

Município :	DOURADOS	Código:	200355	Ministérios
Descrição da Obra:	Conservação das Rodovias BR-163/MS, BR-376/MS e BR-463/MS Subtrechos: na BR-163: Rio Laranja Doce/Dourados na BR-376: Dourados - N. Andradina - na BR-463: Dourados - Ponta Porã			
Data de Início:	26/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 55
Valor para Conclusão:	R\$371.049,00			

Município :	FATIMA DO SUL	Código:	200517	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	04/10/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:				

Município :	FATIMA DO SUL	Código:	100833	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CAIC			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : GLORIA DE DOURADOS**Código:** 200372 Ministérios**Descrição da Obra:** Supervisão, Coordenação e Controle das obras de restauração da Br 376/MS.
Subtrecho km 54,0 - km 174,7**Data de Início:** 07/11/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 14**Valor para Conclusão:** R\$436.287,00**Município :** GLORIA DE DOURADOS**Código:** 200373 Ministérios**Descrição da Obra:** Restauração rodovia da BR 376/MS. Subtrecho km 54,0 - km 118,0**Data de Início:** 07/11/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 47**Valor para Conclusão:** R\$1.185.275,00**Município :** GUIA LOPES DA LAGUNA**Código:** 200977 Ministérios**Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** 01/01/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 59**Valor para Conclusão:****Município :** GUIA LOPES DA LAGUNA**Código:** 100780 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** 01/04/91**Data de Paralisação:** 31/07/94**Percentual Concluído:** 63**Valor para Conclusão:**

R\$213.692,00

Município : INOCENCIA**Código:** 100781 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Hospital de Inocência - Av. Alexandre Batista Garcia, Nº 44**Data de Início:** 01/04/91**Data de Paralisação:** 31/07/94**Percentual Concluído:** 40**Valor para Conclusão:**

R\$55.250,00

Município : ITAPORA**Código:** 100782 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Hospital de Itaporã - Rua José T. Silva, Esquina c/ Rua Antônio João**Data de Início:** 01/04/91**Data de Paralisação:** 31/07/94**Percentual Concluído:** 97**Valor para Conclusão:**

R\$1.397,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : IVINHEMA

Código: 200374 **Ministérios**

Descrição da Obra: Restauração Rodoviária da BR 376/MS, Subtrecho Km 118,0 - km 174,7

Data de Início: 07/11/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 39

Valor para Conclusão: R\$1.787.105,00

Município : JAPORA

Código: 100250 Estados / Municipios

Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS, NUM TRECHO DE 15 KM, SENDO PARTE INTEGRANTE A RODOVIA MS-386, OBJETIVANDO INSERIR JAPORÃ NO CONTEXTO ESTADUAL E MELHORAR O NÍVEL DE BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.

Data de Início: 08/09/93 **Data de Paralisação:** 01/01/94 **Percentual Concluído:** 10

Valor para Conclusão: R\$1.800.000,00

Município : JAPORA

Código: 100783 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Hospital Municipal de Japora - Av. Deputado Fernando Saldanha, S/N

Data de Início: 01/04/91 **Data de Paralisação:** 31/07/94 **Percentual Concluído:** 99

Valor para Conclusão:

Município : JARAGUARI

Código: 100785 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Hospital de Jaraguari

Data de Início: 01/04/91 **Data de Paralisação:** 31/07/94 **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : JARDIM

Código: 100784 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hemocentro - Rua Paraná S/N

Data de Início: 01/04/91 **Data de Paralisação:** 31/07/94 **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : JARDIM

Código: 100822 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Rodovia BR 267 - Subtrecho: Jardim - Porto Murтинho, Extensão 173 Km, Obra: pavimentação asfáltica compreendendo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente, obras de arte especiais e obras complementares

Data de Início: 04/05/92 **Data de Paralisação:** 01/09/94 **Percentual Concluído:** 58

Valor para Conclusão: R\$44.500.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : JARDIM

Código: 200365 Ministérios

Descrição da Obra: Pavimentação Asfáltica da BR-060/MS - Subtrecho: Jardim - Bela Vista

Data de Início: 19/07/90 Data de Paralisação: 30/09/93 Percentual Concluído: 12

Valor para Conclusão: R\$13.788.137,00

Município : JARDIM

Código: 100823 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR 060 - Subtrecho: Jardim - Bela Vista, Extensão 84 Km, Obra: pavimentação asfáltica compreendendo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente, obras de arte especiais e obras complementares

Data de Início: 01/08/90 Data de Paralisação: 01/08/94 Percentual Concluído: 89

Valor para Conclusão: R\$2.900.000,00

Município : JARDIM

Código: 200363 Ministérios

Descrição da Obra: Pavimentação Asfáltica da BR-267/MS Subtrecho: Entr. MS /178 - Rio Perdido

Data de Início: 23/01/92 Data de Paralisação: 30/11/93 Percentual Concluído: 8

Valor para Conclusão: R\$23.368.918,00

Município : LAGUNA CARAPA

Código: 200978 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão: R\$534.801,00

Município : LAGUNA CARAPA

Código: 100308 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma Unidade Mista de Saúde

Data de Início: 27/12/93 Data de Paralisação: 06/02/94 Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão: R\$760.000,00

Município : LAGUNA CARAPA

Código: 100309 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Asfaltamento da estrada entre a BR 163 e Laguna Carapá (PTR 050), concluído 900m e o restante a concluir.

Data de Início: 01/10/93 Data de Paralisação: 15/11/93 Percentual Concluído: 0,5

Valor para Conclusão: R\$4.840.000,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : LAGUNA CARAPA

Código: 100786 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Hospital Municipal - Rua: Álvaro Martins dos Santos S/N

Data de Início: 01/04/91 **Data de Paralisação:** 31/07/94 **Percentual Concluído:** 6

Valor para Conclusão: R\$1.487.271,00

Município : MIRANDA

Código: 200518 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 25/08/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 67

Valor para Conclusão:

Município : MIRANDA

Código: 100009 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: CAIC

Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** 30/12/94 **Percentual Concluído:** 68

Valor para Conclusão:

Município : MIRANDA

Código: 100787 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Hospital de Miranda - Rua 7 de setembro, nº 925

Data de Início: 01/04/91 **Data de Paralisação:** 31/07/94 **Percentual Concluído:** 43

Valor para Conclusão: R\$179.777,00

Município : MUNDO NOVO

Código: 100788 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Hemocentro de Mundo Novo - Av. Campo Grande, S/N

Data de Início: 01/04/91 **Data de Páralisação:** 31/07/94 **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : MUNDO NOVO

Código: 200358 **Ministérios**

Descrição da Obra: Conservação da Rodovia BR-163/MS-Subtrecho Div.PR/MS - Entrº. MS 156/280/378 (Caarapó)

Data de Início: 29/04/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 98

Valor para Conclusão: R\$12.687,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : MUNDO NOVO

Código: 200375 Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação Rodoviária da BR 163/MS, Subtrecho km zero - km 124,01

Data de Início: 22/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 74

Valor para Conclusão: R\$371.653,00

Município : NAVIRAI

Código: 100789 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hemocentro de Naviraí - Av. Amélia Jukuda Nº 776

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : NIOAQUE

Código: 100790 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Apamin

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão:

R\$75.430,00

Município : NOVA ALVORADA DO SUL

Código: 100793 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul - BR. 165, Km 202

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído: 3

Valor para Conclusão:

R\$1.455.000,00

Município : NOVA ALVORADA DO SUL

Código: 200353 Ministérios

Descrição da Obra: Conservação da BR-267/MS - Subtrecho: Divisa SP/MS

Data de Início: 26/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 56

Valor para Conclusão: R\$327.505,00

Município : NOVA ALVORADA DO SUL

Código: 200356 Ministérios

Descrição da Obra: Conservação das Rodov. BR-163/MS e BR-267/MS - Subtrechos: na BR-163:Rio Laranja Doce/Nova Alvorada na BR-267: Rio Brilhante - Entrº. BR-060 (A)/419(A).

Data de Início: 26/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 49

Valor para Conclusão: R\$341.763,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município :	NOVA ANDRADINA	Código:	100791	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Regional			
Data de Início:	01/04/91	Data de Paralisação:	31/07/94	Percentual Concluído: 34
Valor para Conclusão:	R\$1.366.900,00			

Município :	NOVA ANDRADINA	Código:	100792	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hemocentro - Av. Eurico Soares Andrade, S/N			
Data de Início:	01/04/91	Data de Paralisação:	31/07/94	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	NOVA ANDRADINA	Código:	200467	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município :	NOVO HORIZONTE DO SUL	Código:	100794	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital de Novo Horizonte do Sul			
Data de Início:	01/04/91	Data de Paralisação:	31/07/94	Percentual Concluído: 83
Valor para Conclusão:	R\$35.628,00			

Município :	PARANAIBA	Código:	100795	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Regional de Paranaíba - Av. Durval Rodrigues, S/N			
Data de Início:	01/04/91	Data de Paralisação:	31/07/94	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	PARANAIBA	Código:	100824	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR 497 - Subtrecho: Paranaíba - Porto Alencastro, Extensão 18 Km, Obra: pavimentação asfáltica compreendendo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente e obras complementares			
Data de Início:	01/02/94	Data de Paralisação:	01/12/94	Percentual Concluído: 33
Valor para Conclusão:	R\$1.300.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : PARANAIBA Código: 200979 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão:

Município : PEDRO GOMES Código: 100796 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital de Pedro Gomes - Rua Nicanor Moura, Esq. c/ Travessa "A"
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 95
Valor para Conclusão: R\$8.223,00

Município : PONTA PORA Código: 100797 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Regional de Ponta Porã - Rua Baltazar Saldanha, Nº 1501
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PONTA PORA Código: 100799 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hemocentro - Rua 7 de setembro S/N
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PONTA PORA Código: 200371 Ministérios
Descrição da Obra: Recuperação Rodoviária da BR-463/MS Subtrecho: km 45,0 - km 121,2
Data de Início: 22/02/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão: R\$1.492.408,00

Município : PORTO MURTINHO Código: 200364 Ministérios
Descrição da Obra: Pavimentação Asfáltica da BR-267/MS - Subtrecho: Porto Murtinho - Rio Perdido
Data de Início: 23/01/92 Data de Paralisação: 30/11/93 Percentual Concluído: 4
Valor para Conclusão: R\$25.241.889,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : RIBAS DO RIO PARDO Código: 200379 Ministérios
Descrição da Obra: Recuperação Rodoviária da BR 262/ MS. Subtrecho km 189,0 - km 237,5
Data de Início: 07/11/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão: R\$516.464,00

Município : RIO BRILHANTE Código: 100800 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital de Rio Brilhante - Rua Lourival Barbosa Nº 1396
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : RIO BRILHANTE Código: 200343 Ministérios
Descrição da Obra: Recuperação Rodoviária da BR-267/MS - Subtrecho Rio Brilhante - Maracajú
Data de Início: 28/07/92 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$363.606,00

Município : RIO BRILHANTE Código: 100825 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR 267 - Trecho: Rio Brilhante - Maracaju - Obra: Recuperação
Data de Início: 05/08/92 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$363.606,00

Município : RIO NEGRO Código: 100801 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital de Rio Negro - Rua Boa Vista S/N
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 73
Valor para Conclusão: R\$84.964,00

Município : SAO GABRIEL DO OESTE Código: 100803 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital de São Gabriel D'Oeste - Loteamento Capão - Av. São Francisco
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão: R\$161.604,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **MS****Município : SAO GABRIEL DO OESTE****Código: 200352** Ministérios**Descrição da Obra:** Conservação da BR-163/MS - Subtrecho Entrº BR-060 (B) (Capim Verde) - Div. MS/MT**Data de Início:** 26/01/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 65**Valor para Conclusão:** R\$134.625,00**Município : SAO GABRIEL DO OESTE****Código: 200980** Ministérios**Descrição da Obra:** Hospital de Emergência**Data de Início:** 01/01/91**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 70**Valor para Conclusão:****Município : SANTA RITA DO PARDO****Código: 100224** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Unidade escolar com 06 (seis) salas de aula.**Data de Início:** 05/12/91**Data de Paralisação:** 05/02/92**Percentual Concluído:** 38,59**Valor para Conclusão:**

R\$269.714,00

Município : SANTA RITA DO PARDO**Código: 100802** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Hospital de Santa Rita do Pardo - Rua Prudente de Moraes, Nº 1.148**Data de Início:** 01/04/91**Data de Paralisação:** 31/07/94**Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : SELVIRIA****Código: 100804** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Hospital de Selviria - Rua J. da Costa Lima, Esquina c/ Rua Prudente de Moraes**Data de Início:** 01/04/91**Data de Paralisação:** 31/07/94**Percentual Concluído:** 94**Valor para Conclusão:**

R\$2.819,00

Município : SIDROLANDIA**Código: 200368** Ministérios**Descrição da Obra:** Pavimentação Asfáltica da BR-060/MS Subtrecho: Entr. MS 162 - Entr. BR 419**Data de Início:** 25/09/92**Data de Paralisação:** 30/11/93**Percentual Concluído:** 5**Valor para Conclusão:** R\$19.069.126,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município :	SIDROLANDIA	Código:	100826	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR 060 - Subtrecho: Sidrolândia - Nioaque, Extensão 107 Km, Obra: pavimentação asfáltica compreendendo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente, obras de arte especiais e obras complementares			
Data de Início:	01/07/93	Data de Paralisação:	01/12/93	Percentual Concluído: 7
Valor para Conclusão:	R\$24.900.000,00			
Município :	SIDROLANDIA	Código:	200354	Ministérios
Descrição da Obra:	Conservação das Rodov. BR-060/MS e BR-267/MS Subtr. BR-060: Sidrolândia - Nioaque - Jardim - Bela Vista - na BR 267: Jardim - Porto Murtinho			
Data de Início:	26/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 54
Valor para Conclusão:	R\$286.431,00			
Município :	SONORA	Código:	200981	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:				
Município :	SONORA	Código:	100805	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital de Sonora			
Data de Início:	01/04/91	Data de Paralisação:	31/07/94	Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:	R\$300.000,00			
Município :	TACURU	Código:	100806	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal de Tacuru - Rua Varcelina Lima Alvarenga S/N			
Data de Início:	01/04/91	Data de Paralisação:	31/07/94	Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão:	R\$14.869,00			
Município :	TAQUARUSSU	Código:	200982	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:				

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : TAQUARUSSU Código: 100807 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Municipal de Taquarussu - Rua Nair Rodrigues Nogueira, S/N
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 51
Valor para Conclusão: R\$220.745,00

Município : TERENOS Código: 200349 Ministérios
Descrição da Obra: Restauração Rodoviária da BR-262/MS - Subtrecho Campo Grande - Entr. MS 162
Data de Início: 15/12/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$3.634.693,00

Município : TERENOS Código: 100827 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR 262 - Trecho: Campo Grande - Entr. MS 162 - Obra: Restauração
Data de Início: 23/12/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão: R\$3.634.693,00

Município : TERENOS Código: 200341 Ministérios
Descrição da Obra: Eliminação de Segmentos Críticos na BR-262/MS - Subtrecho km 391,0 - km 405,0
Data de Início: 08/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 72
Valor para Conclusão: R\$110.879,00

Município : TRES LAGOAS Código: 100808 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hemocentro de Três Lagoas - Av. Olinto Mancini Nº 1926
Data de Início: 01/04/91 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão: R\$7.248,00

Município : TRES LAGOAS Código: 200350 Ministérios
Descrição da Obra: Conservação da BR-262/MS - Subtrecho Div. SP/MS - Subtrecho: Div. SP/MS - Ribas do Rio Pardo
Data de Início: 23/06/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 73
Valor para Conclusão: R\$291.090,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MS

Município : TRES LAGOAS

Código: 200376 Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação Rodoviária de BR 262/MS. Subtrecho km 2,0 - km 70,0

Data de Início: 22/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 17

Valor para Conclusão: R\$754.582,00

Município : TRES LAGOAS

Código: 200383 Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação rodoviária da BR 262/ MS. Subtrecho km 70,0 - km 107,0

Data de Início: 01/03/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 3

Valor para Conclusão: R\$684.971,00

Município : VICENTINA

Código: 100809 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Unidade Mista de Vicentina - Rua Santa Carina, S/N

Data de Início: 01/04/91

Data de Paralisação: 31/07/94

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Unidade da Federação: MS

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :

R\$138.173.928,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios :

64

Total dos recursos para conclusão, informado pelos
Estados/Municípios:

R\$364.941.529,00

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :

95

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : ALTO GARCAS

Código: 100862 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: NÚCLEO HABITACIONAL DAS MANGUEIRAS COM 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PADRÃO ÚNICO COM 20,46 M².

Data de Início: 01/01/92 **Data de Paralisação:** 15/07/94 **Percentual Concluído:** 96,16

Valor para Conclusão: R\$11.461,00

Município : ALTO PARAGUAI

Código: 200983 **Ministérios**

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : ARAGUAIANA

Código: 100426 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Escola Municipal urbana (Centro Integrado Municipal de Ensino).

Data de Início: 10/08/94 **Data de Paralisação:** 23/12/94 **Percentual Concluído:** 20

Valor para Conclusão: R\$1.200.000,00

Município : ARAPUTANGA

Código: 200984 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : BARAO DE MELGACO

Código: 200408 **Ministérios**

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído: 50**

Valor para Conclusão:

Município : BARRA DO BUGRES

Código: 200985 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município :	BARRA DO GARCAS	Código:	100855	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	SE Barra do Garças - vão para Nova Xavantina 138 kv.				
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído:	60,93
Valor para Conclusão:	R\$193.000,00				

Município : BARRA DO GARCAS **Código:** 200405 **Ministérios**

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50

Valor para Conclusão:

Município :	CACERES	Código:	200279	Ministérios
Descrição da Obra:	Serviços de Projeto, Pavimentação, melhoramentos, obras complementares, drenagem e obras de arte correntes e especiais na BR-070/MT; Trecho Cáceres-San Matias (inclusive Travessia de Cáceres)			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$29.495.416,00			

Município : CACERES **Código:** 100328 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Pav. BR 070 - Cãceres - San Matias.
Data de Início: 03/04/89 **Data de Paralisação:** 31/12/91 **Percentual Concluído:** 30
Valor para Conclusão: R\$21.300.000,00

Município :	CACERES	Código:	100329	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Travessia da Cidade - BR 070			
Data de Início:	20/07/88	Data de Paralisação:	02/08/89	Percentual Concluído: 22
Valor para Conclusão:	R\$816.160,00			

Município : CACERES **Código:** 200986 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Regional
Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 70
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município :	CACERES	Código:	100330	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção do Hospital Regional - com 100 leitos			
Data de Início:	17/07/89	Data de Paralisação:	26/02/94	Percentual Concluído: 37,98
Valor para Conclusão:	R\$6.047.824,00			

Município :	CACERES	Código:	100331	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Implantação do sistema de esgoto sanitário da cidade de Cáceres.			
Data de Início:	26/09/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 58,22
Valor para Conclusão:	R\$820.608,00			

Município :	CACERES	Código:	100332	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	A obra compreende: estradas de acesso: terraplenagem, pavimentação e drenagem; obras de atracação; prédios.			
Data de Início:	01/10/89	Data de Paralisação:	30/06/90	Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão:	R\$8.745.800,00			

Município :	CACERES	Código:	200508	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	27/09/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:				

Município :	CACERES	Código:	100333	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CAIC 12 - PF			
Data de Início:	26/08/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$2.800.000,00			

Município :	CACERES	Código:	100846	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Execução de Terraplenagem e Revestimento Primário; Rodovia BR-070; Trecho: Cáceres-Divisa Brasil/Bolívia (San Matias) Extensão: 86,0 Km.			
Data de Início:	03/04/89	Data de Paralisação:	02/01/92	Percentual Concluído: 54
Valor para Conclusão:	R\$10.300.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município : CAMPO NOVO DO PARECIS **Código:** 200409 **Ministérios**
Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão:

Município : CANARANA **Código:** 100853 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Execução de Terraplenagem e Pavimentação asfáltica; Rodovia BR-158 Trecho: entrº MT-326 (p/Canarana) - córrego turvo Extensão: 52,0 Km.
Data de Início: 02/10/89 **Data de Paralisação:** 31/10/93 **Percentual Concluído:** 17
Valor para Conclusão: R\$12.990.000,00

Município : COLIDER **Código:** 100098 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Construção do Centro Escolar e Cultural de Colider, com área de 3.299,48 m²
Data de Início: 13/12/93 **Data de Paralisação:** 07/06/94 **Percentual Concluído:** 3
Valor para Conclusão: R\$695.000,00

Município : COLIDER **Código:** 200095 **Ministérios**
Descrição da Obra: Construção de Posto de Benefício com 371,16m²
Data de Início: 12/04/88 **Data de Paralisação:** 31/12/89 **Percentual Concluído:** 80
Valor para Conclusão: R\$204.050,00

Município : COMODORO **Código:** 200987 **Ministérios**
Descrição da Obra: Centro de Saúde
Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : CONFRESA **Código:** 100213 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Melhoria e implantação do trecho Alô Brasil/CONFRESA com 185 Km.
Data de Início: 01/06/87 **Data de Paralisação:** 31/12/93 **Percentual Concluído:** 82
Valor para Conclusão: R\$3.700.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município :	CONFRESA	Código:	100214	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Unidade Mista de Saúde com 20 leitos			
Data de Início:	20/11/93	Data de Paralisação:	30/04/94	Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:	R\$500.000,00			

Município :	CONFRESA	Código:	100215	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Melhoria e implantação do trecho CONFRESA/Ribeirão Santana com 133 Km de extensão.			
Data de Início:	01/02/85	Data de Paralisação:	31/12/93	Percentual Concluído: 88
Valor para Conclusão:	R\$1.500.000,00			

Município :	CONFRESA	Código:	100246	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	MELHORIA E IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ENTRONCAMENTO BR158/SANTA TEREZINHA NO ESTADO DO MATO GROSSO, COM 120 KM DE EXTENSÃO.			
Data de Início:	01/02/85	Data de Paralisação:	30/10/93	Percentual Concluído: 34
Valor para Conclusão:	R\$4.600.000,00			

Município :	CUIABA	Código:	100842	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário de Cuiabá.			
Data de Início:	01/09/87	Data de Paralisação:	30/03/90	Percentual Concluído: 42
Valor para Conclusão:	R\$25.000.000,00			

Município :	CUIABA	Código:	100866	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	MELHORIA DE VIAS URBANAS (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES).			
Data de Início:	01/09/93	Data de Paralisação:	28/02/95	Percentual Concluído: 6,96
Valor para Conclusão:	R\$8.773.518,00			

Município :	CUIABA	Código:	100867	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Expansão do sistema de esgoto sanitário do bairro Pedregal			
Data de Início:	01/04/94	Data de Paralisação:	31/05/94	Percentual Concluído: 57,27
Valor para Conclusão:	R\$68.481,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município :	CUIABA	Código:	100868	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Infra-estrutura dos residenciais São Carlos e Santa Inês e construção de Centro Comunitário e área de lazer.				
Data de Início:	01/10/93	Data de Paralisação:	31/05/94	Percentual Concluído:	83,52
Valor para Conclusão:	R\$423.739,00				

Município :	CUIABA	Código:	100869	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Pavimentação, drenagem e obras complementares na Região Cidade Alta.				
Data de Início:	02/01/94	Data de Paralisação:	30/09/95	Percentual Concluído:	65
Valor para Conclusão:	R\$4.500.000,00				

Município :	CUIABA	Código:	100870	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Reforma do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá				
Data de Início:	01/07/91	Data de Paralisação:	30/06/92	Percentual Concluído:	30
Valor para Conclusão:	R\$321.000,00				

Município :	CUIABA	Código:	100871	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Desassoreamento do Rio Cuiabá				
Data de Início:	01/10/92	Data de Paralisação:	31/01/94	Percentual Concluído:	4,92
Valor para Conclusão:	R\$7.223.777,00				

Município :	CUIABA	Código:	100872	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Complementação da canalização do Córrego Geri				
Data de Início:	01/08/92	Data de Paralisação:	30/10/93	Percentual Concluído:	75,63
Valor para Conclusão:	R\$301.524,00				

Município :	CUIABA	Código:	100873	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Pavimentação, drenagem e obras complementares em bairros diversos.				
Data de Início:	01/04/92	Data de Paralisação:	31/03/94	Percentual Concluído:	8,55
Valor para Conclusão:	R\$6.633.754,00				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município : CUIABA Código: 100874 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização dos Córregos Três Barras, Moinho e Gumitá
Data de Início: 01/07/92 Data de Paralisação: 31/03/94 Percentual Concluído: 7,33
Valor para Conclusão: R\$17.123.630,00

Município : CUIABA Código: 100875 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização dos Córregos Barbado, São Gonçalo e Quarta-Feira.
Data de Início: 01/08/92 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 34,09
Valor para Conclusão: R\$12.278.259,00

Município : CUIABA Código: 200278 Ministérios
Descrição da Obra: Execução de Obras de terraplanagem, pavimentação, obras de arte corrente e especiais e serviços complementares (duplicação); Rodovias BR-070/163/364/MT; Trecho Entrº MT-040 - Distrito Industrial; Extensão: 10,88km
Data de Início: Data de Paralisação: 31/10/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$6.415.175,00

Município : CUIABA Código: 100876 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Duplicação BR-163/364/070 - Trecho: Entrº MT-040 / Distrito Industrial - Extensão 10,88 Km
Data de Início: 01/09/93 Data de Paralisação: 31/10/94 Percentual Concluído: 34
Valor para Conclusão: R\$6.400.000,00

Município : CUIABA Código: 100877 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Central do Estado de Mato Grosso - 2ª etapa. O contrato em pauta consta de serviços de alvenaria, esquadrias, revestimentos, forro, elevadores, parte de serviços complementares, parte de vidros, cobertura, tubulações de elétrica, hidráulica, esgoto
Data de Início: 13/05/86 Data de Paralisação: 03/11/94 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$7.500.000,00

Município : CUIABA Código: 100878 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Central do Estado de Mato Grosso - o contrato em pauta é composto pelos serviços de pisos, vidros, pintura, serviços complementares, instalações elétricas, hidráulicas, especiais estação de tratamento de esgoto, urbanização.
Data de Início: 26/09/94 Data de Paralisação: 26/10/94 Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão: R\$7.200.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município : CUIABA Código: 100879 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Centro Formador de Recursos Humanos de Estado de Mato Grosso.
Data de Início: 18/10/89 Data de Paralisação: 17/10/90 Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão: R\$2.750.000,00

Município : CUIABA Código: 100880 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital com 210 leitos destinado a pacientes acometidos de câncer, composto de 6 blocos, com 17.400 m².
Data de Início: 08/01/90 Data de Paralisação: 01/12/94 Percentual Concluído: 57
Valor para Conclusão: R\$11.069.766,00

Município : CUIABA Código: 200509 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 25/08/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 94
Valor para Conclusão:

Município : CUIABA Código: 200066 Ministérios
Descrição da Obra: Recuperação da Cadeia Pública de Carumbé, em Cuiabá - MT.
Data de Início: 27/04/89 Data de Paralisação: 04/08/89 Percentual Concluído: 43
Valor para Conclusão: R\$1.409.469,00

Município : DIAMANTINO Código: 200096 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de Posto de Benefício com 371,16m²
Data de Início: 28/04/88 Data de Paralisação: 31/12/89 Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão: R\$204.050,00

Município : ITAUBA Código: 200280 Ministérios
Descrição da Obra: Serviços de implantação e pavimentação. Rodovia BR - 163/MT; Trecho Cuiabá-Santarem; Subtrecho: Entrº MT-320-Div. MT/PA; Extensão 157,7 km.
Data de Início: Data de Paralisação: 30/09/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$76.933.140,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município : ITIQUIRA Código: 100854 Estados / Municípios
Descrição da Obra: SE Sozinho - 138/34.5 kv - 20/25 mva
Data de Início: 01/01/87 Data de Paralisação: 31/12/90 Percentual Concluído: 31,26
Valor para Conclusão: R\$952.000,00

Município : JUARA Código: 200988 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : JUINA Código: 100251 Estados / Municípios
Descrição da Obra: CAMPUS UNIVERSITÁRIO FEDERAL DE MATO GROSSO
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : JUINA Código: 100252 Estados / Municípios
Descrição da Obra: ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRODUTIVA DE 1º 2º GRAUS SARITA
BARACAT DE ARRUDA.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : JUINA Código: 200097 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de Posto de Benefícios com 200,72 m²
Data de Início: 26/04/88 Data de Paralisação: 31/12/89 Percentual Concluído: 47
Valor para Conclusão: R\$240.000,00

Município : JUINA Código: 100253 Estados / Municípios
Descrição da Obra: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM 311,37 M² DE
ÁREA.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município :	JURUENA	Código:	200989	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade Sanitária			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 70	
Valor para Conclusão:				

Município :	LUCIARA	Código:	200990	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 70	
Valor para Conclusão:				

Município :	NORTELANDIA	Código:	100858	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	SE DIAMANTINO/NORTELANDIA - 69 KV - 44 KM 266,8 MCM - ESTRUTURA CONCRETO - CIRCUITO SIMPLES.			
Data de Início:		Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 23,02	
Valor para Conclusão:	R\$1.321.000,00			

Município :	NORTELANDIA	Código:	100859	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	SE NORTELÂNDIA - 69/13.8 KV - 10/12.5 MVA.			
Data de Início:	01/01/89	Data de Paralisação:	31/12/92	Percentual Concluído: 21,01
Valor para Conclusão:	R\$1.402.000,00			

Município :	NOVA MUTUM	Código:	200991	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	PEDRA PRETA	Código:	200992	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 70	
Valor para Conclusão:				

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município : PEIXOTO DE AZEVEDO Código: 100844 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água de Peixoto de Azevedo.
Data de Início: 01/02/95 Data de Paralisação: 31/07/95 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$1.200.000,00

Município : PEIXOTO DE AZEVEDO Código: 100863 Estados / Municípios
Descrição da Obra: EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: RODOVIA BR-163 -
TRECHO: PEIXOTO DE AZEVEDO - DIVISA MT/PA: EXTENSÃO: 82,7 KM.
Data de Início: 16/10/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 13
Valor para Conclusão: R\$38.275.000,00

Município : PEIXOTO DE AZEVEDO Código: 100864 Estados / Municípios
Descrição da Obra: EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: EXTENSÃO 75,5
KM.
Data de Início: 02/12/91 Data de Paralisação: 02/01/92 Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão: R\$34.033.000,00

Município : PEIXOTO DE AZEVEDO Código: 200993 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão:

Município : PEIXOTO DE AZEVEDO Código: 100865 Estados / Municípios
Descrição da Obra: HOSPITAL MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 50 LEITOS COM 2.793,00
M² DE ÁREA CONSTRUÍDA.
Data de Início: 20/09/91 Data de Paralisação: 16/12/94 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$561.139,00

Município : POCONE Código: 200098 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de Posto de Benefícios com 200,72 m²
Data de Início: 27/04/88 Data de Paralisação: 31/12/89 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$170.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT**Município : PORTO ALEGRE DO NORTE****Código: 200994** Ministérios**Descrição da Obra:** Unidade de Saúde**Data de Início:** 01/01/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : POXOREO****Código: 200099** Ministérios**Descrição da Obra:** Construção do Posto de Benefício com 200,72m²**Data de Início:** 12/04/88**Data de Paralisação:** 31/12/89**Percentual Concluído:** 80**Valor para Conclusão:** R\$170.000,00**Município : PRIMAVERA DO LESTE****Código: 100856** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** SE Primavera - 138/34.5 kv - 20/25 MVA**Data de Início:** 01/01/89**Data de Paralisação:** 31/12/93**Percentual Concluído:** 56,73**Valor para Conclusão:**

R\$846.000,00

Município : PRIMAVERA DO LESTE**Código: 100857** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** LT RONDONÓPOLIS/PRIMAVERA - 138 KV - 120 KM 266,8 MCM -
ESTRUTURA CONCRETO - CIRCUITO SIMPLES**Data de Início:** 01/11/89**Data de Paralisação:** 31/12/94**Percentual Concluído:** 41,56**Valor para Conclusão:**

R\$2.398.000,00

Município : PRIMAVERA DO LESTE**Código: 100861** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** NÚCLEO HABITACIONAL JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS COM 100
UNIDADES HABITACIONAIS - PADRÃO ÚNICO COM 20,46 M².**Data de Início:** 01/01/92**Data de Paralisação:** 15/11/94**Percentual Concluído:** 75,67**Valor para Conclusão:**

R\$143.981,00

Município : PRIMAVERA DO LESTE**Código: 200995** Ministérios**Descrição da Obra:** Centro de Saúde**Data de Início:** 01/01/92**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT

Município : RIBEIRAO CASCALHEIRA Código: 100850 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução de Terraplenagem e Pavimentação: Rodovia BR-158; Trecho: Córrego Turvo - córrego Gaviões: extensão: 74,5 km.
Data de Início: 01/09/93 Data de Paralisação: 30/11/94 Percentual Concluído: 21
Valor para Conclusão: R\$6.805.550,00

Município : RIBEIRAO CASCALHEIRA Código: 100852 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução de Terraplenagem e Pavimentação; Rodovia:BR-158; Trecho: Córrego Gaviões - entrº MT-242; Extensão: 93,5 Km.
Data de Início: 01/03/90 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 28
Valor para Conclusão: R\$29.300.000,00

Município : RIBEIRAO CASCALHEIRA Código: 200277 Ministérios
Descrição da Obra: Construção e Pavimentação da Rodovia BR-158 Trecho Canarana-Entrº São Félix
Data de Início: Data de Paralisação: 30/11/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$52.714.779,00

Município : RONDONOPOLIS Código: 100843 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário de Rondonópolis/MT.
Data de Início: 01/01/88 Data de Paralisação: 30/03/90 Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão: R\$15.000.000,00

Município : RONDONOPOLIS Código: 100845 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Penitenciária de médio porte de Rondonópolis, com capacidade de alojar 540 detentos, e com possibilidade de ampliação para 916 detentos, através do Plano Diretor da Sec. Segurança do Estado, sendo que hoje já existe cerca de 200 detentos alojados no Raio
Data de Início: 01/01/87 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 62,55
Valor para Conclusão: R\$10.956.000,00

Município : RONDONOPOLIS Código: 100847 Estados / Municípios
Descrição da Obra: SE Rondonópolis - vão para Primavera - 138 kv.
Data de Início: 01/01/89 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 60,93
Valor para Conclusão: R\$193.000,00

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município :	CONDONÓPOLIS	Código:	100848	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	SE Anhumas - 138/34.5 kv - 20/25 mva.			
Data de Início:	01/01/87	Data de Paralisação:	31/12/90	Percentual Concluído: 55,82
Valor para Conclusão:	R\$710.000,00			

Município :	RONDONOPOLIS	Código:	100849	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Regional - Obra com 4 blocos, sendo 2 blocos com 2 pavimentos e 2 com 1 pavimento (térreo) capacidade para 100 leitos. O complexo atinge uma área de 6.488,35 m².			
Data de Início:	17/07/89	Data de Paralisação:	24/02/94	Percentual Concluído: 55
Valor para Conclusão:	R\$5.200.000,00			

Município : RONDONOPOLIS **Código:** 200510 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 25/08/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 53
Valor para Conclusão:

Município :	SAO JOSE DO POVO	Código:	100008	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Unidade Mista de Saúde				
Data de Início:	21/05/94	Data de Paralisação:	26/07/94	Percentual Concluído:	10
Valor para Conclusão:	R\$200.000,00				

Município : SAO JOSE DO RIO CLARO **Código:** 200406 **Ministérios**

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50

Valor para Conclusão:

Município : SAO JOSE DO RIO CLARO **Código:** 200996 **Ministérios**
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : SINOP

Código: 200100 **Ministérios**

Descrição da Obra: Constr. Posto de Benefícios com 371,16m²

Data de Início: 22/04/88 **Data de Paralisação:** 31/12/89 **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão: R\$204.050,00

Município : SINOP

Código: 200511 **Ministérios**

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 27/09/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1

Valor para Conclusão:

Município : SORRISO

Código: 100860 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: NÚCLEO HABITACIONAL SÃO DOMINGOS II COM 100 UNIDADES HABITACIONAIS - PADRÃO ÚNICO COM 20,46 M².

Data de Início: 01/01/92 **Data de Paralisação:** 15/01/95 **Percentual Concluído:** 81,19

Valor para Conclusão: R\$129.774,00

Município : TAPURAH

Código: 200997 **Ministérios**

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 80

Valor para Conclusão:

Município : **TESOURO**

Código: 200998 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : VARZEA GRANDE

Código: 200407 **Ministérios**

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: MT**Município : VARZEA GRANDE****Código: 200512 Ministérios****Descrição da Obra: CAICS****Data de Início: 21/10/94****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 1****Valor para Conclusão:****Município : V.BELA DA SANT.TRINDADE****Código: 200410 Ministérios****Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras****Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 50****Valor para Conclusão:****Município : V.BELA DA SANT.TRINDADE****Código: 200999 Ministérios****Descrição da Obra: Unidade Mista****Data de Início: 01/01/94****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : V.BELA DA SANT.TRINDADE****Código: 201000 Ministérios****Descrição da Obra: Posto de Saúde****Data de Início: 01/01/90****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Unidade da Federação: MT****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :****R\$168.160.129,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios :****40****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:****R\$343.413.745,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :****54**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PA

Município :	PARÁ	Código:	101047	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	BR-210 Div. RR/PA - Div. PA/AP			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$105.740.000,00			

Município :	ABAETETUBA	Código:	201001	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Regionalr			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	ALTAMIRA	Código:	200417	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 50	
Valor para Conclusão:				

Município :	ANANINDEUA	Código:	200546	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	22/10/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 57	
Valor para Conclusão:				

Município :	BELEM	Código:	200101	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção de Posto de Benefícios com 1 pavimento e 300 m² em Mosqueiro			
Data de Início:	06/12/89	Data de Paralisação:	01/06/91	Percentual Concluído: 45
Valor para Conclusão:	R\$585.672,00			

Município :	BELEM	Código:	200102	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção do Edifício Sede, com 8 pavimentos e 11.380 m²			
Data de Início:	29/12/89	Data de Paralisação:	24/11/92	Percentual Concluído: 84
Valor para Conclusão:	R\$2.790.698,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PA

Município : BELEM Código: 200111 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de um orquidário
Data de Início: 03/01/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : BELEM Código: 200145 Ministérios
Descrição da Obra: Restauração da BR 316/PA (pista dupla), trecho Belém-Marituba, subtrecho compreendido entre km 0 - km 13,4 Extensão: 13,4 km.
Data de Início: 28/06/93 Data de Paralisação: 30/03/95 Percentual Concluído: 51
Valor para Conclusão: R\$4.620.316,00

Município : BELEM Código: 200547 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 04/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : BELEM Código: 201002 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital das Clínicas g. Viana
Data de Início: 01/01/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : BELEM Código: 201003 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Universitário
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:

Município : BELEM Código: 101044 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital de Clínicas Gaspar Viana
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$12.099.177,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PA

Município :	BENEVIDES	Código:	101048	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Duplicação da BR-316 (Benevides/ Santa Maria do Pará)			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$16.000.000,00			

Município :	BREJO GDE.DO ARAGUAIA	Código:	100225	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de um hospital, (unidade mista) com 26 leitos, sala de cirurgia, sala de parto, laboratório, raio X, farmácia, sala de emergência, cozinha, banheiros, sala de recepção, lavanderia, ambulatório, sala de atendimento p/ dentista, estufa.			
Data de Início:	01/07/90	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:	R\$600.000,00			

Município :	BREJO GDE.DO ARAGUAIA	Código:	100226	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais em Brejo Grande do Araguaia.			
Data de Início:	01/09/91	Data de Paralisação:	30/08/92	Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:	R\$210.000,00			

Município :	BREJO GDE.DO ARAGUAIA	Código:	100227	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de unidades habitacionais - 20 (vinte) no povoado de São Raimundo, 15 (quinze) em Santa Rita, 15 (quinze) em Palestina.			
Data de Início:	01/08/91	Data de Paralisação:	30/08/92	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$168.000,00			

Município :	CAPANEMA	Código:	200548	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	20/07/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 14	
Valor para Conclusão:				

Município :	CASTANHAL	Código:	200549	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	13/09/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 1	
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PA

Município : IGARAPE-MIRI Código: 100456 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola Agrícola Profissionalizante de 1º grau. Com 3.800 m².
Data de Início: 27/04/94 Data de Paralisação: 30/07/94 Percentual Concluído: 5,26
Valor para Conclusão: R\$980.000,00

Município : ITUPIRANGA Código: 100007 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Rodovia Federal BR-230 - Rod. transamazônica
Data de Início: 01/01/75 Data de Paralisação: 31/12/79 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : MAE DO RIO Código: 200146 Ministérios
Descrição da Obra: Restauração da BR-010/PA (pista simples) trecho Paragoninas-entr. BR-316/PA, subtrecho compreendido entre km 177,7 e km 275,5. Extensão: 97,8 km.
Data de Início: 16/11/93 Data de Paralisação: 15/12/93 Percentual Concluído: 67
Valor para Conclusão: R\$3.312.409,00

Município : MARABA Código: 201004 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : MARABA Código: 100047 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : MARABA Código: 200103 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de Prédio Região Fiscal, com 8 pavimentos e 870,00m²
Data de Início: 24/04/89 Data de Paralisação: 26/07/91 Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão: R\$1.135.420,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PA

Município :	MARABA	Código:	100048	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Posto avançado do INSS			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:				

Município :	MARABA	Código:	200550	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	13/09/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 29	
Valor para Conclusão:				

Município :	MARABA	Código:	101045	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	BR-230 (Rio Araguaia/Marabá/ Jacareacanga)			
Data de Início:		Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:		R\$290.600.000,00		

Município :	MARABA	Código:	101046	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	BR-222 Marabá/D.Eliseu			
Data de Início:		Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:		R\$41.600.000,00		

Município :	PALESTINA DO PARA	Código:	100414	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação do Centro de Saúde II para unidade mista de 15 leitos-FNS.			
Data de Início:	01/03/93	Data de Paralisação:	30/12/94	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:		R\$120.000,00		

Município :	PORTEL	Código:	200104	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção de Benefícios e Arrecadação com 1 pavimento de 300,00m²			
Data de Início:	06/12/89	Data de Paralisação:	27/06/91	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$450.601,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PA

Município : REDENCAO

Código: 201005 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : SAO DOMINGOS DO CAPIM

Código: 200147 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração da BR-010/PA (pista simples) trecho Paragoninas-Entr. BR-316/PA, subtrecho compreendido entre km 275,5 e km 360,0. Extensão: 84,5 km.

Data de Início: 14/10/93

Data de Paralisação: 10/12/93

Percentual Concluído: 81

Valor para Conclusão: R\$1.878.834,00

Município : SAO GERALDO DO ARAGUAIA

Código: 101042 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR 153 / S. Geraldo do Araguaia / BR 230

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$19.440.000,00

Município : SAO JOAO DO ARAGUAIA

Código: 201006 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$715.000,00

Município : SANTA CRUZ DO ARARI

Código: 101040 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Perenização do Lago Arari

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$5.257.871,00

Município : SANTA ISABEL DO PARA

Código: 200074 Ministérios

Descrição da Obra: Construção da Penitenciária Federal de Segurança Máxima do Pará - PA

Data de Início: 10/01/92

Data de Paralisação: 28/12/93

Percentual Concluído: 18,18

Valor para Conclusão: R\$18.258.861,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PA

Município : SANTA ISABEL DO PARA Código: 101041 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Penitenciária federal de segurança máxima do Pará

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$13.798.400,00

Município : SANTAREM Código: 101049 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR-163 (Cuiabá/Santarém/BR-210)

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$256.200.000,00

Município : TOME-ACU Código: 200105 Ministérios

Descrição da Obra: Construção do Posto de Benefícios e Arrecadação com 1 pavimento e 300,00 m²

Data de Início: 06/12/89 Data de Paralisação: 06/08/91 Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$360.094,00

Município : TUCURUI Código: 101039 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Eclusas de Tucuruí

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$300.000.000,00

Município : TUCURUI Código: 101043 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR 422 (Tucuruí / BR-230)

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$16.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PA

Unidade da Federação: PA

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :	R\$34.107.905,00
--	------------------

Total de Obras, informado pelos Ministérios :	22
---	----

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:	R\$1.078.813.448,00
--	---------------------

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :	19
--	----

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município : ALAGOA GRANDE

Código: 200551 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 19/08/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : AROEIRAS

Código: 100113 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem de Acauã

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BARRA DE SANTA ROSA

Código: 100679 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Urbanização e instalação da obra, adutora de água bruta, estação elevatória de água bruta, estação de tratamento, clarificador, casa de cloração, reservatório semi-enterrado, estação elevatória de água tratada, reservatório elevado, rede de distribuição,

Data de Início: 08/11/88

Data de Paralisação: 15/12/93

Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão:

R\$200.000,00

Município : BAYEUX

Código: 201007 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 32

Valor para Conclusão: R\$1.100.000,00

Município : BREJO DO CRUZ

Código: 201008 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CABACEIRAS

Código: 200027 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Pelo Sinal. Barragem de concreto compactado a rolo com 16,80 m de altura máxima, 97,50 m de extensão e volume 40,336 m³ de concreto, capaz de acumular 20,600,000 m³ de água.

Data de Início: 06/12/91

Data de Paralisação: 30/04/93

Percentual Concluído: 4,13

Valor para Conclusão: R\$8.236.025,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município : CABACEIRAS Código: 100670 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem Pelo Sinal, para abastecimento d'água, irrigação e piscicultura e controle de cheias.
Data de Início: 16/12/91 Data de Paralisação: 01/05/93 Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão: R\$15.495.772,00

Município : CABEDELO Código: 200134 Ministérios
Descrição da Obra: RECUPERAÇÃO DO CAIS COMERCIAL DO PORTO DE CABEDELO
Data de Início: 24/08/89 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 21
Valor para Conclusão: R\$9.286.640,00

Município : CABEDELO Código: 200315 Ministérios
Descrição da Obra: Execução de Obras de duplicação, melhoram. e restaur. da rod. BR-230/PB, tr. Cabedelo - Div.PB/CE, subtr.Cabed.-Entr.BR-101(A), seg. Km0-Km27,5.
Data de Início: 08/09/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$4.465.875,00

Município : CACIMBA DE AREIA Código: 100487 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de casas populares com área de 25 m², com projeto de ampliação em terreno de 10.000 m² na zona urbana.
Data de Início: 21/09/93 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$60.000,00

Município : CACIMBA DE AREIA Código: 100488 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Projeto de Eletrificação Rural para atender ao Projeto de irrigação dos Colonos da Barragem da Farinha.
Data de Início: 21/10/93 Data de Paralisação: 15/12/93 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$65.000,00

Município : CACIMBA DE AREIA Código: 100489 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de um açude Comunitário no sítio denominado Riacho da Roça.
Data de Início: 03/12/94 Data de Paralisação: 03/01/95 Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão: R\$200.000,00

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : CAJAZEIRAS **Código:** 200457 **Ministérios**

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50

Valor para Conclusão:

Município : CAJAZEIRAS **Código:** 200552 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 20/07/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 83
Valor para Conclusão:

Município : CALDAS BRANDAO **Código:** 200311 **Ministérios**

Descrição da Obra: Obras de manutenção rodoviária na BR-230/PB, subtrecho Entr. PB-051 (P?Caldas Drandão) - Entr. PB-221 (Santa Luzia)

Data de Início: 19/04/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0,75

Valor para Conclusão: R\$819.568,00

Município : CAMPINA GRANDE **Código:** 100665 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: PAM - Posto de Atendimento Municipal com área de 4,966 m² de construção.

Data de Início: 08/03/88 **Data de Paralisação:** 05/12/88 **Percentual Concluído:** 30

Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : CAMPINA GRANDE **Código:** 100666 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Hemocentro de Campina Grande, com área de 2.636,23 m² de construção.

Data de Início: 01/09/91 **Data de Paralisação:** 30/11/93 **Percentual Concluído:** 30

Valor para Conclusão: R\$2.272.381,00

Município : CAMPINA GRANDE **Código:** 100674 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Construção da Escola de Áudio-Comunicação Demóstenes Cunha Lima com área de 1.547,00 m² de construção.

Data de Início: 02/05/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 46

Valor para Conclusão: R\$427.401,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município :	CAMPINA GRANDE	Código:	200318	Ministérios
Descrição da Obra:	Sinalização Horizontal nas Rodovias: BR 230/PB (Km 214,0 - Km 224,0) e Entr. BR-104(B) - Km 164,6; BR-110 (Monteiro - Divida PB/PE); BR-412 (Farinha - Monteiro)			
Data de Início:	23/12/94	Data de Paralisação:	06/01/95	Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão:	R\$70.591,00			

Município :	COREMAS	Código:	100675	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Pavimentação das rodovias BR-426/PB-348, trecho: Entr. BR-361 Piancó/Coremas/São José da Lagoa Tapada/São Gonçalo, com 84,0 km de extensão.			
Data de Início:	01/07/88	Data de Paralisação:	01/02/93	Percentual Concluído: 25,7
Valor para Conclusão:	R\$8.030.000,00			

Município :	CUITE	Código:	200310	Ministérios
Descrição da Obra:	Obras de conservação rodoviária nas BR-104/110/PB, subtrechos: Cuité - Esperança e Monteiro-Div. PB/PE.			
Data de Início:	23/10/92	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 85,11
Valor para Conclusão:	R\$285.351,00			

Município :	CUITE	Código:	200317	Ministérios
Descrição da Obra:	Sinalização Horizontal na Rodovia: BR-104/PB, trecho Cuité - Remígio - Esperança - Campina Grande - Divisa PB/PE.			
Data de Início:	23/12/94	Data de Paralisação:	06/01/95	Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão:	R\$60.560,00			

Município :	CUITE	Código:	200418	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município :	CURRAL VELHO	Código:	100672	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Barragem Bruscas, para abastecimento d'água, irrigação e piscicultura.			
Data de Início:	23/02/90	Data de Paralisação:	01/10/92	Percentual Concluído: 52
Valor para Conclusão:	R\$7.610.912,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município :	ESPERANCA	Código:	200306	Ministérios
Descrição da Obra:	Obras de conservação rodoviária na BR-104/412/PB, subtrechos Esperança - Div. PB/PE e Farinha - Monteiro.			
Data de Início:	20/07/92	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 48,74	
Valor para Conclusão:	R\$592.666,00			

Município :	GUARABIRA	Código:	200553	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	17/09/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 70	
Valor para Conclusão:				

Município :	GUARABIRA	Código:	201009	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	INGA	Código:	201010	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Regional			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	INGA	Código:	100289	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Regional.			
Data de Início:	15/08/90	Data de Paralisação:	28/01/91	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$1.500.000,00			

Município :	ITABAIANA	Código:	200554	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	19/08/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 18	
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município : ITAPORANGA

Código: 200106 Ministérios

Descrição da Obra: Construção de Posto de Benefícios

Data de Início: 30/10/92

Data de Paralisação: 04/07/94

Percentual Concluído: 89,7

Valor para Conclusão: R\$50.000,00

Município : ITATUBA

Código: 201011 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 88

Valor para Conclusão:

Município : JOAO PESSOA

Código: 201012 Ministérios

Descrição da Obra: Pronto Socorro

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : JOAO PESSOA

Código: 100673 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Hospital de Pronto Socorro de João Pessoa com área de 10.012,00 m² de construção.

Data de Início: 14/09/90

Data de Paralisação: 01/05/95

Percentual Concluído: 55

Valor para Conclusão:

R\$4.899.410,00

Município : JOAO PESSOA

Código: 100676 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Restauração e duplicação da rodovia BR-230, trecho Cabedelo/Div. PB/CE, sub-trecho Cabedelo/Av. Tancredo Neves com 14,5 km de extensão.

Data de Início: 15/03/93

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

R\$526.180,00

Município : JOAO PESSOA

Código: 100677 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Restauração e duplicação da rodovia BR-230, trecho Cabedelo/Div. PB/CE, sub-trecho Av. Tancredo Neves/Girador de Oitizeiro com 13,0 km de extensão.

Data de Início: 15/03/93

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 8,4

Valor para Conclusão:

R\$4.555.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município :	JOAO PESSOA	Código:	100987	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Infra estrutura urbana na periferia sudeste - Drenagem e Pavimentação dos Conjuntos Anatolia, Bancários e Jardim São Paulo.			
Data de Início:	13/09/93	Data de Paralisação:	24/02/95	Percentual Concluído: 5,46
Valor para Conclusão:	R\$4.958.626,00			

Município :	JOAO PESSOA	Código:	100988	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Infra estrutura urbana na periferia sudeste - Esgotamento Sanitário dos Conjuntos Anatolia, Bancários, Jardim São Paulo e Cristo.			
Data de Início:	01/10/92	Data de Paralisação:	01/10/93	Percentual Concluído: 4,89
Valor para Conclusão:	R\$12.096.337,00			

Município :	JOAO PESSOA	Código:	100989	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Infra estrutura urbana na periferia sul - Esgotamento Sanitário dos Conjuntos Funcionários I e II, Esplanada I e II e do Geisel. Drenagem e Pavimentação dos Conj. Funcionários I e II, Esplanada I e II, Geisel e Ernani Sátiro.			
Data de Início:	01/09/92	Data de Paralisação:	02/05/95	Percentual Concluído: 7,19
Valor para Conclusão:	R\$42.168.445,00			

Município :	JOAO PESSOA	Código:	100990	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Infra estrutura urbana na favela Saturnino de Brito: - Muro de arrimo; - Drenagem; - Pavimentação de vias - realocização de habitação			
Data de Início:	20/01/94	Data de Paralisação:	01/03/94	Percentual Concluído: 7,48
Valor para Conclusão:	R\$900.004,00			

Município :	JOAO PESSOA	Código:	100991	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	PROSEGE - Programa de Ação Social em Saneamento - Rede de Esgotos Sanitários, ligações domiciliares, linha de recalque e elevatória, nos bairros do Baixo Roger, Baixo Mandacarú, Alto do Céu, Porto João Tota, Cidade Padre Zé.			
Data de Início:	08/10/93	Data de Paralisação:	01/10/94	Percentual Concluído: 51,2
Valor para Conclusão:	R\$650.319,00			

Município :	JOAO PESSOA	Código:	100992	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Estação de tratamento de esgotos sanitários da Bacia do Paraíba composta de: 4 Lagoas de estabilização, elevatória, poço de sucção e grades de barra, prédio da Administração, reservatório elevado, tanque de mistura e casa de cloração.			
Data de Início:	04/01/93	Data de Paralisação:	27/03/95	Percentual Concluído: 17,55
Valor para Conclusão:	R\$12.465.836,00			

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município : JOAO PESSOA

Código: 100993 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Infra estrutura urbana do Bessa; Macro Drenagem - Canal; Micro Drenagem; Drenagem superficial e Pavimentação de vias

Data de Início: 23/02/94 **Data de Paralisação:** 25/08/95 **Percentual Concluído:** 2,7

Valor para Conclusão:

R\$45.000.000,00

Município : JOAO PESSOA

Código: 100994 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Projeto Integrado do Alto Jaguaribe - Drenagem; Pavimentação; Esgoto Sanitário; construção de habitação (relocação); Rede d'água (melhoramento e ampliação); reforma, ampliação e implantação de equipamentos comunitários na favela Boa Esperança.

Data de Início: 05/03/92 **Data de Paralisação:** 31/03/95 **Percentual Concluído:** 50

Valor para Conclusão:

R\$10.000.000,00

Município : JOAO PESSOA

Código: 201013 **Ministérios**

Descrição da Obra: Hospital Mangabeira

Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão: 7

Município : JURU

Código: 201014 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/92 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : MAMANGUAPE

Código: 100680 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Instalação da obra, adutora de água bruta (TAU), recuperação do açude Jangada, casa de bombas de água bruta, estação de tratamento de água, estação elevatória de água tratada, reservatório semi-enterrado de 500m³, elevatórias, reservatórios elevados de di

Data de Início: 08/11/88 **Data de Paralisação:** 21/07/92 **Percentual Concluído:** 40

Valor para Conclusão:

R\$2.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município : MAMANGUAPE Código: 200307 Ministérios
Descrição da Obra: Obras de manutenção rodoviária nas BR-101/230/PB, subtrechos Div. RN/PB - Div. PB/PE e Cabedelo - Entr. PB-051 (P/Caldas Brandão).
Data de Início: 23/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 52,93
Valor para Conclusão: R\$228.220,00

Município : MASSARANDUBA Código: 201015 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : MONTADAS Código: 100004 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do Hospital Municipal de Montadas
Data de Início: 09/11/93 Data de Paralisação: 26/12/94 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$200.000,00

Município : NOVA OLINDA Código: 200028 Ministérios
Descrição da Obra: Barragem Canoas. Barragem de terra homogênea, com 53,50 m de altura máxima, 410,00 m de extensão e volume de 1.250.000 m³ de terra, capaz de acumular 45.800.000 m³ de água.
Data de Início: 25/07/89 Data de Paralisação: 01/03/93 Percentual Concluído: 36,28
Valor para Conclusão: R\$8.302.316,00

Município : NOVA OLINDA Código: 100485 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem Canoas - Barragem de terra com capacidade máxima de acumulação de 52,7 milhões de metros cúbicos. Situado no rio Canoas, a 7 km a Sudoeste da cidade de Nova Olinda, a oeste da Paraíba.
Data de Início: 02/01/90 Data de Paralisação: 30/12/91 Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão: R\$10.000.000,00

Município : NOVA OLINDA Código: 100486 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Serviços de Pavimentação Asfáltica da BR-426 - Partindo da PB-356 Piancó-PB - Santana dos Garrotes-PB - Nova Olinda-PB.
Data de Início: 02/01/94 Data de Paralisação: 31/07/95 Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão: R\$4.158.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB**Município : NOVA OLINDA****Código: 100668** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Projeto de irrigação do Gravatá**Data de Início:** 02/01/90 **Data de Paralisação:** 01/04/94 **Percentual Concluído:** 56**Valor para Conclusão:** R\$5.908.545,00**Município : OLHO D'AGUA****Código: 100671** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Barragem Jenipapeiro, para abastecimento d'água, irrigação e piscicultura.**Data de Início:** 13/10/89 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:** R\$5.376.452,00**Município : PATOS****Código: 200309** Ministérios**Descrição da Obra:** Obras de conservação rodoviária nas BR-110/361/PB, subtrechos Div. RN/PB - Entr. BR-230/PB e Patos - Itaporanga.**Data de Início:** 19/10/92 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 76,23**Valor para Conclusão:** R\$190.271,00**Município : PATOS****Código: 200312** Ministérios**Descrição da Obra:** Obs de recuperação (Lama Asfáltica) na BR-230/PB, subtrecho Patos - Pombal, segmento km 338,5 - km 360,9.**Data de Início:** 22/12/94 **Data de Paralisação:** 01/01/95 **Percentual Concluído:** 0**Valor para Conclusão:** R\$99.082,00**Município : PATOS****Código: 200314** Ministérios**Descrição da Obra:** Obras de Restauração na rodovia BR-361/PB, trecho Patos - Itaporanga, subtrecho Patos - Santa Teresinha segmento Km 0,0 - Km 22,4, extensão 22,4 Km.**Data de Início:** 22/09/92 **Data de Paralisação:** 01/11/93 **Percentual Concluído:** 54**Valor para Conclusão:** R\$358.044,00**Município : PATOS****Código: 200419** Ministérios**Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município : PIANCO Código: 200316 Ministérios
Descrição da Obra: Obra Delegada ao Ministério do Exército - Convênio nº PG-064/94 - para execução de serviços de terraplenagem e pavimentação na rodovia BR-426/PB, trecho Piancó - Nova Olinda.

Data de Início: 01/09/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 15

Valor para Conclusão:

Município : PICUI Código: 200029 Ministérios
Descrição da Obra: Barragem Varzea Grande. Barragem de concreto compactado a rolo, com 28,20 m de altura máxima, 132,00 m de extensão e volume de 33.000 m³ de concreto, capaz de acumular 21.500.000 m³ de água.

Data de Início: 11/03/92 Data de Paralisação: 01/12/94 Percentual Concluído: 5,53

Valor para Conclusão: R\$3.213.924,00

Município : PICUI Código: 100667 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem Várzea Grande, para abastecimento d'água, irrigação e piscicultura.

Data de Início: 01/10/92 Data de Paralisação: 01/12/93 Percentual Concluído: 58

Valor para Conclusão: R\$4.362.090,00

Município : PICUI Código: 100681 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Urbanização e instalação de obras, estação de tratamento, reservatório elevado de 150m³, reservatório apoiado de 500m³, adutora de água bruta, casa de cloração, reservatório semi-enterrado de 100m³, casa de bombas, rede de distribuição, ligações domicilia

Data de Início: 08/11/88 Data de Paralisação: 09/01/90 Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$1.200.000,00

Município : PICUI Código: 200420 Ministérios
Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : POMBAL Código: 200313 Ministérios
Descrição da Obra: Obras de Restauração na Rodovia BR-427/PB, trecho Div. RN/PB - Pombal, subtrecho segmento Km 0,0 - Km 37,6, extensão 37,6 Km.

Data de Início: 14/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$348.626,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município : POMBAL

Código: 200555 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 25/08/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 76

Valor para Conclusão:

Município : PUXINANA

Código: 200421 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : QUEIMADAS

Código: 100682 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Adutora de água tratada, elevatória de água tratada, reservação, rede de distribuição, ligações domiciliares de água e tubos e conexões para a conclusão da adutora DN 300mm.

Data de Início: 08/11/88

Data de Paralisação: 09/10/92

Percentual Concluído: 95

Valor para Conclusão:

R\$95.000,00

Município : SAO MAMEDE

Código: 200319 Ministérios

Descrição da Obra: Sinalização Horizontal nas Rodovias: BR-230/PB, Subtrecho São Mamede - Aparecida e BR-361/PB Subtrecho Km 12 - Entr. PB/312.

Data de Início: 23/12/94

Data de Paralisação: 06/01/95

Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$54.758,00

Município : SANTA LUZIA

Código: 200308 Ministérios

Descrição da Obra: Obras de conservação rodoviária nas BR-230/405/427/PB, subtrechos Santa Luzia - Div. PB/PE, Div. RN/PB - S. João do Rio do Peixe e Div. RN/PB - Pombal.

Data de Início: 07/10/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 53,26

Valor para Conclusão: R\$900.691,00

Município : SANTA LUZIA

Código: 201016 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PB

Município : SANTA RITA

Código: 200556 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/07/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 83

Valor para Conclusão:

Município : SANTANA DE MANGUEIRA

Código: 100669 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem Poço Redondo, para abastecimento d'água, irrigação e piscicultura.

Data de Início: 15/12/89

Data de Paralisação: 01/09/93

Percentual Concluído: 58

Valor para Conclusão:

R\$6.606.087,00

Município : SOUSA

Código: 100560 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Canal principal de irrigação P-3. 2ª etapa do perímetro irrigado de S. Gonçalo

Data de Início: 01/08/87

Data de Paralisação: 31/12/89

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SOUSA

Código: 100678 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Pavimentação da rodovia PB-359, trecho Entr. BR-230 Aparecida/Santa Cruz/Div. PB/RN com 44,0 km de extensão.

Data de Início: 01/12/93

Data de Paralisação: 01/02/94

Percentual Concluído: 16,5

Valor para Conclusão:

R\$3.736.000,00

Município : SUMÉ

Código: 200422 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS****INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: PB****Unidade da Federação: PB****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :****R\$38.663.208,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios :****41****Total dos recursos para conclusão, informado pelos
Estados/Municípios:****R\$219.723.797,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :****35**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : PERNAMBUCO **Código:** 200023 **Ministérios**
Descrição da Obra: ADUTORA DO OESTE PERNAMBUCANO - Substema do trecho Orocó-Araripina, com assentamento de tubulação com diâmetro variando entre 100 e 700 mm, com extensão total de 448.500 metros.
Data de Início: 26/08/93 **Data de Paralisação:** 30/05/94 **Percentual Concluído:** 2
Valor para Conclusão: R\$96.113.814,00

Município : ABREU E LIMA **Código:** 101059 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Hospital Municipal de Abreu e Lima.
Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** 01/01/95 **Percentual Concluído:** 80
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : AGUAS BELAS **Código:** 100001 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Barragem de Lamarão - Barragem de alvenaria de pedra argamassada destinada ao abastecimento da Sede do Município e irrigação de áreas cultiváveis
Data de Início: 28/02/94 **Data de Paralisação:** 30/08/94 **Percentual Concluído:** 25
Valor para Conclusão: R\$350.000,00

Município : ARARIPINA **Código:** 200425 **Ministérios**
Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão:

Município : ARCOVERDE **Código:** 200567 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 04/10/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1
Valor para Conclusão:

Município : BELEM DE MARIA **Código:** 201017 **Ministérios**
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : BELEM DE SAO FRANCISCO **Código:** 200426 **Ministérios**
Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão:

Município : BELO JARDIM **Código:** 200026 **Ministérios**
Descrição da Obra: Barragem Belo Jardim. Barragem em concreto compactado a rolo, com 38,00 m de altura máxima, 300,00 m de extensão e volume de 88.400 m³ de concreto, capaz de acumular 22.100.000 m³ de água.
Data de Início: 04/05/92 **Data de Paralisação:** 31/01/93 **Percentual Concluído:** 16
Valor para Conclusão: R\$4.770.088,00

Município : BELO JARDIM **Código:** 201018 **Ministérios**
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : BREJO DA MADRE DE DEUS **Código:** 100466 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Matadouro Público na periferia da zona urbana da sede do município, construído em alvenaria de tijolo/cimento, com áreas a serem revestidas em azulejos e materiais, equipamento e instalações hidro-sanitárias destinadas ao abate/corte de carne de animais d
Data de Início: 02/01/84 **Data de Paralisação:** 30/03/85 **Percentual Concluído:** 40
Valor para Conclusão: R\$160.228,00

Município : CABO **Código:** 200156 **Ministérios**
Descrição da Obra: Terraplenagem e pavimentação da Rodovia BR-101/PE, trecho: Prazeres (km 84,20)-Cabo (km 99,22).
Data de Início: 16/08/93 **Data de Paralisação:** 01/12/93 **Percentual Concluído:** 11,5
Valor para Conclusão: R\$13.450.000,00

Município : CABO **Código:** 200157 **Ministérios**
Descrição da Obra: Terraplenagem e pavimentação da Rodovia BR-101/PE, subtrecho: Prazeres (km 99,22)-Cabo (km 106,64).
Data de Início: 20/08/93 **Data de Paralisação:** 24/12/93 **Percentual Concluído:** 7,5
Valor para Conclusão: R\$12.287.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : CABO Código: 200158 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de Obras de Arte Especiais na Rodovia BR-101/PE, trecho: Prazeres (km 84,20)-Cabo (km 106,64).
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$22.252.000,00

Município : CABO Código: 100562 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Duplicação da BR 101 Sul, no trecho Prazeres - Charneca do km 84,20 ao km 106,40
Data de Início: 22/12/87 Data de Paralisação: 27/11/93 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:

Município : CABO Código: 100563 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Sistema de Produção Pirapama - Barragem Pirapama
Data de Início: 01/01/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão:

Município : CALCADO Código: 100130 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Creche padrão.
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$40.000,00

Município : CALCADO Código: 100131 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola de 1º e 2º Grau no Povoado Santa Rita.
Data de Início: 01/11/93 Data de Paralisação: 31/03/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$50.000,00

Município : CALCADO Código: 201019 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : CAMARAGIBE Código: 200159 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação e pavimentação da Rodovia BR-408/PE, trecho: Bicopeba (estaca o)-
Recife (estaca 883).
Data de Início: 04/11/92 Data de Paralisação: 01/12/93 Percentual Concluído: 24,5
Valor para Conclusão: R\$2.961.000,00

Município : CARNAIBA Código: 100129 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Conclusão de uma ponte sobre o Rio Pajeú.
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 31
Valor para Conclusão: R\$240.000,00

Município : CHA GRANDE Código: 201020 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : CHA GRANDE Código: 100240 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Unidade Mista Municipal "São José" na cidade de Chã Grande -Pe.,
de 20 (vinte) leitos, enfermaria, sala de parto, sala de raio x, triagem, gabinete
odontológico e médico, farmácia, sala de imunização, administração.
Data de Início: 01/02/90 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão: R\$450.000,00

Município : DORMENTES Código: 201021 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : DORMENTES Código: 100415 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Municipal de Dormentes
Data de Início: 15/04/94 Data de Paralisação: 30/05/94 Percentual Concluído: 2
Valor para Conclusão: R\$650.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município :	DORMENTES	Código:	200056	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção da Barragem de Chico Velho			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 50		
Valor para Conclusão:	R\$90.000,00			

Município :	EXU	Código:	201022	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início: 01/01/91	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 40		
Valor para Conclusão:				

Município :	FLORES	Código:	201023	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início: 01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 50		
Valor para Conclusão:				

Município :	GLORIA DO GOITA	Código:	100561	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Sistema de Abastecimento d'água do Distrito de Apoti, que contempla uma população de 3.000 hab. Dotado de: Soleira Vertedoura, Estação Elevatória, Adutora de Recalque, Stand-pipe, Adutora de Gravidade e Chafariz.			
Data de Início: 14/09/92	Data de Paralisação: 01/01/93	Percentual Concluído: 80		
Valor para Conclusão:	R\$80.000,00			

Município :	GRAVATA	Código:	100164	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CIAC			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:				

Município :	GRAVATA	Código:	200568	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início: 17/05/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 63		
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **PE**Município : **IBIMIRIM**

Código: 200024 Ministérios

Descrição da Obra: Projeto Irrigado Moxotó - Implantação de uma área irrigável de 8.000 ha, dividido em duas etapas de 4.000 ha cada, estando implantados 3.969 ha.

Data de Início: 16/05/79 Data de Paralisação: 30/09/93 Percentual Concluído: 82

Valor para Conclusão: R\$7.310.000,00

Município : **IGUARACI**

Código: 100141 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Conclusão das Obras do eixo integração norte (BR-101-Norte) do trecho do município de Igarassu/PE

Data de Início: 02/01/85 Data de Paralisação: 31/12/89 Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

Município : **ITAPETIM**

Código: 100254 Estados / Municípios

Descrição da Obra: AÇUDE DO DISTRITO DE SÃO VICENTE (DENOMINADA BARRAGEM SANTO ANTONIO DE LIMA)

Data de Início: 01/01/87 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município : **ITAQUITINGA**

Código: 200569 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 14/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

Município : **ITAQUITINGA**

Código: 201024 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

Município : **JABOATAO DOS GUARARAPES**

Código: 100280 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ambulatórios de alta resolutividade

Data de Início: 15/07/94 Data de Paralisação: 15/06/95 Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão: R\$120.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : JABOATAO DOS GUARARAPES **Código:** 100281 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Drenagem e Pavimentação às margens do Canal Setúbal - Estaca 0 a 93.**Data de Início:** 01/12/89 **Data de Paralisação:** 07/04/95 **Percentual Concluído:** 62**Valor para Conclusão:** R\$1.200.000,00

Município : JABOATAO DOS GUARARAPES **Código:** 100282 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Parque histórico Montes dos Guararapes - Contenção, Drenagem e Canalização do Córrego da Batalha.**Data de Início:** 26/11/93 **Data de Paralisação:** 30/12/93 **Percentual Concluído:** 61**Valor para Conclusão:** R\$600.000,00

Município : JABOATAO DOS GUARARAPES **Código:** 100283 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Esgotamento sanitário - Implantação do sistema de esgotamento em comunidades de Baixa Renda (N. Sra. do Carmo, Tieta, Asa Branca, Bom Pastor, Nova Jerusalém)**Data de Início:** 11/07/94 **Data de Paralisação:** 02/01/95 **Percentual Concluído:** 59**Valor para Conclusão:** R\$613.523,00

Município : MACHADOS **Código:** 100132 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Estrada que liga o município de Machados ao de Orobó/PE.**Data de Início:** 01/01/84 **Data de Paralisação:** 31/12/88 **Percentual Concluído:** 40**Valor para Conclusão:** R\$600.000,00

Município : MORENO **Código:** 100241 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção de Posto de Saúde MARIA CRISTINA DE SOUZA LEÃO, no Distrito de Bonança, Município de Moreno, com área de construção atual em 280.92m²**Data de Início:** 13/07/94 **Data de Paralisação:** 30/09/94 **Percentual Concluído:** 35**Valor para Conclusão:** R\$58.431,00

Município : MORENO **Código:** 100242 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO 1º GRAU DR. HELION RAMALHO LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BELA VISTA, CIDADE DO MORENO (ZONA URBANA)**Data de Início:** 02/01/94 **Data de Paralisação:** 30/04/94 **Percentual Concluído:** 40**Valor para Conclusão:** R\$30.528,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município :	MORENO	Código:	100243	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU GERSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BONANÇA, MUNICÍPIO DE MORENO, COM PREVISÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA DE 215,00m²			
Data de Início:	02/01/94	Data de Paralisação:	30/04/94	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$20.352,00			
Município :	MORENO	Código:	100244	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Municipal Beiró Uchoa, na cidade de Moreno, transformando em Hospital Municipal com 2.348,20m² de Construção de 53 leitos.			
Data de Início:	02/05/89	Data de Paralisação:	16/11/93	Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:	R\$140.892,00			
Município :	OLINDA	Código:	201025	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Geral			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:				
Município :	OLINDA	Código:	100739	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção do Hospital Geral de Olinda com capacidade para 150 leitos, distribuídos por enfermaria pediátrica (60), enfermaria ginecológica obstétrica (30), clínica médica (30), e clínica cirúrgica (30).			
Data de Início:	01/07/93	Data de Paralisação:	30/09/93	Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:	R\$4.000.000,00			
Município :	OLINDA	Código:	100740	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Implantação de rede coletora de esgoto no Conjunto Habitacional "Cidade Tabajara"			
Data de Início:	02/01/94	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:	R\$500.000,00			
Município :	OLINDA	Código:	100741	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Infra-Estrutura Urbana no Bairro de Jardim Brasil (pavimentação, drenagem e serviços complementares)			
Data de Início:	01/09/94	Data de Paralisação:	31/01/95	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$1.200.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : OLINDA **Código:** 100742 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Programa de Ação Social em Saneamento - PROSEGE - Esgotamento Sanitário nos bairros de Cabo Gato e COHAB - Peixinhos.**Data de Início:** 01/12/94 **Data de Paralisação:** 30/04/95 **Percentual Concluído:** 20**Valor para Conclusão:** R\$474.879,00

Município : OLINDA **Código:** 100743 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Implantação de vias alimentadoras de transporte coletivo**Data de Início:** 02/01/94 **Data de Paralisação:** 30/04/94 **Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:** R\$516.070,00

Município : OLINDA **Código:** 100744 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção da Ligação PE-15 ao Jardim Atlântico.**Data de Início:** 01/08/93 **Data de Paralisação:** 30/06/94 **Percentual Concluído:** 15**Valor para Conclusão:** R\$250.000,00

Município : OLINDA **Código:** 100745 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Macro-Drenagem nas áreas da bacia dos canais Bultrins/Fragoso e Rio Dóce**Data de Início:** 01/10/93 **Data de Paralisação:** 28/02/94 **Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:** R\$200.000,00

Município : OURICURI **Código:** 100596 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Implantação de várias estações de bombeamento e trechos de adutora que deverão alimentar municípios do sertão, em especial, Ouricuri e Araripina. (Adutora do Oeste).**Data de Início:** 02/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 5**Valor para Conclusão:** R\$100.000.000,00

Município : PALMARES **Código:** 200570 **Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 16/09/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 53**Valor para Conclusão:**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : PAULISTA**Código:** 200155 Ministérios**Descrição da Obra:** Eixo de integração norte da Região Metropolitana do Recife, BR-101/PE, trecho: Paulista (km 41,7)-Igarassu (km 52,4).**Data de Início:** 13/02/86**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 90**Valor para Conclusão:** R\$3.000.000,00**Município :** PESQUEIRA**Código:** 100216 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** CAIC - este Centro de Atenção Integral encontra-se com sua estrutura física concluída. Não pode servir a "Comunidade Carente", por falta de recursos para aquisição dos equipamentos e urge uma ação efetiva, face ao início de depredação do Patrimônio.**Data de Início:** 01/04/94**Data de Paralisação:** 31/12/94**Percentual Concluído:** 70**Valor para Conclusão:**

R\$500.000,00

Município : PESQUEIRA**Código:** 100217 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Canal Isabel Dias - Obra de drenagem de todas as águas e dejetos vindos do Leste e Norte da cidade, com extensão de aproximadamente 900 m, e imprescindível, face as inúmeras inundações ocorridas em áreas centrais da cidade que, por falta de escoamento der**Data de Início:** 01/04/94**Data de Paralisação:** 31/05/94**Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:**

R\$540.000,00

Município : PESQUEIRA**Código:** 100218 Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Centro Poliesportivo - Local que seria utilizado pelos alunos da Rede Municipal de Ensino e Escola Técnica Federal de Pesqueira, para práticas de Educação Física, Esportes e para atividades Culturais e de Lazer.**Data de Início:** 02/01/88**Data de Paralisação:** 31/12/88**Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:**

R\$600.000,00

Município : PETROLANDIA**Código:** 200427 Ministérios**Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:**

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : PETROLANDIA

Código: 201026 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PETROLINA

Código: 200684 Ministérios

Descrição da Obra: Transnordestina Construção de 349 km de linha férrea entre Petrolina, Salgueiro e Missão Velha - Fortaleza.

Data de Início: 12/03/90

Data de Paralisação: 30/11/92

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$350.500.000,00

Município : PETROLINA

Código: 100595 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação de dois trechos ferroviários, ligando Salgueiro e Petrolina e Salgueiro a Missão Velha (CE). Faltando 212 km para construir. (Ferrovia Transnordestina)

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$267.000.000,00

Município : POMBOS

Código: 100402 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção e ampliação de Adutora. Construção de reservatório d'água.

Data de Início: 01/09/92

Data de Paralisação: 30/11/92

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

R\$850.000,00

RECIFE

Código: 100593 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Trecho: Curado/Bicopeba BR 408 - conclusão de 04 Km.

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

R\$1.800.000,00

Código: 100594 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma nova rodovia, com quatro faixas de rolamento, no trecho (Duplicação da BR-101 Sul)

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

R\$36.200.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

14-nov-95

Unidade da Federação: PE

Município : RECIFE Código: 200133 Ministérios
Descrição da Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DO RECIFE.
Data de Início: 29/09/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 88,53
Valor para Conclusão: R\$11.943.630,00

Município : RECIFE Código: 200571 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 17/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 79
Valor para Conclusão:

Município : RECIFE Código: 200682 Ministérios
Descrição da Obra: Reparação e modernização da locomotiva alco modelo RS-08 nº 6012
Data de Início: 22/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão: R\$603.318,00

Município : RECIFE Código: 201027 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$19.000,00

Município : RECIFE Código: 201028 Ministérios
Descrição da Obra: Ambulatório
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : RECIFE Código: 201029 Ministérios
Descrição da Obra: Instituto do Coração
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : **SAO LOURENCO DA MATA**

Código: 201031 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Regional

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **SALGADINHO**

Código: 100133 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Reservatório Hidrico, tipo Barragem, no sítio Salobro, para irrigação atendendo pequenos agricultores.

Data de Início: 01/02/93

Data de Paralisação: 30/03/94

Percentual Concluído: 38,1

Valor para Conclusão:

R\$48.600,00

Município : **SALGUEIRO**

Código: 200424 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : **S.MARIA DA BOA VISTA**

Código: 201030 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **SERRA TALHADA**

Código: 200025 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Serrinha - Barragem de terra e enrocamento, com 30,00 m de altura máxima, 1.280,00 m de extensão e volume de 1.652.759 m³ de material, capaz de acumular 311.000.000 m³ de água.

Data de Início: 05/11/85

Data de Paralisação: 30/10/93

Percentual Concluído: 95,38

Valor para Conclusão: R\$3.000.000,00

Município : **SERRA TALHADA**

Código: 100597 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem de Serrinha. A barragem acumulará um volume de 311 milhões de m³, beneficiará os municípios de Mirandiba, Flores, São José do Belmonte, Carnaubeira da Penha, Itacuruba, perenizará longo trecho do rio Pajeú permitindo a instalação de mais meio per

Data de Início:

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão:

R\$3.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município : SERRITA

Código: 201032 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SURUBIM

Código: 200057 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Jucazinho. Barragem em concreto compactado a rolo, com 62,00 m de altura máxima, 262,00 m de extensão e volume de 517.100 m³ de concreto, capaz de acumular 120.000.000 m³ de água.

Data de Início: 21/06/93

Data de Paralisação: 28/02/94

Percentual Concluído: 6,13

Valor para Conclusão: R\$8.873.297,00

Município : SURUBIM

Código: 100186 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem Jucazinho

Data de Início: 02/01/92

Data de Paralisação: 28/02/94

Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão:

R\$25.000.000,00

Município : SURUBIM

Código: 100187 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Limpeza e dragagem da barragem de vertente do Heráclio

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$200.000,00

Município : SURUBIM

Código: 100188 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de adutora para Mimoso e cinco chafarizes.

Data de Início: 02/01/93

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

R\$500.000,00

Município : TAQUARITINGA DO NORTE

Código: 200573 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PE

Município :	VITORIA DE SANTO ANTAO	Código:	100185	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Barragem do Riacho Natuba em alvenaria de pedra.				
Data de Início:	02/01/87	Data de Paralisação:	07/08/92	Percentual Concluído:	40
Valor para Conclusão:	R\$270.000,00				

Município :	VITORIA DE SANTO ANTAO	Código:	201033	Ministérios	
Descrição da Obra:	Posto de Saúde				
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:					

Município :	XEXEU	Código:	100284	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Construção de um estádio de futebol				
Data de Início:	01/06/93	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído:	20
Valor para Conclusão:	R\$600.000,00				

Unidade da Federação: PE

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios : R\$537.173.147,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios : 41

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios: R\$453.153.503,00

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios : 45

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **PI**

Município :	ANISIO DE ABREU	Código:	201034	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão:	R\$160.450,00			

Município :	BARRAS	Código:	100357	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Barragem de Concreto, vertedoura			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:	R\$200.000,00			

Município :	BERTOLINIA	Código:	201035	Ministérios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	BOCAINA	Código:	200030	Ministérios
Descrição da Obra:	Barragem Bocaina. Barragem de terra zoneada, com altura máxima de 53,50 m, extensão de 356,00 m, com um volume total de 1,503,000 m³ de material e capacidade de acumulação de 106,000,000 m³ de água.			
Data de Início:	13/11/91	Data de Paralisação:	31/03/95	Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão:	R\$560.000,00			

Município :	BOCAINA	Código:	100343	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Baragem Bocaina, capacidade 106 milhões de m³.			
Data de Início:	02/01/82	Data de Paralisação:	31/12/92	Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão:	R\$500.000,00			

Município :	BOM JESUS	Código:	200428	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **PI**Município : **CAMPO MAIOR**

Código: 200574 Ministérios

Descrição da Obra: **CAICS**

Data de Início: 22/06/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 62

Valor para Conclusão:

Município : **COCAL**

Código: 200429 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : **COLONIA DO GURGUEIA**

Código: 100106 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Centro de Treinamento para professores

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação: 31/12/91

Percentual Concluído: 25

Valor para Conclusão:

R\$60.000,00

Município : **COLONIA DO GURGUEIA**

Código: 100107 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Escola da CNEC, com 08 salas de aula - somente os alicerces

Data de Início: 01/01/85

Data de Paralisação: 31/12/86

Percentual Concluído: 15

Valor para Conclusão:

R\$120.000,00

Município : **COLONIA DO GURGUEIA**

Código: 100108 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Unidade Escolar com 06 salas de aula

Data de Início: 01/08/94

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão:

R\$20.000,00

Município : **COLONIA DO GURGUEIA**

Código: 100109 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Estádio Municipal "Gurgueião". A obra encontra-se somente murada.

Data de Início: 02/01/90

Data de Paralisação: 30/12/91

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

R\$250.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PI

Município : CONCEICAO DO CANINDE

Código: 200031 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Pedra Redonda. Barragem de terra homogênea, com altura máxima de 51,00 m e extensão de 370,00 m com um volume total de 295,000 m³ de terra e capacidade de acumulação de 216.000.000 m³ de água.

Data de Início: 30/10/91 Data de Paralisação: 28/02/93 Percentual Concluído: 3,7

Valor para Conclusão: R\$15.362.864,00

Município : CONCEICAO DO CANINDE

Código: 100352 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Barragem Pedra Redonda, capacidade 216 milhões de m³

Data de Início: 01/01/92 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 4

Valor para Conclusão: R\$15.154.000,00

Município : CORRENTE

Código: 100403 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Hospital Maternidade de Corrente.

Data de Início: 27/06/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão: R\$381.697,00

Município : CORRENTE

Código: 201036 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CORRENTE

Código: 201037 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão: R\$350.000,00

Município : ESPERANTINA

Código: 201038 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão: R\$300.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PI

Município : FLORIANO **Código:** 200340 **Ministérios**
Descrição da Obra: Execução de Estudos e Proj., Melhoram., implantaç., pavim. de obras de artes correntes e espec. e obras complement. nas BR-324/135(PI) trechos Floriano-Bertolínea-Eliseu Martins
Data de Início: 30/12/88 **Data de Paralisação:** 31/12/93 **Percentual Concluído:** 40,6
Valor para Conclusão: R\$12.679.932,00

Município : FRANCISCO SANTOS **Código:** 201039 **Ministérios**
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : GUADALUPE **Código:** 200008 **Ministérios**
Descrição da Obra: Obras de implantação do projeto de irrigação Platôs de Guadalupe.
Data de Início: 30/06/87 **Data de Paralisação:** 31/12/91 **Percentual Concluído:** 25
Valor para Conclusão:

Município : GUADALUPE **Código:** 100346 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Perímetro de irrigação com platôs de Guadalupe, área total 32000 Ha. Contratada a 1ª etapa de 3085 Ha, com área prioritária de 655 Ha.
Data de Início: 02/01/87 **Data de Paralisação:** 31/12/93 **Percentual Concluído:** 25
Valor para Conclusão: R\$12.000.000,00

Município : GUADALUPE **Código:** 100347 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Eclusas da Barragem de Boa Esperança. Falta as instalações dos equipamentos elétro-mecânicos.
Data de Início: 01/01/70 **Data de Paralisação:** 31/12/82 **Percentual Concluído:** 60
Valor para Conclusão: R\$29.400.000,00

Município : IPIRANGA DO PIAUI **Código:** 100228 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Sistema de abastecimento de água no povoado Batinga. Existe: Poço profundo (320 m) - Falta: Reservatório, equipamento (motor, gerador, bomba, canos, etc.), rede de distribuição.
Data de Início: 01/09/94 **Data de Paralisação:** 30/11/94 **Percentual Concluído:** 60
Valor para Conclusão: R\$35.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PI

Município : IPIRANGA DO PIAUI **Código:** 100229 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Sistema de abastecimento de água no povoado Jardim. Existe: Poço profundo e reservatório, construído pela Fundação Nacional de Saúde. Falta: Equipamento e rede de distribuição.

Data de Início: 01/07/94 **Data de Paralisação:** 30/11/94 **Percentual Concluído:** 80

Valor para Conclusão: R\$25.000,00

Município : IPIRANGA DO PIAUI **Código:** 100230 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Sistema de abastecimento de água no povoado Brejo da Fortaleza. EXISTE: POÇO PROFUNDO E RESERVATÓRIO com capacidade para 10.000 (dez mil) litros. FALTA; EQUIPAMENTO (bomba, canos, etc.) e rede de distribuição.

Data de Início: 01/08/94 **Data de Paralisação:** 30/11/94 **Percentual Concluído:** 80

Valor para Conclusão: R\$30.000,00

Município : ITAINOPOLIS **Código:** 201040 **Ministérios**
Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : LUIS CORREIA **Código:** 100354 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Porto

Data de Início: 01/01/72 **Data de Paralisação:** 31/12/76 **Percentual Concluído:** 10

Valor para Conclusão: R\$8.000.000,00

Município : NAZARE DO PIAUI **Código:** 200032 **Ministérios**
Descrição da Obra: Barragem Salinas, de terra homogênea, com 22,30 m de altura máxima, extensão de 435,00 m, com um volume total de 407.000 m³ de terra, e capacidade para acumular 387.407.000 m³ de água.

Data de Início: 27/04/92 **Data de Paralisação:** 30/11/93 **Percentual Concluído:** 2,37

Valor para Conclusão: R\$55.392.801,00

Município : OEIRAS **Código:** 201041 **Ministérios**
Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **PI**

Município : **OEIRAS** Código: 201042 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **PALMEIRA DO PIAUI** Código: 100285 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Quadra de esportes (poliesportiva)
Data de Início: 02/01/88 Data de Paralisação: 31/12/88 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$35.000,00

Município : **PARNAGUA** Código: 201043 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **PARNAIBA** Código: 200009 Ministérios
Descrição da Obra: Obras de implantação do projeto de irrigação Tabuleiros Litorâneos.
Data de Início: 30/06/87 Data de Paralisação: 30/06/93 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$12.800.000,00

Município : **PARNAIBA** Código: 100345 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Perímetro de irrigação tabuleiros litorâneos com área prioritária de 750 Ha.
Data de Início: 02/01/87 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$9.000.000,00

Município : **PARNAIBA** Código: 100431 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Unidade de execução de pesquisas do Centro de Pesquisas Agropecuárias do Meio-Norte (antigo CNPAI).
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PI

Município : PARNAIBA Código: 100432 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sistema de drenagem pluvial - micro-drenagem da região central da cidade de Parnaíba.

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PARNAIBA Código: 100433 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Canal de Retificação do Rio Igarau.

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : PARNAIBA Código: 100434 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Linhas de transmissão Piripiri - Parnaíba (regularizar a oferta de energia e suprir a demanda dos projetos de irrigação - Tabuleiros Litorâneos).

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PARNAIBA Código: 100435 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Subestação para projeto de irrigação Tabuleiros Litorâneos.

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PARNAIBA Código: 200117 Ministérios

Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE AGRICULTURA IRRIGADA - CNFAI.

Data de Início: 20/06/88 Data de Paralisação: 18/06/90 Percentual Concluído: 25

Valor para Conclusão: R\$1.100.000,00

Município : PEDRO II Código: 200033 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Joana. Barragem de terra homogênea, com 33,00 m de altura máxima, 322,00 m de extensão, com um volume de 432,600 m³ de terra, e capacidade para acumular 14,200 m³ de água.

Data de Início: 27/08/84 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão: R\$2.100.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PI

Município : PEDRO II **Código:** 100344 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Açude Joana, capacidade 10 milhões de m³.
Data de Início: 02/01/84 **Data de Paralisação:** 31/12/94 **Percentual Concluído:** 40
Valor para Conclusão: R\$2.100.000,00

Município : PICOS **Código:** 201044 **Ministérios**
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : PIMENTEIRAS **Código:** 100194 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Estrada de Pimenteiras a Valença do Piauí com distância de 43 Km.
Data de Início: **Data de Paralisação:** 31/12/82 **Percentual Concluído:** 15
Valor para Conclusão:

Município : PIMENTEIRAS **Código:** 100195 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Açude Baixas.
Data de Início: **Data de Paralisação:** 31/12/83 **Percentual Concluído:** 30
Valor para Conclusão:

Município : PIMENTEIRAS **Código:** 100196 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Açude Veneza
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 40
Valor para Conclusão:

Município : PIMENTEIRAS **Código:** 100197 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Açude Oiti.
Data de Início: **Data de Paralisação:** 31/12/83 **Percentual Concluído:** 30
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PI

Município : PIMENTEIRAS Código: 100198 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Açude Saco da Pinicada (Lagoa do Sambito)
Data de Início: Data de Paralisação: 31/12/83 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:

Município : PIRACURUCA Código: 200007 Ministérios
Descrição da Obra: Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Piracuruca (barragem e perímetro de irrigação com 2.100 ha).
Data de Início: 10/07/90 Data de Paralisação: 30/09/93 Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$57.600.000,00

Município : PIRACURUCA Código: 100353 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Barragem de Piracuruca, capacidade 250 milhões de m³
Data de Início: 01/01/88 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão: R\$1.200.000,00

Município : PIRACURUCA Código: 100355 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Projeto de irrigação de 1.200 Ha, associado à Barragem de Piracuruca.
Data de Início: 01/01/92 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$13.300.000,00

Município : PIRACURUCA Código: 100881 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola Agrícola de Piracuruca - PI
Data de Início: 01/10/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$75.000,00

Município : PIRACURUCA Código: 100882 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Melhoramento da Rodovia BR-222 - Santo Antonio/Sobradinho
Data de Início: 01/12/93 Data de Paralisação: 31/01/94 Percentual Concluído: 7,83
Valor para Conclusão: R\$600.000,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município :	PIRACURUCA	Código:	100883	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de pavimentação de estradas vicinais - Povoado Tibalde/Coqueiro			
Data de Início:	01/10/93	Data de Paralisação:	30/11/93	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$300.000,00			

Município : PORTO **Código:** 100356 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Projeto de irrigação com 500 Ha irrigáveis, dos quais 100 Ha já concluídos.
Data de Início: 01/01/92 **Data de Paralisação:** 31/12/93 **Percentual Concluído:** 20
Valor para Conclusão: R\$2.800.000,00

Município :	SAO FRANCISCO DO PIAUI	Código:	100350	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Açude Salinas, capacidade 387 milhões de m³.			
Data de Início:	01/01/92	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído: 21
Valor para Conclusão:	R\$23.783.000,00			

Município : SAO GONCALO DO PIAUI **Código:** 100351 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Açude Jenipapo, capacidade 185 milhões de m³
Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** 31/12/93 **Percentual Concluído:** 21
Valor para Conclusão: R\$19.228.000,00

Município : SAO JOAO DA SERRA **Código:** 201046 **Ministérios**
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluido:** 90
Valor para Conclusão: R\$200.000,00

Município :	SAO JOAO DO PIAUI	Código:	200035	Ministérios
Descrição da Obra:	Barragem Jenipapo. Barragem de enrocamento, com altura máxima de 57,00 m e extensão 360,00m com volume total de 608,000 m³ de material, e capacidade de acumular 185,000,000 m³ de água.			
Data de Início:	19/03/90	Data de Paralisação:	31/10/93	Percentual Concluído: 21
Valor para Conclusão:	R\$19.228.000,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PI

Município : SAO RAIMUNDO NONATO

Código: 200034 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Petronio Portella. Barragem de terra zoneada, com 36,70m de altura máxima, 962,00 m de extensão, com um volume para acumular 181.248.000 m³ de água.

Data de Início: 01/10/90

Data de Paralisação: 30/11/93

Percentual Concluído: 87,2

Valor para Conclusão: R\$4.082.000,00

Município : SAO RAIMUNDO NONATO

Código: 100342 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Açude Petronio Portela, capacidade 181 milhões de m³.

Data de Início: 02/01/82

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 77

Valor para Conclusão:

R\$4.082.000,00

Município : SANTA CRUZ DO PIAUI

Código: 201045 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SIMPLICIO MENDES

Código: 100005 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR-020, que vai de Brasília a Fortaleza. Trecho a concluir de São Raimundo Nonato a Picos. Onde se encontra no momento piçarrada.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

R\$4.000.000,00

Município : TERESINA

Código: 100114 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Anel Viário de Teresina - Recuperação e alargamento da BR-316, acesso a Teresina, com a implantação de avenidas marginais e execução de viaduto de transposição.

Data de Início: 01/11/93

Data de Paralisação: 28/02/94

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

R\$3.350.000,00

Município : TERESINA

Código: 100115 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ponte sobre o Rio Poti - Ponte de 252m em esteira mista, vigas metálicas e tabuleiro em concreto pré-moldado.

Data de Início: 01/06/92

Data de Paralisação: 30/03/94

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

R\$4.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **PI**

Município : TERESINA **Código:** 100116 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Pronto Socorro de Teresina - Construção de Unidade de Saúde com 95 leitos (o projeto inicial previa 185 leitos), para atendimento de urgência.**Data de Início:** 01/08/91 **Data de Paralisação:** 31/01/95 **Percentual Concluído:** 24,8**Valor para Conclusão:** R\$3.950.000,00

Município : TERESINA **Código:** 201047 **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Universitário**Data de Início:** 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 37**Valor para Conclusão:**

Município : TERESINA **Código:** 100348 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (UFPI) ÁREA DE CONSTRUÇÃO 18.646 M², COM 196 LEITOS.**Data de Início:** 01/01/89 **Data de Paralisação:** 31/12/94 **Percentual Concluído:** 36,2**Valor para Conclusão:** R\$15.360.400,00

Município : TERESINA **Código:** 200067 **Ministérios****Descrição da Obra:** Reforma da Penitenciária "Major Cesar de Oliveira" - PI**Data de Início:** 22/10/92 **Data de Paralisação:** 23/11/92 **Percentual Concluído:** 80**Valor para Conclusão:** R\$300.000,00

Município : URUCUI **Código:** 200430 **Ministérios****Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convenios com as prefeituras**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:**

Município : VALENCA DO PIAUI **Código:** 100349 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Barragem Mesa de Pedra, capacidade 55 milhões de m³.**Data de Início:** 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:** R\$3.500.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PI

Unidade da Federação: PI

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios : R\$182.216.047,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios : 30

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios: R\$176.839.097,00

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios : 42

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : PARANÁ Código: 100651 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Duplicação da BR-116, trecho Curitiba - Divisa PR/SP
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PARANÁ Código: 100652 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da nova Ferrovia Curitiba - Paranaguá
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PARANÁ Código: 100653 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Duplicação da BR-376 trecho Curitiba - Garuva, numa extensão de 74 km.
Construção em dois lotes
Data de Início: 07/01/88 Data de Paralisação: 15/12/90 Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão:

Município : PARANÁ Código: 100654 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Pavimentação asfáltica da BR-487, trecho Campo Mourão - Cruzeiro do Oeste, com
extensão de 75,4 km.
Data de Início: 15/01/87 Data de Paralisação: 19/11/91 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : ALTO PARANA Código: 201048 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : ALTONIA Código: 100598 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Pronto Socorro com área de 180,00 m² na localidade de Jardim
Panorama.
Data de Início: 06/12/90 Data de Paralisação: 18/03/92 Percentual Concluído: 26
Valor para Conclusão: R\$57.970,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : AMPERE Código: 100087 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação em alvenaria de 209,25m² na Esc. Mun. Prof. Leopoldo de Witt, Bairro Cooperativa.
Data de Início: 08/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 99
Valor para Conclusão:

Município : AMPERE Código: 100088 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção em alvenaria de uma Unidade Escolar, com 160,76m². (Escola Conjunto Cohapar Floresta).
Data de Início: 08/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 99
Valor para Conclusão:

Município : AMPERE Código: 100089 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação em alvenaria de 156,40m², na Pré-escola Pernalonga, Centro, Rua Brasília.
Data de Início: 08/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 99
Valor para Conclusão:

Município : ANDIRA Código: 100049 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Pontilhão sobre a BR - 369
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : ANTONINA Código: 100599 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Posto de Saúde com 174,00 m² no bairro Portinho.
Data de Início: 19/11/90 Data de Paralisação: 23/10/91 Percentual Concluído: 42
Valor para Conclusão: R\$40.135,00

Município : APUCARANA Código: 100618 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Uma estação de tratamento de esgotos, três estações elevatórias de esgoto, linha de recalque, interceptor, rede coletora de esgotos e ligações prediais.
Data de Início: 01/08/94 Data de Paralisação: 30/12/94 Percentual Concluído: 13
Valor para Conclusão: R\$1.300.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

14-nov-95

Unidade da Federação: PR**Município: ARAPONGAS****Código: 100619** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, emissário, interceptor, estação de tratamento de esgotos e ligações.**Data de Início:** 01/10/94 **Data de Paralisação:** 30/01/95 **Percentual Concluído:** 30**Valor para Conclusão:**

R\$2.000.000,00

Município: ARAUCARIA**Código: 201049** Ministérios**Descrição da Obra:** Unidade de Saúde**Data de Início:** 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 30**Valor para Conclusão:** R\$1.047.000,00**Município: ASSAI****Código: 100639** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Escola integrada de Assaí, composta de 06 salas de aula e demais dependências, locada nos lotes 80 e 81 na sede do município. área de 686,41 m²**Data de Início:** 08/01/92 **Data de Paralisação:** 21/08/93 **Percentual Concluído:** 65**Valor para Conclusão:**

R\$100.000,00

Município: ASSIS CHATEAUBRIAND**Código: 100636** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Unidade escolar em alvenaria com 15 salas de aula, biblioteca, sanitários e dependências administrativas, área total da escola de 2.847,6m²**Data de Início:** 01/02/91 **Data de Paralisação:** 30/08/91 **Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:**

R\$805.769,00

Município: ASSIS CHATEAUBRIAND**Código: 201050** Ministérios**Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 46**Valor para Conclusão:** R\$320.000,00**Município: ASTORGA****Código: 201051** Ministérios**Descrição da Obra:** Unidade de Saúde**Data de Início:** 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 39**Valor para Conclusão:** R\$166.942,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : **BARBOSA FERRAZ** Código: 100416 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Regional com 30 (trinta) leitos.
Data de Início: 01/08/88 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 75
Valor para Conclusão: R\$250.000,00

Município : **BARRACAO** Código: 201052 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **BELA VISTA DO PARAISO** Código: 201053 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **BELA VISTA DO PARAISO** Código: 100053 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Reforma e ampliação de Hospital Municipal.
Data de Início: 19/08/91 Data de Paralisação: 30/06/92 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$63.508,00

Município : **BOCAIUVA DO SUL** Código: 201054 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **BORRAZOPOLIS** Código: 201055 Ministérios
Descrição da Obra: Centro de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$9.500,00

14-nov-95

SENADO FEDERAL
COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS
 INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : BORRAZOPOLIS Código: 100623 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Construção de um Posto de Saúde, com área de 88,66 m², na Vila Bom Jesus.
 Data de Início: 30/05/94 Data de Paralisação: 11/11/94 Percentual Concluído: 60
 Valor para Conclusão: R\$9.500,00

Município : BORRAZOPOLIS Código: 100684 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Ampliação de 03 salas de aula na Escola Rural Bairro do Ouro Verde
 Data de Início: 08/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 80
 Valor para Conclusão:

Município : CAMBARA Código: 200238 Ministérios
 Descrição da Obra: Construção e ampliação de Obras de Arte Especiais na BR-369/PR, trecho div. SP/PR - Jataizinho, sendo três viadutos e cinco pontes, extensão total 236,55m.
 Data de Início: 05/10/93 Data de Paralisação: 01/01/95 Percentual Concluído: 30
 Valor para Conclusão: R\$931.932,00

Município : CAMBIRA Código: 100042 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Construção de um hospital com área de 2.162.00 m², com capacidade inicial de 20 leitos. Faltam vidros, piso, azulejo e instalações sanitárias. Devido ao longo tempo de execução (07 anos), com várias interrupções, há infiltração de águas por todos os lados
 Data de Início: 31/12/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 70
 Valor para Conclusão: R\$150.000,00

Município : CAMPINA DA LAGOA Código: 201056 Ministérios
 Descrição da Obra: Posto de Saúde
 Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 15
 Valor para Conclusão: R\$21.000,00

Município : CAMPO MOURAO Código: 100046 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Anel Viário
 Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: 30/05/94 Percentual Concluído: 22,7
 Valor para Conclusão: R\$2.640.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : CAMPO MOURAO Código: 100134 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Rodoviária Regional de Centro de Atendimento ao Turista, compreendendo 9.250,50 m². Executado somente a terraplenagem.
Data de Início: Data de Paralisação: 30/07/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : CAMPO MOURAO Código: 100135 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução de 36.661 m de rede; 1.667 ligações domiciliares.
Data de Início: 02/01/94 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 82
Valor para Conclusão: R\$174.835,00

Município : CAMPO MOURAO Código: 100136 Estados / Municípios
Descrição da Obra: 3.122 ligações domiciliares, 1 estação de tratamento de esgoto completo.
Data de Início: 02/01/95 Data de Paralisação: 31/05/95 Percentual Concluído: 24
Valor para Conclusão: R\$1.079.115,00

Município : CAMPO MOURAO Código: 200240 Ministérios
Descrição da Obra: Obras de Terraplanagem e Pavimentação da rodovia BR-487PR, trecho Campo Mourão - Cruzeiro do Oeste, lote 01, extensão de 33,54 km.
Data de Início: 16/09/88 Data de Paralisação: 01/07/90 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$5.260.000,00

Município : CAMPO MOURAO Código: 100137 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Pavimentação na BR 487 - Estrada Boiadeira, nas regiões Centro Oeste e Noroeste do Estado. Esta obra teve 51 Km do total de 80,41 Km terraplanada e 20,2 Km pavimentada, recebendo ainda canaletas e pontes.
Data de Início: 15/01/87 Data de Paralisação: 01/02/89 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$12.000.000,00

Município : CAMPO MOURAO Código: 100138 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Projeto na modalidade Produção de Moradias para construção de 750 unidades em alvenaria com 32,40 m².
Data de Início: 30/10/93 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão: R\$5.000.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

14-nov-95

Unidade da Federação: PR

Município : CAMPO MOURAO

Código: 200557 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/07/94 Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : CAMPO MOURAO

Código: 201057 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 92,6

Valor para Conclusão: R\$113.516,00

Município : CAMPO MOURAO

Código: 201058 Ministérios

Descrição da Obra: Santa Casa

Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : CANDOI

Código: 200235 Ministérios

Descrição da Obra: Melhoramentos e restaurações n BR-277/PR, trecho Guarapuava-entr. PR-473(Laranjeiras do Sul), subtrecho km 405 ao km 436, extensão de 31km.

Data de Início: 02/09/94 Data de Paralisação: 29/06/95 Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$7.231.460,00

Município : CANTAGALO

Código: 100231 Estados / Municípios

Descrição da Obra: RODOVIA BR 277 - TRECHO GUARAPUAVA-ENTR. PR 473 (LAR. DO SUL), SUBTRECHO KM 405 ao 436, ext, 31 km - Serviços de melhoramentos e restauração, inclusive implantação e pavimentação da variante do Rio Cantagalo e da travessia urbana em Cantagalo.

Data de Início: 24/12/87 Data de Paralisação: 11/09/92 Percentual Concluído: 29,3

Valor para Conclusão: R\$7.231.460,00

Município : CASCAVEL

Código: 100620 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários, rede coletora, interceptor, ligações prediais.

Data de Início: 02/01/94 Data de Paralisação: 30/11/94 Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão:

R\$801.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : CASCAVEL

Código: 200558 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 27/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : CASTRO

Código: 100621 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários, interceptor, emissários, estação elevatória final.

Data de Início: 01/09/94

Data de Paralisação: 30/04/95

Percentual Concluído: 57

Valor para Conclusão:

R\$641.510,00

Município : CEU AZUL

Código: 201059 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 98

Valor para Conclusão:

Município : CIANORTE

Código: 100622 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, emissário, interceptor, estação de tratamento de esgotos, 03 ral's, leito de secagem, elev. de lodo e ligações prediais.

Data de Início: 01/04/94

Data de Paralisação: 30/04/95

Percentual Concluído: 85

Valor para Conclusão:

R\$125.000,00

Município : CORNELIO PROCOPIO

Código: 200559 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 23/07/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : CURITIBA

Código: 100600 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Reforma e readequação do Hospital Victor do Amaral com área de aproximadamente 2.500,00 m².

Data de Início: 21/07/93

Data de Paralisação: 23/08/94

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

R\$334.780,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município :	CURITIBA	Código:	100614	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Construção do Contorno Leste de Curitiba, numa extensão total de 26,6 km.				
Data de Início:	07/11/88	Data de Paralisação:	01/03/90	Percentual Concluído:	3,62
Valor para Conclusão:	R\$20.000.000,00				

Município :	CURITIBA	Código:	100617	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Duplicação do contorno sul de Curitiba				
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:					

Município :	CURITIBA	Código:	100624	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, coletor tronco, interceptor e ligações prediais.				
Data de Início:	01/02/94	Data de Paralisação:	30/01/95	Percentual Concluído:	3
Valor para Conclusão:	R\$4.675.000,00				

Município :	CURITIBA	Código:	200232	Ministérios	
Descrição da Obra:	Melhoramentos e restaurações com implantação de ruas marginais na BR-116/PR - (Perímetro urbano de Curitiba) extensão de 15,75 km.				
Data de Início:	16/10/89	Data de Paralisação:	01/01/94	Percentual Concluído:	21
Valor para Conclusão:	R\$18.582.150,00				

Município :	CURITIBA	Código:	201060	Ministérios	
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde				
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	6
Valor para Conclusão:	R\$17.962.058,00				

Município :	CURITIBA	Código:	201061	Ministérios	
Descrição da Obra:	Pronto Socorro Norte				
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:					

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : CURITIBA

Código: 201062 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Psiquiátrico

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CURIUVA

Código: 100601 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Posto de Saúde na localidade de Espigão Bonito c/ área de 43,00m².

Data de Início: 30/08/90

Data de Paralisação: 01/04/93

Percentual Concluído: 56

Valor para Conclusão:

R\$6.334,00

Município : DOIS VIZINHOS

Código: 200469 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : DOUTOR CAMARGO

Código: 201063 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

Município : DOUTOR CAMARGO

Código: 100460 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital municipal com 904,91 metros quadrados, e uma composição de 20 leitos.

Data de Início: 01/08/90

Data de Paralisação: 31/03/93

Percentual Concluído: 24

Valor para Conclusão:

R\$360.000,00

Município : ENGENHEIRO BELTRAO

Código: 100045 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Implantação de sistema de esgotamento sanitário do Programa Prosege - MBES.

Data de Início: 01/09/94

Data de Paralisação: 01/03/95

Percentual Concluído: 44,18

Valor para Conclusão:

R\$251.318,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : FLORAI Código: 100602 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Reforma e ampliação do Hospital Municipal com área de 306,00m².
Data de Início: 29/07/91 Data de Paralisação: 24/09/92 Percentual Concluído: 44
Valor para Conclusão: R\$57.367,00

Município : FLORESTOPOLIS Código: 100408 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Unidade Escolar com 355,74 m² - 04 salas de aulas - destinadas ao ensino fundamental para atendimento à cerca de 300 alunos.
Data de Início: 01/01/92 Data de Paralisação: 30/11/92 Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão: R\$40.000,00

Município : FOZ DO IGUAÇU Código: 100625 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários: Rede coletora, ligações prediais, interceptores, tratamento, elevatória, linha de recalque.
Data de Início: 01/10/94 Data de Paralisação: 30/04/95 Percentual Concluído: 3
Valor para Conclusão: R\$1.150.000,00

Município : FOZ DO IGUAÇU Código: 200560 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 04/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : GRANDES RIOS Código: 100603 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Posto de Saúde em Adolfo Pinto com área de 43,00m².
Data de Início: 30/08/90 Data de Paralisação: 10/10/91 Percentual Concluído: 87
Valor para Conclusão: R\$1.871,00

Município : GUARACI Código: 201064 Ministérios
Descrição da Obra: Núcleo de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$91.792,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município :	GUARACI	Código:	100054	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Núcleo Integrado de Saúde - c/ 545 m².			
Data de Início:	01/03/94	Data de Paralisação:	01/11/94	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$90.000,00			

Município : GUARAPUAVA **Código:** 200234 **Ministérios**

Descrição da Obra: Melhoramentos e restaurações na BR-277/PR, trecho Guarapuava-entr. PR-473 (Laranjeiras do Sul), subtrecho km 352 ao km 405, extensão de 53 km.

Data de Início: 12/09/94 **Data de Paralisação:** 29/06/95 **Percentual Concluído:** 0

Valor para Conclusão: R\$9.186.927,00

Município : GUARAPUAVA **Código:** 200468 **Ministérios**

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50

Valor para Conclusão:

Município : IBEMA	Código: 201065	Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal		
Data de Início: 01/01/91	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão:		

Município :	IBEMA	Código:	100043	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Prédio de alvenaria, com 01 pavimento, contendo uma área de 1.070.82 m², destinado ao hospital municipal.			
Data de Início:	01/06/91	Data de Paralisação:	01/03/93	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$95.000,00			

Município : ICARAIMA **Código:** 200243 **Ministérios**

Descrição da Obra: Construção da ponte sobre o rio Paraná e seus acessos, na BR-487/PR em Porto Camargo, lote 01 - Terraplanagem e Pavimentação de acessos, extensão 10.039,50m.

Data de Início: 25/11/87 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0

Valor para Conclusão: R\$24.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **PR**

Município : ICARAIMA **Código:** 100613 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção de ponte rodoviária sobre o Rio Paraná em Porto Camargo.**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : ICARAIMA **Código:** 200244 **Ministérios****Descrição da Obra:** Construção da ponte sobre o rio Paraná e seus acessos, na BR-487/PR em Porto Camargo, lote 02 - Terraplanagem e Pavimentação de acessos, extensão 6.738,000m.**Data de Início:** 25/11/87 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0**Valor para Conclusão:** R\$26.000.000,00

Município : ICARAIMA **Código:** 100690 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Ponte sobre o Rio Paraná, na localidade Porto Camargo, situado às margens do Rio Paraná. A obra visa a ligação Paraná/Mato Grosso do Sul. É um complexo de 04 (quatro) pontes.**Data de Início:** 01/06/87 **Data de Paralisação:** 31/12/91 **Percentual Concluído:** 27,6**Valor para Conclusão:** R\$101.511.828,00

Município : ICARAIMA **Código:** 200245 **Ministérios****Descrição da Obra:** Construção da ponte s/ o rio Paraná e seus acessos, na BR-487/PR em Porto Camargo, lote 03 - Pontes sobre: canal leste 1.476 m, canal oeste 699 m, rio Amambai 373 m e Rib. do Veado 125 m Ext. t. 2.673 m**Data de Início:** 25/11/87 **Data de Paralisação:** 30/04/90 **Percentual Concluído:** 30**Valor para Conclusão:** R\$39.000.000,00

Município : IGUARACU **Código:** 100610 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Hospital Municipal de Iguaçu, com 618,14m².**Data de Início:** 01/12/93 **Data de Paralisação:** 30/05/95 **Percentual Concluído:** 85**Valor para Conclusão:** R\$50.000,00

Município : IPORA **Código:** 100626 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, emissário, interceptor, estação de tratamento, ligações prediais.**Data de Início:** 01/03/94 **Data de Paralisação:** 30/05/95 **Percentual Concluído:** 60**Valor para Conclusão:** R\$460.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município :	IRATI	Código:	100552	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	POSTO DE SAÚDE COM 320,00 M ² , NO BAIRRO CANISIANAS, SITO NA RUA BENJAMIN CONSTANT ESQUINA COM A RUA EDGARD TÁVORA.				
Data de Início:	28/02/94	Data de Paralisação:	30/06/95	Percentual Concluído:	50
Valor para Conclusão:	R\$120.000,00				

Município :	IRATI	Código:	100553	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS BAIRROS SÃO FRANCISCO E RIO BONITO, TOTALIZANDO 46.000,00 M ² , INCLUINDO DRENAGEM.				
Data de Início:	30/11/93	Data de Paralisação:	31/07/94	Percentual Concluído:	50
Valor para Conclusão:	R\$450.000,00				

Município :	IRATI	Código:	200561	Ministérios	
Descrição da Obra:	CAICS				
Data de Início:	04/10/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	1
Valor para Conclusão:					

Município :	ITAMBE	Código:	100189	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Hospital Municipal c/ uma metragem de 1.501,09 metros quadrados, e uma composição de 25 leitos. Sendo que o projeto original previa uma construção em alvenaria c/ área de 829,30 m ² , ocorrendo uma ampliação de 671,79 m ² .				
Data de Início:	02/05/94	Data de Paralisação:	14/03/95	Percentual Concluído:	28,76
Valor para Conclusão:	R\$453.000,00				

Município :	ITAMBE	Código:	200233	Ministérios	
Descrição da Obra:	Melhoramentos e restauração na BR-153/PR, trecho entr. BR-369 (B) - Santo Antonio da Platina, subtrecho km 1,0 ao 42,9 extensão 41,9 km.				
Data de Início:	03/05/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	97
Valor para Conclusão:	R\$795.248,00				

Município :	ITAMBE	Código:	201066	Ministérios	
Descrição da Obra:	Hospital Municipal				
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	29
Valor para Conclusão:					

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : KALORE Código: 100604 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da rede de água adutora, construção da casa de bombas, construção do reservatório de 350.000 lts., casa de química, escritório e almoxarifado.
Data de Início: 12/10/94 Data de Paralisação: 15/02/95 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$60.000,00

Município : LIDIANOPOLIS Código: 100640 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Prédio em alvenaria contendo 2 salas de aula e 2 WC, forro em madeira, cobertura em fibro-cimento, piso cerâmico.
Data de Início: 01/06/94 Data de Paralisação: 30/10/94 Percentual Concluído: 42
Valor para Conclusão: R\$13.000,00

Município : LONDRINA Código: 100627 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Estação de tratamento sul, estação de tratamento norte, estação de recalque 2 e 3.
Data de Início: 01/10/87 Data de Paralisação: 30/04/89 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município : LONDRINA Código: 100642 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola de 1º Grau de 5ª a 8ª série, com terminalidade em agropecuária, composta de 05 salas de aula, secretaria, ambulatório, diretoria, biblioteca, laboratório, refeitório, cozinha, res. de administrador, vestiários, estábulo, aviário de corte, aviário d
Data de Início: 01/10/92 Data de Paralisação: 30/12/93 Percentual Concluído: 13
Valor para Conclusão: R\$347.000,00

Município : LONDRINA Código: 200562 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 04/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : LUIZIANA Código: 201067 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 47
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **PR**

Município : **LUIZIANA** Código: 100645 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 14/08/90 Data de Paralisação: 15/04/94 Percentual Concluído: 45
Valor para Conclusão: R\$230.000,00

Município : **LUNARDELLI** Código: 100605 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Posto de Saúde com área de 43,00m² na localidade de Água Feia.
Data de Início: 20/03/92 Data de Paralisação: 10/03/93 Percentual Concluído: 26
Valor para Conclusão: R\$10.652,00

Município : **MAMBORE** Código: 100628 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, emissário e estação de tratamento de esgotos.
Data de Início: 01/03/94 Data de Paralisação: 30/12/94 Percentual Concluído: 73
Valor para Conclusão: R\$140.000,00

Município : **MAMBORE** Código: 201068 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 55
Valor para Conclusão:

Município : **MANDAGUARI** Código: 100334 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola Técnica Agrícola. Profissionalizante com área de 355,72 m² localizada no Centro de Produção Municipal.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$70.000,00

Município : **MANGUEIRINHA** Código: 201069 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$50.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : MANGUEIRINHA **Código:** 100641 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Construção do Centro de Saúde de Manguueirinha, área de 260,00 m²
Data de Início: 23/03/94 **Data de Paralisação:** 30/07/94 **Percentual Concluído:** 45
Valor para Conclusão: R\$50.000,00

Município : MARECHAL CANDIDO RONDON **Código:** 100643 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Construção da Rede de Esgoto - 2ª etapa. Aproximadamente 31.500 m de rede e 1.900 ligações domiciliares.
Data de Início: 12/09/94 **Data de Paralisação:** 30/07/95 **Percentual Concluído:** 42
Valor para Conclusão: R\$500.000,00

Município : MARINGA **Código:** 100629 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, emissário, ligações prediais.
Data de Início: 01/09/94 **Data de Paralisação:** 30/06/95 **Percentual Concluído:** 69
Valor para Conclusão: R\$1.389.000,00

Município : MARINGA **Código:** 100644 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Ginásio de esportes - complexo esportivo Jaime Canet Junior
Data de Início: 05/07/91 **Data de Paralisação:** 30/11/92 **Percentual Concluído:** 30,97
Valor para Conclusão: R\$718.046,00

Município : MARINGA **Código:** 100995 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Contorno Norte de Maringá com início na PR 317 transpondo a PR 323, a BR 376, a PR 317 e terminando na BR 376 com extensão de 27624,82 m
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão: R\$20.000.000,00

Município : MARINGA **Código:** 200563 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 25/08/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 86
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : MARIOPOLIS

Código: 201070 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : NOVA ESPERANCA

Código: 100630 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, ligações prediais, estação de tratamento de esgotos.

Data de Início: 01/06/94

Data de Paralisação: 30/12/94

Percentual Concluído: 58

Valor para Conclusão:

R\$45.000,00

Município : NOVO ITACOLOMI

Código: 201071 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 65,5

Valor para Conclusão: R\$184.000,00

Município : PAICANDU

Código: 100608 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Hospital Municipal com área de 1.773,02m².

Data de Início: 17/09/91

Data de Paralisação: 13/04/93

Percentual Concluído: 49

Valor para Conclusão:

R\$393.537,00

Município : PAICANDU

Código: 100631 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação de sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, ligações prediais, estação de tratamento de esgotos

Data de Início: 01/10/94

Data de Paralisação: 30/12/94

Percentual Concluído: 55

Valor para Conclusão:

R\$258.000,00

Município : PARANACITY

Código: 100290 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Sistema de esgoto sanitário. Rede coletora de esgotos.

Data de Início: 01/08/94

Data de Paralisação: 31/03/95

Percentual Concluído: 63

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : PARANAGUA Código: 200128 Ministérios
Descrição da Obra: Execução das obras do retroporto do Porto de Paranaguá, constando de aterro hidráulico com 1.000.000 de metros cúbicos e pavimentação de 160.000m² de pátio para contêineres.

Data de Início: 31/12/88 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 24,47

Valor para Conclusão: R\$37.811.062,00

Município : PARANAGUA Código: 100615 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do terminal de contêineres: Ampliação do cais à leste / Dragagem e aterro hidráulico. Pavimentação do retroporto.

Data de Início: 27/02/87 Data de Paralisação: 30/12/93 Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$96.700.000,00

Município : PARANAGUA Código: 200129 Ministérios
Descrição da Obra: Execução do Sistema de Energia Elétrica para o Terminal para Contêineres do Porto de Paranaguá.

Data de Início: 31/05/89 Data de Paralisação: 31/01/95 Percentual Concluído: 79,87

Valor para Conclusão: R\$694.809,00

Município : PARANAGUA Código: 100616 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do terminal de contêineres - Instalações Elétricas.

Data de Início: 01/07/92 Data de Paralisação: 30/12/94 Percentual Concluído: 15

Valor para Conclusão: R\$5.100.000,00

Município : PARANAGUA Código: 200564 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/07/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 89

Valor para Conclusão:

Município : PARANAVAI Código: 100632 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, ligações prediais.

Data de Início: 01/04/94 Data de Paralisação: 30/06/95 Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão: R\$100.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município :	PATO BRANCO	Código:	100633	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, ligações prediais e interceptor.			
Data de Início:	01/11/94	Data de Paralisação:	30/03/95	Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão:	R\$1.000.000,00			

Município :	PATO BRANCO	Código:	200565	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	25/08/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 79
Valor para Conclusão:				

Município :	PIEN	Código:	201072	Ministérios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde			
Data de Início:	01/01/90	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão:				

Município :	PINHAIS	Código:	100634	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, coletor tronco, interceptor, linha de recalque, estação elevatória, ligações domiciliares, estação de tratamento de esgotos.			
Data de Início:	01/03/94	Data de Paralisação:	30/01/95	Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:	R\$4.290.000,00			

Município :	PONTA GROSSA	Código:	100635	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Ligações prediais, rede coletora, interceptor.			
Data de Início:	01/08/94	Data de Paralisação:	30/04/95	Percentual Concluído: 13
Valor para Conclusão:	R\$1.393.000,00			

Município :	PONTA GROSSA	Código:	200239	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção da Ponte sobre o Rio Tibagi e seus acessos na BR-373/PR, trecho entr. BR-376 - entr. BR-277, extensão 0,170 km.			
Data de Início:	02/05/95	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$1.744.922,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : PONTA GROSSA

Código: 201073 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PRANCHITA

Código: 100139 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de um Hospital para 40 leitos, com área de 2.500 m² - construído pela Fundação Nacional de Saúde.

Data de Início: 01/01/88

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$450.000,00

Município : PRES.CASTELO BRANCO

Código: 100609 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do Hospital com área de 228,0m²

Data de Início: 30/08/90

Data de Paralisação: 09/04/92

Percentual Concluído: 49

Valor para Conclusão:

R\$50.606,00

Município : PRUDENTOPOLIS

Código: 100606 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de escola com 02 salas de aula, 01 sala de administração, 01 depósito, 01 cantina. Área total de 194,00m².

Data de Início: 01/06/92

Data de Paralisação: 30/11/92

Percentual Concluído: 42,38

Valor para Conclusão:

R\$33.534,00

Município : PRUDENTOPOLIS

Código: 100607 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma creche, com área total de 320,00m².

Data de Início: 02/01/92

Data de Paralisação: 30/10/92

Percentual Concluído: 31,92

Valor para Conclusão:

R\$65.356,00

Município : QUITANDINHA

Código: 100461 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de (4) quatro salas de aulas e as demais dependências, na localidade de Campina.

Data de Início: 09/09/93

Data de Paralisação: 05/02/94

Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Município : RIO BRANCO DO SUL

Código: 201074 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/91**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido: 25

Valor para Conclusão:

Município : SAO JOAO

Código: 201077 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão: R\$120.000,00

Município : SAO JOAO DO CAIUA

Código: 201078 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 40

Valor para Conclusão: R\$78.500,00

Município : SAO JOSE DOS PINHAIS

Código: 100190 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Rodovia de contorno da cidade de Curitiba. Trechos denominados de "SUL" e "LESTE", extensão de aproximadamente 14 Km em São José dos Pinhais, obras de artes concluídas, terraplanagem e base prontas em +/- 6 Km. Finalidade: Desviar tráfego pesado vindo do

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido: 40

Valor para Conclusão:

Município : **SAO JOSE DOS PINHAIS**

Código: 201079 **Ministérios**

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 30,8

Valor para Conclusão:

Município : **SAO JOSE DOS PINHAIS**

Código: 201080 **Ministérios**

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 69,2

Valor para Conclusão:

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: PR

Código: 201075 **Ministérios**

Percentual Concluido: 30

Valor para Conclusão:

Código: 100044 **Estados / Municipios**

Percentual Concluido: 30

R\$221.378,00

Código: 100050 **Estados / Municípios**

Percentual Concluido: 30

R\$525.000,00

Código: 201076 **Ministérios**

Percentual Concluido: 41

Valor para Conclusão: R\$82.000,00

Código: 100051 **Estados / Municipios**

Percentual Concluido: 60

Valor para Conclusão:

R\$85.000,00

Código: 100637 **Estados / Municipios**

Percentual Concluido: 33

Valor para Conclusão:

R\$315.000,00

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município :	SANTA ISABEL DO IVAI	Código:	100646	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rede de esgoto sanitário, emissário e estação de tratametro de esgoto, com Lagoa Anaerobia e Facultativa.			
Data de Início:	01/03/94	Data de Paralisação:	15/12/94	Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão:	R\$250.000,00			

Município : S.TEREZINHA DE ITAIPU **Código:** 200237 **Ministérios**

Descrição da Obra: Execução de obras de aumento de capacidade e restaurações na BR-277/PR, trecho Paranaguá- Foz do Iguaçu, subtrecho Santa Terezinha do Itaipu - Foz do Iguaçu, km 702 ao km 724,6 extensão de 22,6 km.

Data de Início: 05/08/93 **Data de Paralisação:** 01/01/94 **Percentual Concluído:** 33

Valor para Conclusão: R\$15.910.154,00

Município : S.TEREZINHA DE ITAIPU **Código:** 200566 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 20/07/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1
Valor para Conclusão:

Município :	S.ANTONIO DA PLATINA	Código:	200423	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município : SANTO INACIO **Código:** 100052 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Hospital Municipal de Santo Inácio (Reavaliado para posto 24 horas)

Data de Início: 09/08/91 **Data de Paralisação:** 27/08/92 **Percentual Concluído:** 66,25

Valor para Conclusão: R\$81.680,00

Município :	SARANDI	Código:	100647	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Sistema de tratamento de esgoto doméstico compreendido de: 13.980 m de rede coletora, 790 ligações domiciliares, 01 estação elevatória e 01 estação de tratamento constituída de 01 lagoa anaerobia e 01 facultativa de polimento.			
Data de Início:	02/05/94	Data de Paralisação:	13/02/95	Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:	R\$300.000,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **PR**

Município : TUNEIRAS DO OESTE **Código:** 200241 **Ministérios**
Descrição da Obra: Obras de Terraplanagem e Pavimentação da rodovia BR-487/PR, trecho Campo Mourão - Cruzeiro do Oeste, lote 02, extensão de 20,86 km.
Data de Início: 20/01/87 **Data de Paralisação:** 31/07/89 **Percentual Concluído:** 60
Valor para Conclusão: R\$8.900.000,00

Município : TUNEIRAS DO OESTE **Código:** 200242 **Ministérios**
Descrição da Obra: Obras de Terraplanagem e Pavimentação da rodovia BR-487/PR, trecho Campo Mourão - Cruzeiro do Oeste, lote 03, extensão de 21,01 km.
Data de Início: 16/09/88 **Data de Paralisação:** 31/01/89 **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão: R\$8.600.000,00

Município : TUPASSI **Código:** 100650 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Construção de centro de saúde em alvenaria, composto de enfermarias para homens, mulheres, gestantes, crianças e de isolamento, berçário, sala de cirurgia, portos, expurgo, esterilização, trabalho de parto, circulações, instalações sanitárias de serviços,
Data de Início: 24/02/95 **Data de Paralisação:** 25/03/95 **Percentual Concluído:** 7
Valor para Conclusão: R\$110.000,00

Município : UMUARAMA **Código:** 100638 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotos sanitários. Rede coletora, ligações prediais
Data de Início: 01/04/94 **Data de Paralisação:** 30/06/95 **Percentual Concluído:** 17
Valor para Conclusão: R\$627.000,00

Município : WENCESLAU BRAZ **Código:** 100191 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Obras de drenagem numa área de 36,500 m², sendo na Rua Manoel Antonio Teixeira 12,400 m², Rua João Fayad 5,000 m², Rua Rui Frei Damião 6,000 m², Rua Wadislau Maichak 7,900 m² e coletor 5,200 m².
Data de Início: 13/03/91 **Data de Paralisação:** 13/05/91 **Percentual Concluído:** 30
Valor para Conclusão: R\$16.500,00

Município : WENCESLAU BRAZ **Código:** 100192 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Construção de 100 casas populares e implantação de rede de água potável, esgoto sanitário, galerias de águas pluviais, guias e sarjetas e pavimentação com cascalho para os 100 lotes das casas.
Data de Início: 01/07/92 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 9,22
Valor para Conclusão: R\$1.324.908,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Código: 201083 **Ministérios**

Percentual Concluido: 5

Código: 100193 **Estados / Municípios**

Percentual Concluido: 10

R\$380.000,00

Código: 100612 **Estados / Municípios**

Percentual Concluido: 34

R\$50.554,00

Código: 200236 **Ministérios**

Percentual Concluido: 0

Valor para Conclusão: R\$9.238.226,00

R\$234.133.198,00

65

R\$307.432.705,00

95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200118 Ministérios

Descrição da Obra: OBRA DE REFORMA DO ANEXO DE FUNDOS E PORÃO DA CASA DA
LEITURA DE LARANJEIRAS.

Data de Início: 17/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200119 Ministérios

Descrição da Obra: SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA (PARTES ELÉTRICA E
LÓGICA) DO PRÉDIO SEDE

Data de Início: 13/02/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 95

Valor para Conclusão:

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200120 Ministérios

Descrição da Obra: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS TORRÕES DO PRÉDIO - SEDE.

Data de Início: 01/02/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 98

Valor para Conclusão:

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200123 Ministérios

Descrição da Obra: Ampliação das instalações para operação com contêineres no cais do Caju.

Data de Início: 01/06/88

Data de Paralisação: 31/05/91

Percentual Concluído: 66,38

Valor para Conclusão: R\$12.614.057,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200208 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração na Rodovia BR-040/RJ.

Data de Início: 03/05/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 86,29

Valor para Conclusão: R\$688.678,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200209 Ministérios

Descrição da Obra: Restauração rodoviária na BR-393/RJ.

Data de Início: 14/07/93

Data de Paralisação: 10/12/94

Percentual Concluído: 95,43

Valor para Conclusão: R\$231.368,00

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200210 **Ministérios**

Descrição da Obra: Restauração rodoviária na BR-393/RJ.

Data de Início: 30/07/94 **Data de Paralisação:** 06/12/94 **Percentual Concluído:** 91,4

Valor para Conclusão: R\$396.786,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200211 **Ministérios**

Descrição da Obra: Restauração rodoviária na BR-101/RJ.

Data de Início: 14/11/94 **Data de Paralisação:** 01/01/95 **Percentual Concluído:** 19,4

Valor para Conclusão: R\$39.466,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200212 **Ministérios**

Descrição da Obra: Restauração rodoviária na BR-101/RJ.

Data de Início: 14/10/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 62,93

Valor para Conclusão: R\$2.757.387,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200213 **Ministérios**

Descrição da Obra: Obras de restauração rodoviária na BR-494(A).

Data de Início: 03/05/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 89,15

Valor para Conclusão: R\$745.704,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200214 **Ministérios**

Descrição da Obra: Coordenação, supervisão e controle de obras na BR-101/RJ.

Data de Início: 19/10/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 68

Valor para Conclusão: R\$174.845,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200215 **Ministérios**

Descrição da Obra: Coordenação, supervisão e controle de obras na BR-393/RJ.

Data de Início: 12/11/92 **Data de Paralisação:** 10/12/94 **Percentual Concluído:** 80,09

Valor para Conclusão: R\$100.941,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200216 Ministérios

Descrição da Obra: Coordenação, supervisão e controle de obras na BR-101/RJ

Data de Início: 30/12/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 89,69

Valor para Conclusão: R\$46.742,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200217 Ministérios

Descrição da Obra: Coordenação, supervisão e controle das obras de melhoramentos e restauração da rodovia BR-40/RJ.

Data de Início: 30/11/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 82,01

Valor para Conclusão: R\$54.552,00

Município : RIO DE JANEIRO

Código: 200218 Ministérios

Descrição da Obra: Coordenação, supervisão e controle de obras na BR-393/RJ

Data de Início: 17/10/94

Data de Paralisação: 06/12/94

Percentual Concluído: 16,66

Valor para Conclusão: R\$238.943,00

Município : ANGRA DOS REIS

Código: 100890 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Reforma interna no prédio onde funcionará o Distrito em Angra dos Reis da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Data de Início: 01/11/94

Data de Paralisação: 31/01/95

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

R\$200.000,00

Município : ARARUAMA

Código: 100013 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Obras de saneamento básico, compreendendo: Estação de tratamento de Esgotos, Estação Elevatória, Rede Coletora, Emissário e Ligações Domiciliares.

Data de Início: 01/03/94

Data de Paralisação: 30/07/94

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

R\$1.700.000,00

Município : CAMPOS DOS GOITACAZES

Código: 100746 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Terminal Pesqueiro - conclusão dos molhes que darão origem à fixação da Foz do Canal da Flexa, faltando concluir o "transpasse" para adaptar a obra ao terminal pesqueiro da Barra do Furado.

Data de Início: 01/01/79

Data de Paralisação: 31/12/82

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

R\$4.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : CAMPOS DOS GOITACAZES **Código:** 100888 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Terminal Pesqueiro - Conclusão dos molhes que darão origem à fixação da Foz do Canal da Flexa, faltando concluir o "Transpasse" para adaptar a obra ao terminal pesqueiro da Barra do Furado.**Data de Início:** 01/01/79 **Data de Paralisação:** 31/12/82 **Percentual Concluído:** 60**Valor para Conclusão:** R\$4.000.000,00

Município : CAMPOS DOS GOITACAZES **Código:** 201084 **Ministérios****Descrição da Obra:** Unidade de Saúde**Data de Início:** 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : DUQUE DE CAXIAS **Código:** 100749 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Execução de obras para implantação de sistema de esgotamento sanitário de Jardim Gramacho - Duque de Caxias**Data de Início:** 02/01/95 **Data de Paralisação:** 28/02/95 **Percentual Concluído:** 0**Valor para Conclusão:** R\$1.600.000,00

Município : DUQUE DE CAXIAS **Código:** 100753 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Execução de sistema de esgotamento sanitário de Gramacho - Lote 1 - Sub-bacia 2 - Gramacho - Duque de Caxias**Data de Início:** 24/01/94 **Data de Paralisação:** 30/06/94 **Percentual Concluído:** 31,89**Valor para Conclusão:** R\$1.500.000,00

Município : DUQUE DE CAXIAS **Código:** 200575 **Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 11/08/92 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 48**Valor para Conclusão:**

Município : DUQUE DE CAXIAS **Código:** 200641 **Ministérios****Descrição da Obra:** Construção do Centro Operacional dos Laboratórios Nacionais de Metrologia, Científica e Industrial**Data de Início:** 29/12/76 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:** R\$8.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município :	GUAPIMIRIM	Código:	201085	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	ITABORAI	Código:	100752	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Duplicação da Rodovia BR-101. Trecho Divisa ES/RJ - Divisa RJ/SP. Sub-trecho: Entrocamento RJ-124 (Rio Bonito) - Duques.			
Data de Início:	21/07/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 17	
Valor para Conclusão:	R\$15.000.000,00			

Município :	ITABORAI	Código:	201086	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Regional			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	ITAGUAI	Código:	200122	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção do Terminal de Minério Gusa e Produtos Siderurgicos do P. de Sepetiba.			
Data de Início:	01/06/89	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 33,28	
Valor para Conclusão:	R\$57.018.350,00			

Município :	MAGE	Código:	200431	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras.			
Data de Início:		Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 50	
Valor para Conclusão:				

Município :	MAGE	Código:	201087	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Regional			
Data de Início:		Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : MANGARATIBA

Código: 200207 Ministérios

Descrição da Obra: Obras de emergência - Estabilização de taludes na Rio-Santos, decretada em 01/06/95.

Data de Início: 01/06/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$4.037.315,00

Município : MARICA

Código: 100748 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Esgotamento Sanitário em Piquete, Parque Eldorado e Araçatiba (A obra consistirá em construção de elevatórias, tronco coletor e ligações prediais).

Data de Início: 29/09/94

Data de Paralisação: 27/04/95

Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão:

R\$420.097,00

Município : MARICA

Código: 200576 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 29/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : NILOPOLIS

Código: 200458 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : NOVA FRIBURGO

Código: 201088 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Maternidade

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : NOVA FRIBURGO

Código: 100685 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Reforma e ampliação do Hospital Maternidade Die Nova Friburgo.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : NOVA IGUACU Código: 100014 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução de obras de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas do Bairro Nova Era.
Data de Início: 08/11/93 Data de Paralisação: 17/06/94 Percentual Concluído: 11,17
Valor para Conclusão: R\$7.154.827,00

Município : NOVA IGUACU Código: 100015 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação de rede de águas pluviais no Bairro Jardim da Viga.
Data de Início: 28/12/94 Data de Paralisação: 22/05/95 Percentual Concluído: 16,82
Valor para Conclusão: R\$649.741,00

Município : NOVA IGUACU Código: 200459 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : PATY DO ALFERES Código: 201089 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$51.375,00

Município : PETROPOLIS Código: 100457 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de uma estação de tratamento de água 300 l/s, assentamento de adutora no Caxambú Grande e substituição da malha de abastecimento de toda a região central da cidade.
Data de Início: 22/11/93 Data de Paralisação: 11/01/94 Percentual Concluído: 5
Valor para Conclusão: R\$8.000.000,00

Município : PETROPOLIS Código: 200116 Ministérios
Descrição da Obra: OITO BLOCOS COM DOIS PAVIMENTOS CADA
Data de Início: 14/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$5.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : PETROPOLIS **Código:** 200203 **Ministérios**
Descrição da Obra: Obras de Emergência - Desobstrução de pista, estabilidade e recuperação.
Data de Início: 28/03/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 78,52
Valor para Conclusão: R\$1.016.423,00

Município : PETROPOLIS **Código:** 200206 **Ministérios**
Descrição da Obra: Execução de obra de restauração.
Data de Início: 20/07/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 62,37
Valor para Conclusão: R\$6.014.489,00

Município : QUEIMADOS **Código:** 201090 **Ministérios**
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 30
Valor para Conclusão: R\$25.000,00

Município : QUEIMADOS **Código:** 201091 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 32
Valor para Conclusão:

Município : QUISSAMA **Código:** 100286 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Terminal Pesqueiro segundo projeto SUDEPE/DNOS, que consiste em conclusão do Transpasse do passe navegável em Barra do Furado para possibilitar o acesso de embarcações diversas (fixação da foz).
Data de Início: 02/01/82 **Data de Paralisação:** 31/12/85 **Percentual Concluído:** 60
Valor para Conclusão: R\$6.000.000,00

Município : RESENDE **Código:** 200201 **Ministérios**
Descrição da Obra: Recuperação de bueiro
Data de Início: 13/06/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0
Valor para Conclusão: R\$106.143,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : RESENDE

Código: 200577 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 11/08/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 62

Valor para Conclusão:

Município : RIO BONITO

Código: 200205 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de obras de terraplanagem e pavimentação.

Data de Início: 04/11/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 22,88

Valor para Conclusão: R\$14.334.493,00

Município : RIO CLARO

Código: 100291 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Terraplanagem, pavimentação e drenagem do trecho de 9,07 Km da BR-494 que inicia no Km 258 da BR-116 (Via Dutra) no trecho do Viaduto do Aço em Volta Redonda/RJ, e termina em Getulândia, 5º Distrito de Rio Claro - RJ.

Data de Início: 24/06/89

Data de Paralisação: 05/03/90

Percentual Concluído: 8

Valor para Conclusão:

R\$7.000.000,00

Município : RIO CLARO

Código: 100292 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Conclusão da 2ª etapa da escola de 1º Grau de Lídice - 2º Distrito de Rio Claro, compreendendo a execução dos serviços de estrutura de concreto armado (pilares, vigas, lajes pré-moldadas, alvenaria, instal. elétrica, hidráulica e sanitária das dependências

Data de Início: 19/01/93

Data de Paralisação: 19/05/93

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

R\$280.000,00

Município : RIO CLARO

Código: 201092 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 14

Valor para Conclusão: R\$389.714,00

Município : RIO CLARO

Código: 201093 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Hospitalar

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200200 Ministérios

Descrição da Obra: Obras de emergência - Reforço estrutural da ponte s/ o Rio Sarapuí.

Data de Início: 05/04/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$228.626,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200219 Ministérios

Descrição da Obra: Serviços de inspeção e manutenção das estruturas da ponte Rio- Niteroi.

Data de Início: 22/12/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 80,12

Valor para Conclusão: R\$227.378.719,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200578 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 29/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 77

Valor para Conclusão:

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200582 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/02/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200642 Ministérios

Descrição da Obra: FORNECIMENTO DE BENS E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 02 TUE DA SERIE 500.

Data de Início: 27/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão: R\$6.147.313,81

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200643 Ministérios

Descrição da Obra: REPARAÇÃO BÁSICA DE 05 CARROS DA SÉRIE 800.

Data de Início: 19/11/86 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 67,2

Valor para Conclusão: R\$1.339.412,64

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL)

Código: 200644 - Ministérios

Descrição da Obra: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DA VIA
PERMANENTE TRECHO DEODORO/JAPERI

Data de Início: 25/03/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 84

Valor para Conclusão: R\$419.104,66

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL)

Código: 200645 - Ministérios

Descrição da Obra: Serviços de impermeabilização, recuperação de estruturas no prédio da CBTU/AC

Data de Início: 27/12/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 55

Valor para Conclusão: R\$83.000,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL)

Código: 200671 - Ministérios

Descrição da Obra: Implantação do sistema integrado de telecomunicação e telecontrole de energia

Data de Início: 29/04/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 62,5

Valor para Conclusão: R\$17.789.572,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL)

Código: 200672 - Ministérios

Descrição da Obra: Implantação de subestação e cabine seccionadoras

Data de Início: 25/07/86

Data de Paralisação: 30/11/93

Percentual Concluído: 63

Valor para Conclusão: R\$2.519.339,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL)

Código: 200673 - Ministérios

Descrição da Obra: Execução da modernização da série 200

Data de Início: 15/09/88

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 79,67

Valor para Conclusão: R\$62.752.621,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL)

Código: 200674 - Ministérios

Descrição da Obra: Projeto execução/modernização série 200

Data de Início: 15/09/88

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 66,72

Valor para Conclusão: R\$62.819.909,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200675 Ministérios
Descrição da Obra: Recuperação de conjuntos de equipamentos de tração de TUE série 800
Data de Início: 29/05/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 32
Valor para Conclusão: R\$11.887.759,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200676 Ministérios
Descrição da Obra: Serviços de renovação total da infra/superestrutura ferroviária do trecho Mangueira/Cavalcante
Data de Início: 25/03/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 18,92
Valor para Conclusão: R\$4.342.853,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200677 Ministérios
Descrição da Obra: Recuperação da infraestrutura e remodelação da superestrutura ferroviária do corredor DPO/DDO
Data de Início: 29/06/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 3,18
Valor para Conclusão: R\$2.166.498,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200678 Ministérios
Descrição da Obra: Serviço de recuperação de 15 TUE de série 800 com fornecimento de materiais e equipamentos
Data de Início: 29/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$47.448.822,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200679 Ministérios
Descrição da Obra: Conservação da via permanente nos trens - DDO/DDO, DDO/SCZ, DDO/JPI, BMA/GTTO
Data de Início: 26/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão: R\$1.441.911,00

Município : RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Código: 200680 Ministérios
Descrição da Obra: Reparação e modernização da locomotiva alco modelo RS-08 nº 6012
Data de Início: 22/12/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 33
Valor para Conclusão: R\$6.345.260,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : SAO GONCALO **Código:** 100112 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Implantação do sistema de esgoto sanitário nos diversos logradouros do bairro Jardim Catarina e Estação Elevatória.
Data de Início: 03/11/93 **Data de Paralisação:** 28/08/94 **Percentual Concluído:** 70
Valor para Conclusão: R\$150.000,00

Município : SAO GONCALO **Código:** 100747 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Implantação do sistema de esgotamento sanitário de Jardim Alcântara a Alcântara.
Data de Início: 29/09/94 **Data de Paralisação:** 31/01/95 **Percentual Concluído:** 10
Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município : SAO GONCALO **Código:** 201094 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

Município : SAO JOAO DA BARRA **Código:** 100170 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA - RIO DE JANEIRO, ENTRE CAETÁ/CAMPO NOVO-2º/6º DISTRITO RESPECTIVAMENTE.
Data de Início: 02/01/85 **Data de Paralisação:** 20/02/94 **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão: R\$15.000.000,00

Município : SILVA JARDIM **Código:** 100750 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros de Reginópolis e Cajú, no Município de Silva Jardim. (Complementando com o assentamento de 8.572 m de manilhas, construção de 98 poços de visita e 374 ligações.
Data de Início: 30/09/94 **Data de Paralisação:** 29/12/94 **Percentual Concluído:** 6,71
Valor para Conclusão: R\$218.305,00

Município : SILVA JARDIM **Código:** 201095 **Ministérios**
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ

Município : SUMIDOURO

Código: 201096 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SUMIDOURO

Código: 100976 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Hospital Municipal de Sumidouro

Data de Início: 02/01/88

Data de Paralisação: 31/12/89

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

R\$600.000,00

Município : TERESOPOLIS

Código: 100016 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Melhoria e pavimentação da Estrada Vicinal do Distrito Cuiabá-Pessegeiros.

Data de Início: 01/09/93

Data de Paralisação: 30/12/93

Percentual Concluído: 6

Valor para Conclusão:

R\$680.000,00

Município : TERESOPOLIS

Código: 100017 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Execução de galeria retangular para canalização do correjo Vidigueiras. 1ª etapa

Data de Início: 01/03/86

Data de Paralisação: 30/03/87

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

R\$700.000,00

Município : TERESOPOLIS

Código: 200202 Ministérios

Descrição da Obra: Obras de emergência - Estabilização do maciço da Serra de Teresópolis

Data de Início: 13/04/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$481.413,00

Município : TERESOPOLIS

Código: 200204 Ministérios

Descrição da Obra: Contenção de encosta.

Data de Início: 13/06/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão: R\$113.291,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RJ**Município : VALENCA****Código: 200579** Ministérios**Descrição da Obra: CAICS****Data de Início: 11/08/92****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 69****Valor para Conclusão:****Município : VASSOURAS****Código: 200580** Ministérios**Descrição da Obra: CAICS****Data de Início: 29/01/93****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 56****Valor para Conclusão:****Município : VOLTA REDONDA****Código: 200581** Ministérios**Descrição da Obra: CAICS****Data de Início: 11/08/92****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 83****Valor para Conclusão:****Município : VOLTA REDONDA****Código: 201097** Ministérios**Descrição da Obra: Hospital Regional****Data de Início: 01/01/93****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Unidade da Federação: RJ****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :****R\$569.788.195,11****Total de Obras, informado pelos Ministérios :****66****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:****R\$76.352.970,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :****22**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: RN****Município : ACU****Código: 201099** Ministérios**Descrição da Obra: Unidade Mista****Data de Início: 01/01/93****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 60****Valor para Conclusão:****Município : ACU****Código: 100659** Estados / Municípios**Descrição da Obra: Unidade Mista de Saúde - 50 leitos****Data de Início: 03/01/90****Data de Paralisação: 19/11/92****Percentual Concluído: 53,73****Valor para Conclusão:****R\$2.245.875,00****Município : ACU****Código: 200011** Ministérios**Descrição da Obra: Construção do Canal de Pataxó****Data de Início: 01/01/87****Data de Paralisação: 30/04/90****Percentual Concluído: 60****Valor para Conclusão: R\$2.500.000,00****Município : ACARI****Código: 201098** Ministérios**Descrição da Obra: Hospital Maternidade****Data de Início: 01/01/90****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : AFONSO BEZERRA****Código: 200010** Ministérios**Descrição da Obra: Perímetro de Irrigação Baixo Açú - RN - 1ª Etapa (3.000ha)****Data de Início: 01/12/87****Data de Paralisação: 31/12/93****Percentual Concluído: 75****Valor para Conclusão: R\$3.600.000,00****Município : ALEXANDRIA****Código: 100126** Estados / Municípios**Descrição da Obra: Escola de Primeiro Grau com 14 salas de aula localizada no bairro da Estação,
Centro da Cidade.****Data de Início: 02/05/92****Data de Paralisação: 30/12/94****Percentual Concluído: 70****Valor para Conclusão:****R\$150.000,00**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RN

Município : ALEXANDRIA Código: 100127 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Adutora entre o açude Bananeiras e o açude Pulgas, com 7,5 Km de extensão, destinada ao abastecimento de água da cidade.
Data de Início: 01/12/94 Data de Paralisação: 31/01/95 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$542.000,00

Município : ALEXANDRIA Código: 201100 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 95
Valor para Conclusão:

Município : ALTO DO RODRIGUES Código: 200036 Ministérios
Descrição da Obra: Projeto de irrigação Baixo Açú. O projeto contempla duas etapas. A 1ª etapa (3.000 ha) encontra-se praticamente pronta, sendo que a parte que corresponde ao Projeto Piloto (1.000 ha) está concluída. As obras referente à 2ª (3.000 ha) ainda não foram inici
Data de Início: 22/02/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 90
Valor para Conclusão: R\$7.000.000,00

Município : APODI Código: 100417 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Barragem de Santa Cruz.
Data de Início: 16/10/89 Data de Paralisação: 19/01/94 Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão: R\$165.000.000,00

Município : AREIA BRANCA Código: 200132 Ministérios
Descrição da Obra: RECUPERAÇÃO DO TRANSPORTADOR DE CORREIA Nº 05 (TR-5) DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA.
Data de Início: 05/09/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 64,96
Valor para Conclusão: R\$323.352,00

Município : BREJINHO Código: 201101 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RN

Município : CARAUBAS

Código: 200583 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 25/08/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : CARNAUBAIS

Código: 200037 Ministérios

Descrição da Obra: Projeto de irrigação Carnaubais. O projeto contempla uma área irrigável de 1,416 ha, prevendo-se início das obras para 1996.

Data de Início: 17/04/92

Data de Paralisação: 31/03/93

Percentual Concluído: 0,47

Valor para Conclusão: R\$9.500.000,00

Município : ESPIRITO SANTO

Código: 100123 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Esgotamento sanitário - Sede do Município.

Data de Início: 01/12/94

Data de Paralisação: 30/04/95

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

R\$711.775,00

Município : FLORANIA

Código: 100655 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR 226, trecho Currais Novos-Divisa RN/CE; sub-trecho Florânia-Divisa RN/CE, com extensão de 233 km.

Data de Início: 08/12/87

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído: 16,63

Valor para Conclusão:

R\$37.705.465,00

Município : JOAO CAMARA

Código: 201102 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : JOAO DIAS

Código: 201103 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RN

Município : JUCURUTU

Código: 200038 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Oiticica. Barragem de terra e enrocamento, com 56,00m de altura máxima, 1.820,00 m de extensão, com 1.536.492 m³ de material, capaz de acumular 1.300.000 m³ de água.

Data de Início: 28/12/90 Data de Paralisação: 31/03/93 Percentual Concluído: 3,05

Valor para Conclusão: R\$71.690.954,00

Município : LAJES

Código: 201104 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : MOSSORO

Código: 100657 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de abastecimento de água

Data de Início: 16/10/89 Data de Paralisação: 19/01/94 Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão: R\$165.000.000,00

Município : MOSSORO

Código: 200039 Ministérios

Descrição da Obra: Barragem Santa Cruz. Barragem de terra zoneada, com 49,00 m de altura máxima, 2,300 m de extensão e 1,984,950 m³ de material, capaz de acumular 553,000,000 m³ de água.

Data de Início: 11/08/92 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 12,5

Valor para Conclusão: R\$64.868.451,00

Município : MOSSORO

Código: 200460 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : MOSSORO

Código: 200584 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 25/08/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 86

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RN

Município : MOSSORO Código: 201105 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Regional
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : NATAL Código: 100245 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação do Sistema de Transporte de Massa Integrado do Município de Natal.
Data de Início: 03/02/92 Data de Paralisação: 13/01/94 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$74.819.875,00

Município : NATAL Código: 100658 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Sistema de esgotamento sanitário das bacias "D" e "I".
Data de Início: 04/01/94 Data de Paralisação: 02/05/95 Percentual Concluído: 55
Valor para Conclusão: R\$3.700.000,00

Município : NATAL Código: 100660 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Terciário de Natal - 150-leitos. área construída de 14.824 m²
Data de Início: 12/01/90 Data de Paralisação: 27/12/91 Percentual Concluído: 44,87
Valor para Conclusão: R\$8.280.346,00

Município : NATAL Código: 100661 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Unidade Mista de Saúde de Igarapé - 50 leitos
Data de Início: 12/01/90 Data de Paralisação: 27/12/91 Percentual Concluído: 51,44
Valor para Conclusão: R\$1.916.796,00

Município : NATAL Código: 100662 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Unidade Mista de Saúde de Capim Macio - 50 leitos
Data de Início: 12/01/90 Data de Paralisação: 27/12/91 Percentual Concluído: 5,51
Valor para Conclusão: R\$3.729.927,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RN

Município :	NATAL	Código:	100663	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Junta Comercial do Estado			
Data de Início:	23/02/89	Data de Paralisação:	24/02/94	Percentual Concluído: 33
Valor para Conclusão:	R\$1.500.000,00			

Município :	NATAL	Código:	200585	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	20/07/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 18
Valor para Conclusão:				

Município :	NATAL	Código:	200681	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção de uma estação ferroviária para o sistema de trens urbanos de Natal			
Data de Início:	03/11/92	Data de Paralisação:	30/04/93	Percentual Concluído: 45
Valor para Conclusão:	R\$350.000,00			

Município :	NATAL	Código:	200702	Ministérios
Descrição da Obra:	Implantação e Pavimentação da BR-101, Trecho Touros - Natal			
Data de Início:	11/05/88	Data de Paralisação:	31/12/92	Percentual Concluído: 23,75
Valor para Conclusão:	R\$24.719.000,00			

Município :	NATAL	Código:	200703	Ministérios
Descrição da Obra:	Implantação e Pavimentação da BR-226/RN, Trecho Currais Novos - Div. RN/CE			
Data de Início:	08/05/88	Data de Paralisação:	31/12/92	Percentual Concluído: 16,63
Valor para Conclusão:	R\$37.700.000,00			

Município :	NATAL	Código:	201106	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital do Câncer			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RN

Município : NISIA FLORESTA Código: 200068 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Internamento e Reeducação de "Nísia Floresta" - RN

Data de Início: 01/08/89 Data de Paralisação: 14/09/93 Percentual Concluído: 17

Valor para Conclusão: R\$8.500.000,00

Município : NISIA FLORESTA Código: 100664 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de um estabelecimento Polivalente Misto (Penitenciária de alta periculosidade).

Data de Início: 07/08/89 Data de Paralisação: 01/03/94 Percentual Concluído: 18,53

Valor para Conclusão: R\$6.398.668,00

Município : PARELHAS Código: 100199 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Pavimentação de ruas a paralelepípedo.

Data de Início: 01/08/94 Data de Paralisação: 30/11/94 Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$50.000,00

Município : PARELHAS Código: 100200 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de 01 (um) açude no Povoado Santo Antonio, zona rural do Município de Parelhas - RN.

Data de Início: 01/08/94 Data de Paralisação: 30/11/94 Percentual Concluído: 65

Valor para Conclusão: R\$70.000,00

Município : PARNAMIRIM Código: 200586 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 22/10/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 71

Valor para Conclusão:

Município : PRESIDENTE JUSCELINO Código: 201107 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **RN**Município : **SANTO ANTONIO**

Código: 100473 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - CAIC

Data de Início: 09/05/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : **SANTO ANTONIO**

Código: 200587 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/12/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : **TOUROS**

Código: 100656 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR-101 trecho Touros-Natal, com extensão de 112,00 km.

Data de Início: 26/11/87

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído: 23,75

Valor para Conclusão:

R\$24.719.685,00

Unidade da Federação: **RN**

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :

R\$230.751.757,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios :

27Total dos recursos para conclusão, informado pelos
Estados/Municípios:**R\$496.540.412,00**

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :

18

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RO

Município : ALTA FLORESTA DO OESTE Código: 100984 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação do sistema de abastecimento de água
Data de Início: 18/08/92 Data de Paralisação: 04/12/92 Percentual Concluído: 87,46
Valor para Conclusão: R\$69.321,00

Município : ALVORADA DO OESTE Código: 101001 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Sistema de Abastecimento de Água em Alvorada d'Oeste
Data de Início: 18/08/92 Data de Paralisação: 27/11/92 Percentual Concluído: 33,48
Valor para Conclusão: R\$183.814,00

Município : CACOAL Código: 100979 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Implantação do Sistema de Abastecimento de Água
Data de Início: 18/08/92 Data de Paralisação: 27/11/92 Percentual Concluído: 51,65
Valor para Conclusão: R\$444.000,00

Município : CACOAL Código: 201108 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 27
Valor para Conclusão:

Município : CACOAL Código: 100980 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de Hospital com 150 leitos
Data de Início: 11/07/91 Data de Paralisação: 06/04/92 Percentual Concluído: 21,48
Valor para Conclusão: R\$25.000.000,00

Município : CACOAL Código: 201109 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Geral
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RO

Município :	CACOAL	Código:	200439	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				
Município :	CEREJEIRA	Código:	101002	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção e Pavimentação da RO-399, trecho BR-364 - Cerejeiras/Pimenteiras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:			R\$20.850.505,00	
Município :	COLORADO DO OESTE	Código:	200470	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				
Município :	COSTA MARQUES	Código:	100985	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação do sistema de abastecimento de água			
Data de Início:	18/08/92	Data de Paralisação:	27/11/92	Percentual Concluído: 48,43
Valor para Conclusão:			R\$142.587,00	
Município :	GUAJARA-MIRIM	Código:	200075	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção da Penitenciária de Segurança máxima de Guajará - Mirim - RO			
Data de Início:	06/08/92	Data de Paralisação:	01/03/94	Percentual Concluído: 1,41
Valor para Conclusão:	R\$9.951.000,00			
Município :	GUAJARA-MIRIM	Código:	100986	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de um complexo penitenciário de segurança máxima			
Data de Início:	06/08/92	Data de Paralisação:	18/05/93	Percentual Concluído: 1,45
Valor para Conclusão:			R\$35.000.000,00	

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RO

Município :	JARU	Código:	100025	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Macro e micro drenagem do correjo Mororó.			
Data de Início:	08/11/93	Data de Paralisação:	10/02/94	Percentual Concluído: 2
Valor para Conclusão:	R\$6.612.153,00			

Município :	JI-PARANA	Código:	201110	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:				

Município :	PIMENTA BUENO	Código:	100490	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Drenagem do Canal Central			
Data de Início:	24/09/93	Data de Paralisação:	03/05/94	Percentual Concluído: 24
Valor para Conclusão:				

Município :	PIMENTA BUENO	Código:	100491	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de pontes			
Data de Início:	16/12/93	Data de Paralisação:	23/06/94	Percentual Concluído: 4
Valor para Conclusão:				

Município :	PIMENTA BUENO	Código:	100492	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Infra-estrutura urbana.			
Data de Início:	01/09/93	Data de Paralisação:	27/12/93	Percentual Concluído: 0,26
Valor para Conclusão:				

Município :	PIMENTA BUENO	Código:	100983	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação do sistema de abastecimento de água			
Data de Início:	18/08/92	Data de Paralisação:	27/11/92	Percentual Concluído: 59,68
Valor para Conclusão:	R\$278.687,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RO

Município : PORTO VELHO

Código: 100977 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Construção de 02 Escolas com 40 salas de aula e Ginásio coberto

Data de Início: 27/12/91 **Data de Paralisação:** 09/06/92 **Percentual Concluído:** 48

Valor para Conclusão:

R\$12.503.547,00

Município : PORTO VELHO

Código: 100978 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Construção da Casa de Detenção

Data de Início: 14/04/88 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 67,26

Valor para Conclusão:

R\$6.600.500,00

Município : PORTO VELHO

Código: 100981 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Recuperação da estrada de ferro Madeira Mamoré para transformação em centro cultural.

Data de Início: 22/07/92 **Data de Paralisação:** 22/10/92 **Percentual Concluído:** 23,76

Valor para Conclusão:

R\$3.930.000,00

Município : PORTO VELHO

Código: 201111 **Ministérios**

Descrição da Obra: Hospital Maternidade

Data de Início: 01/01/92 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**

Valor para Conclusão:

Município : PRESIDENTE MEDICI

Código: 100982 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Ampliação do sistema de abastecimento de água

Data de Início: 18/08/92 **Data de Paralisação:** 27/11/92 **Percentual Concluído:** 58,1

Valor para Conclusão:

R\$173,000,00

Município : PRESIDENTE MEDICI

Código: 200144 **Ministérios**

Descrição da Obra: Construção de ponte sobre o Rio Machado na BR-429/RO; extensão: 300,0 m; largura: 10,0 m.

Data de Início: 26/09/89 **Data de Paralisação:** 02/11/92 **Percentual Concluído:** 50

Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RO

Município :	ROLIM DE MOURA	Código:	101003	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção e Pavimentação da RO-010, trecho Rolim de Moura / Nova Brasilândia d'Oeste com extensão de 60,0 Km.			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$141.608.849,00			

Município :	URUPA	Código:	201112	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	VILA NOVA DO MAMORE	Código:	101004	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção e Pavimentação da BR 425, trecho Vila Nova/Abunã - sub-trecho Vila Nova - Km 75, faltando apenas a execução da ponte sobre o rio Ribeiro com extensão de 60,0 m			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$632.663,00			

Município :	VILA NOVA DO MAMORE	Código:	201113	Ministérios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde			
Data de Início:	01/01/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 92	
Valor para Conclusão:	R\$10.000,00			

Unidade da Federação: RO

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :	R\$11.961.000,00
Total de Obras, informado pelos Ministérios :	10
Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:	R\$254.029.626,00
Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :	18

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RR

Município :	RORAIMA	Código:	100997	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Pavimentação asfáltica da BR - 401			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$24.750.000,00			

Município :	BOA VISTA	Código:	100495	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde do Pricumã			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 37		
Valor para Conclusão:	R\$243.000,00			

Município :	BOA VISTA	Código:	201114	Ministérios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde			
Data de Início: 01/01/94	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 35		
Valor para Conclusão:	R\$242.074,00			

Município :	BOA VISTA	Código:	100496	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Centro de Saúde do Caranã			
Data de Início: 01/10/91	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$360.000,00			

Município :	BOA VISTA	Código:	201115	Ministérios
Descrição da Obra:	Pronto Socorro			
Data de Início: 01/01/93	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:				

Município :	BOA VISTA	Código:	100497	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital de Urgência de Boa Vista			
Data de Início: 02/01/89	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:	R\$10.000.000,00			

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município : BOA VISTA

Código: 101000 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista no Bairro Mecejana - Bacia A e B

Data de Início: 01/07/93

Data de Paralisação: 30/11/94

Percentual Concluido: 80

Valor para Conclusão:

R\$957.000,00

Município : BOA VISTA

Código: 200082 **Ministérios**

Descrição da Obra: Prédio com 02 (dois) pavilhões, com estrutura em alvenaria, com cobertura telha fibra-cimento.

Data de Início: 18/09/89

Data de Paralisação: 15/02/90

Percentual Concluido: 5

Valor para Conclusão: R\$283.210,00

Município : CARACARAI

Código: 100589 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Construção de uma cadeia pública

Data de Início: 16/01/87

Data de Paralisação: 10/06/89

Percentual Concluido: 40

Valor para Conclusão:

R\$600.000,00

Município : CARACARAI

Código: 100998 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: BR 174 - Ponte em concreto armado sobre o Rio Branco

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

R\$9.000.000,00

Município : CARACARAI

Código: 100999 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: BR 174 - Pavimentação asfáltica. Trecho Caracaraí - Divisa AM

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

R\$55.000.000,00

Município : CARACARAI

Código: 201185 **Ministérios**

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **RR**Município : **MUCAJAI**

Código: 201116 Ministérios

Descrição da Obra: **Unidade de Saúde**

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Unidade da Federação: **RR**

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :

R\$525.284,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios :

5Total dos recursos para conclusão, informado pelos
Estados/Municípios:**R\$100.910.000,00**

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :

8

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : RIO GRANDE DO SUL Código: 100894 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ferrovia - Melhoria do trecho Gen. Luz - Lages (Convênio com o 1º Batalhão Ferroviário).
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 2
Valor para Conclusão: R\$10.000.000,00

Município : RIO GRANDE DO SUL Código: 100895 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ferrovia - Ligação ferroviária Dilermando de Aguiar - São Gabriel
Data de Início: 01/01/74 Data de Paralisação: 31/12/76 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$34.000.000,00

Município : RIO GRANDE DO SUL Código: 100896 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR-101/RS - Restauração do trecho Divisa S/C - Osório.
Data de Início: 01/11/93 Data de Paralisação: 31/03/95 Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão: R\$23.000.000,00

Município : RIO GRANDE DO SUL Código: 100897 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR-116/RS - Contenção das encostas em Caxias do Sul - Vila Cristinã
Data de Início: 01/11/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão: R\$700.000,00

Município : RIO GRANDE DO SUL Código: 100898 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR-116/RS - Restauração do trecho Vila Cristina - Estância Velha.
Data de Início: 01/10/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$16.000.000,00

Município : ALVORADA Código: 100419 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Sistema de defesa contra inundação da cidade de Alvorada/RS - Sistema de Diques e Casas de Bombas para proteção urbana da cidade.
Data de Início: 01/01/86 Data de Paralisação: 31/12/90 Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão: R\$7.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : ALVORADA**Código: 200107** Ministérios**Descrição da Obra:** Construção do Posto de Benefícios**Data de Início:** 14/07/89**Data de Paralisação:** 31/12/89**Percentual Concluído:** 45**Valor para Conclusão:** R\$120.000,00**Município : ARROIO DO TIGRE****Código: 201117** Ministérios**Descrição da Obra:** Unidade de Saúde**Data de Início:** 01/01/90**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : AUREA****Código: 100078** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Escola de 1º grau de 5ª a 8ª séries com pré qualificação em agropecuária.**Data de Início:** 01/05/90**Data de Paralisação:** 31/12/93**Percentual Concluído:** 70**Valor para Conclusão:**

R\$500.000,00

Município : BAGE**Código: 200076** Ministérios**Descrição da Obra:** Construção do Presídio Regional de Bagé - RS**Data de Início:** 09/03/87**Data de Paralisação:** 25/10/88**Percentual Concluído:** 80**Valor para Conclusão:** R\$560.044,00**Município : BARRACAO****Código: 100079** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Ponte sobre o Rio Uruguai, na divisa dos Municípios Barracão - RS e Campos Novos/SC, com uma extensão de 600m e altura de 75m.**Data de Início:** 17/05/82**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 80**Valor para Conclusão:**

R\$3.000.000,00

Município : BENTO GONCALVES**Código: 200588** Ministérios**Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 22/06/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 43**Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : BOM JESUS Código: 100202 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de complexo para o Colégio Agrícola de 1º grau
Data de Início: 09/09/92 Data de Paralisação: 25/08/93 Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão: R\$255.000,00

Município : BOM JESUS Código: 200258 Ministérios
Descrição da Obra: Obras de Engª rodoviária para construção e pavimentação de rodovias - contratação de serviços remanescente para a conclusão total do trecho - BR-285/RS - B. Jesus - Vacaria
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$30.000.000,00

Município : BOM JESUS Código: 100201 Estados / Municípios
Descrição da Obra: BR-285 - Trecho: Bom Jesus - Vacaria (asfaltamento) - Trecho dividido em dois (2) lotes. Lote 1 com 33,677 Km e Lote 2 com 24,773 Km. Total da obra: 58,450 Km.
Data de Início: 24/08/88 Data de Paralisação: 31/08/93 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$13.000.000,00

Município : BOM JESUS Código: 200262 Ministérios
Descrição da Obra: Construção e pavimentação da rodovia BR-285/RS Trecho Bom Jesus - Vacaria (lote 1)
Data de Início: 24/08/88 Data de Paralisação: 24/08/93 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$15.000.000,00

Município : BOM JESUS Código: 200263 Ministérios
Descrição da Obra: Construção e pavimentação da rodovia BR-285/RS, Trecho Bom Jesus - Vacaria - lote 2
Data de Início: 03/09/88 Data de Paralisação: 04/09/93 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$15.000.000,00

Município : CACHOEIRINHA Código: 100420 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Sistema de defesa contra inundações da cidade de Cachoeirinha /RS Sistema de Diques e Casas de Bombas para proteção da área central da cidade.
Data de Início: 01/01/86 Data de Paralisação: 31/12/90 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$3.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : CACHOEIRINHA **Código: 200108** **Ministérios****Descrição da Obra:** Construção do Posto de Benefícios**Data de Início:** 25/07/89 **Data de Paralisação:** 11/03/90 **Percentual Concluído:** 40**Valor para Conclusão:** R\$160.000,00

Município : CAMPO NOVO **Código: 200260** **Ministérios****Descrição da Obra:** Obra de Engª Rodov. p/ Execução dos Ser. Terraplenagem drenagem, sinalização e obra de arte especial na BR-470/RS - Pte. sobre o rio Uruguai - Pònte do Barracão.**Data de Início:** 17/11/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:** R\$3.000.000,00

Município : CANOAS **Código: 100901** **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Rodovia BR-116/RS - Recuperação de ruas laterais em Canoas**Data de Início:** 01/12/93 **Data de Paralisação:** 31/07/94 **Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:** R\$1.500.000,00

Município : CANOAS **Código: 200433** **Ministérios****Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:**

Município : CASCA **Código: 201118** **Ministérios****Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : CAXIAS DO SUL **Código: 100422** **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção do Hospital Geral no acesso à Universidade de Caxias do Sul.**Data de Início:** 01/03/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 80**Valor para Conclusão:** R\$2.090.846,00

14-nov-95

Código: 200248 **Ministérios**

Entr

Código: 200589 **Ministérios**

Código: 100335 **Estados / Municipios**

Código: 100336 **Estados / Municipios**

Código: 100337 **Estados / Municipios**

Código: 200257 **Ministérios**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : **CHARQUEADAS** Código: 100255 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Obra em alvenaria, com 3.805,72 m² de área construída, constando de salas de aula, laboratórios, sala de atividades múltiplas, cozinha, refeitório, biblioteca, dependências didático-pedagógicas e administrativas, além de sanitários.
Data de Início: 20/10/94 Data de Paralisação: 30/04/95 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$650.930,00

Município : **CHARQUEADAS** Código: 100421 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas.
Data de Início: 01/12/88 Data de Paralisação: 31/05/94 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$4.300.000,00

Município : **CHARQUEADAS** Código: 100904 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Usina Termoelétrica de Jacuí I.
Data de Início: 01/09/85 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$230.000.000,00

Município : **CRISTAL** Código: 201119 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **DAVID CANABARRO** Código: 201120 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$80.000,00

Município : **DOM PEDRITO** Código: 200077 Ministérios
Descrição da Obra: Construção da Penitenciária Dom Pedrito - RS
Data de Início: 20/05/88 Data de Paralisação: 01/08/89 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$180.456,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS**Município : ELDORADO DO SUL****Código: 100293** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Posto de Pesagem - BR 116 - Km 290 - Prédio em tijolo à vista e estrutura em concreto armado.**Data de Início:** 02/05/79**Data de Paralisação:** 30/09/84**Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

R\$500.000,00

Município : ELDORADO DO SUL**Código: 200109** Ministérios**Descrição da Obra:** Construção do Posto de Benefícios**Data de Início:** 04/11/89**Data de Paralisação:** 30/03/90**Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:** R\$320.000,00**Município : ELDORADO DO SUL****Código: 100294** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Prédio do INSS - Fundação de estaca profunda, estrutura em concreto armado, alvenaria em tijolos maciços com área de 350,00 m².**Data de Início:** 02/01/89**Data de Paralisação:** 31/12/90**Percentual Concluído:** 20**Valor para Conclusão:**

R\$278.080,00

Município : ERECHIM**Código: 200590** Ministérios**Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 24/06/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 1**Valor para Conclusão:****Município : ERECHIM****Código: 100418** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - CAIC**Data de Início:** 05/09/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : FAXINALZINHO****Código: 201121** Ministérios**Descrição da Obra:** Unidade de Saúde**Data de Início:** 01/01/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 37**Valor para Conclusão:** R\$67.730,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : GARIBALDI Código: 100423 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canalização do Arroio Marrecão para proteção urbana da cidade.
Data de Início: 01/01/72 Data de Paralisação: 31/12/84 Percentual Concluído: 41
Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município : GETULIO VARGAS Código: 100082 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Canal de drenagem do arroio Límer confluência com o rio Abaúna na rua José Cortese.
Data de Início: 01/10/93 Data de Paralisação: 31/05/94 Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$150.000,00

Município : GRAMADO Código: 200591 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 20/07/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 27
Valor para Conclusão:

Município : GRAMADO XAVIER Código: 201122 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$155.700,00

Município : GUAIBA Código: 200251 Ministérios
Descrição da Obra: Execução de Serviços de melhoramentos e restaurações na BR-116/RS - Guaíba - Tapes - Serviços Remanescentes para a conclusão total do trecho.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : GUAIBA Código: 201123 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

14-nov-95

S / MUNICÍPIOS

Código: 201124 **Ministérios**

Percentual Concluido:

Código: 201125 **Ministérios**

Percentual Concluido:

Código: 100239 **Estados / Municipios**

birapuitã, ...

Percentual Concluido: 70

R\$81.743,00

Código: 200434 **Ministérios**

recursos repassados

Percentual Concluido: 50

Código: 201126 · **Ministérios**

Percentual Concluido: 30

Código: 200435 **Ministérios**

recursos repassados pelo

Percentual Concluido: 50

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : LAJEADO Código: 100203 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Obras contra as cheias - execução de dique; perfazendo um volume total de aterro de 80.550 m³.
Data de Início: 01/08/94 Data de Paralisação: 02/11/94 Percentual Concluído: 0,05
Valor para Conclusão: R\$4.500.000,00

Município : LAJEADO Código: 200259 Ministérios
Descrição da Obra: Obra de Engª Rodoviária para a Duplicação com o Objetivo de Aumentar a Capacidade da Rodovia, BR-386/RS - Trecho Lajeado - Estrela
Data de Início: 08/10/92 Data de Paralisação: 15/03/95 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$8.332.466,00

Município : LAJEADO Código: 100900 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR-386/RS - Duplicação do trecho Lajeado - Estrela.
Data de Início: 01/10/92 Data de Paralisação: 31/03/95 Percentual Concluído: 38
Valor para Conclusão: R\$9.000.000,00

Município : LIBERATO SALZANO Código: 100409 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de um Hospital Municipal com 1391,10m² em 2 blocos, um com 729,60m² e outro com 661,50m².
Data de Início: 01/03/95 Data de Paralisação: 31/05/95 Percentual Concluído: 25
Valor para Conclusão: R\$300.000,00

Município : MORRO REUTER Código: 201127 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : NOVA ALVORADA Código: 100142 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Municipal de NOVA ALVORADA-RS, CAPACIDADE PARA 25 LEITOS - ÁREA DE 1.665,80 M², PADRÃO SUS-SSMA-RS.
Data de Início: 05/12/90 Data de Paralisação: 28/02/92 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$330.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: RS****Município : NOVA PETROPOLIS****Código: 200250 Ministérios****Descrição da Obra:** Execução de Serviços de Melhoramentos e Restaurações de Rodovias, BR-116/RS - Vila Cristina - Estância Velha.**Data de Início:** 20/10/93**Data de Paralisação:** 13/12/93**Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:** R\$16.000.000,00**Município : NOVA PETROPOLIS****Código: 100295 Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Restauração da estrada federal BR-116, no trecho de Morro Reuter até Ponto do Rio Caí na Vila Cristina, numa extensão de 35 Km, situado no trecho entre Porto Alegre e Caxias do Sul.**Data de Início:** 26/10/93**Data de Paralisação:** 13/12/93**Percentual Concluído:** 80**Valor para Conclusão:**

R\$9.200.000,00

Município : NOVA SANTA RITA**Código: 200432 Ministérios****Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:****Município : NOVO HAMBURGO****Código: 200592 Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 22/06/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 55**Valor para Conclusão:****Município : PAIM FILHO****Código: 100256 Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Centro de Atividades Culturais e Assistências**Data de Início:** 17/07/92**Data de Paralisação:** 30/11/92**Percentual Concluído:** 30**Valor para Conclusão:**

R\$200.000,00

Município : PANAMBI**Código: 200254 Ministérios****Descrição da Obra:** Execução dos serviços de melhoramentos e restauração da BR-285/RS - Serviços Remanescentes para a conclusão total do trecho - Panambi - Lui**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:** R\$6.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : PARAI **Código:** 201128 **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : PELOTAS **Código:** 200252 **Ministérios****Descrição da Obra:** Obras de recuperação emergencial da BR-116/RS - Pelotas - Jaguarão - Lotes 01,02 e 03**Data de Início:** 06/12/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:** R\$4.400.000,00

Município : PELOTAS **Código:** 200593 **Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 20/07/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 99**Valor para Conclusão:**

Município : PELOTAS **Código:** 201187 **Ministérios****Descrição da Obra:** Construção da sede da Delegacia da Receita Federal**Data de Início:** 25/11/87 **Data de Paralisação:** 12/12/88 **Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:** R\$3.175.933,00

Município : PIRATINI **Código:** 200436 **Ministérios****Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras**Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:**

Município : PONTE PRETA **Código:** 201129 **Ministérios****Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : PORTO ALEGRE Código: 200594 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 22/06/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 34
Valor para Conclusão:

Município : PORTO ALEGRE Código: 200595 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 01/09/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 33
Valor para Conclusão:

Município : PORTO ALEGRE Código: 201130 Ministérios
Descrição da Obra: Pronto Socorro
Data de Início: 01/01/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PORTO ALEGRE Código: 201131 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital São Luiz
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : RESTINGA SECA Código: 100081 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Dragagem da Bacia do Rio Vacaraí-Mirim
Data de Início: 02/01/88 Data de Paralisação: 30/04/88 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$2.500.000,00

Município : RIO GRANDE Código: 200131 Ministérios
Descrição da Obra: Ampliação do Terminal para Contêineres do Porto de Rio Grande constando da execução de 300 metros de cais e pavimentação de 58.000 m² de pátio.
Data de Início: 31/05/88 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 15,98
Valor para Conclusão: R\$80.139.201,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : RIO GRANDE Código: 100892 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Porto de Rio Grande - Ampliação do Terminal de Containeres do Porto de Rio Grande
Data de Início: 01/12/91 Data de Paralisação: 30/10/93 Percentual Concluído: 26
Valor para Conclusão: R\$70.600.000,00

Município : RIO GRANDE Código: 200130 Ministérios
Descrição da Obra: Recomposição e regularização dos molhes do Porto de Rio Grande com a colocação de 250.000 t de pedras.
Data de Início: 31/10/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 19,14
Valor para Conclusão: R\$44.387.801,00

Município : RIO GRANDE Código: 100893 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Porto de Rio Grande - Recuperação dos molhes da barra de Rio Grande
Data de Início: 01/10/93 Data de Paralisação: 30/10/93 Percentual Concluído: 7
Valor para Conclusão: R\$50.400.000,00

Município : RIO GRANDE Código: 200255 Ministérios
Descrição da Obra: Execução de Obras de Restauração Rodoviária da BR-392/RS - Rio Grande - Pelotas
Data de Início: 02/04/90 Data de Paralisação: 07/03/95 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$10.000.000,00

Município : RIO GRANDE Código: 100902 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR-392/RS - Restauração do trecho Rio Grande - Pelotas.
Data de Início: 01/04/90 Data de Paralisação: 31/03/95 Percentual Concluído: 43
Valor para Conclusão: R\$10.000.000,00

Município : RIO GRANDE Código: 200061 Ministérios
Descrição da Obra: Construção da sede social da casa do marinheiro de Rio Grande - RS
Data de Início: 09/09/93 Data de Paralisação: 28/04/95 Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão: R\$154.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : RIO GRANDE

Código: 200596 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 27/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : ROQUE GONZALES

Código: 100299 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR trecho compreendendo Santo Ângelo-Porto Xavier, passando por Roque Gonzales.

Data de Início: 02/01/78

Data de Paralisação: 31/12/82

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

Município : SAO BORJA

Código: 200256 Ministérios

Descrição da Obra: Obras de recuperação emergencial de rodovias, BR-472 - São Borja/ Ibicui

Data de Início: 18/05/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$700.000,00

Município : SAO BORJA

Código: 100903 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR-472/RS - Recuperação do trecho São Borja - Uruguaiana

Data de Início: 01/05/94

Data de Paralisação: 31/05/95

Percentual Concluído: 75

Valor para Conclusão:

R\$500.000,00

Município : SAO GABRIEL

Código: 201132 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$3.300.000,00

Município : SAO JOAO DO POLESINE

Código: 201133 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 17

Valor para Conclusão: R\$117.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : SAO LEOPOLDO **Código:** 100424 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Controle de enchentes no Vale do Rio dos Sinos, sistema de diques. Cortina de concreto armado e casa de bombas para proteção contra cheias de uma área urbana de 1.600, nas cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo/RS.**Data de Início:** 01/01/74 **Data de Paralisação:** 31/12/90 **Percentual Concluído:** 93**Valor para Conclusão:** R\$8.000.000,00

Município : SAO LEOPOLDO **Código:** 100889 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** TRENSURB - Trecho Unisinos - São Leopoldo - 2,3 Km**Data de Início:** 01/01/79 **Data de Paralisação:** 31/12/80 **Percentual Concluído:** 2**Valor para Conclusão:** R\$79.800.000,00

Município : SAO LEOPOLDO **Código:** 100906 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Sistema de proteção contra cheias nas cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo, constituído de diques e casas de bombas.**Data de Início:** 01/01/74 **Data de Paralisação:** 31/12/90 **Percentual Concluído:** 93**Valor para Conclusão:** R\$10.000.000,00

Município : SAO LEOPOLDO **Código:** 200249 **Ministérios****Descrição da Obra:** Obras de Recuperação Emergencial das Ruas Laterais da BR-116/RS - km 243,6 - km 270,0**Data de Início:** 14/12/93 **Data de Paralisação:** 08/07/94 **Percentual Concluído:** 40**Valor para Conclusão:** R\$1.500.000,00

Município : SAO LUIZ GONZAGA **Código:** 100258 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Escola Municipal de 1º grau Francisca Leneira - Vila Harmonia. Ampliação do prédio escolar, área: 141,44 m²**Data de Início:** 01/02/95 **Data de Paralisação:** 30/06/95 **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : SAO LUIZ GONZAGA **Código:** 100259 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Escola Municipal de 1º grau João Paulo II - Vila Jauri. Ampliação de prédio escolar, área: 33,21 m² e construção de quadra de esporte, área: 364,00 m².**Data de Início:** 01/02/95 **Data de Paralisação:** 31/05/95 **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : **SAO LUIZ GONZAGA** Código: 100260 Estados / MunicípiosDescrição da Obra: Escola Municipal Santo Onofre Figueira, Distrito do Passo do Quaresma.
Construção de quadra poliesportiva com área de 364,00 m².

Data de Início: 01/04/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

Município : **SAO LUIZ GONZAGA** Código: 100261 Estados / MunicípiosDescrição da Obra: Escola Municipal de 1º grau Érico Veríssimo - Vila Loureiro. Construção de Escola
Municipal de 1º grau, com área de 347,86 m².

Data de Início: 01/05/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

Município : **SAO MARCOS** Código: 200247 MinistériosDescrição da Obra: Execução de Obras de Restauração de Rodovias - BR-116/RS - São Marcos - Caxias
do Sul.

Data de Início: 30/12/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$11.500.000,00

Município : **SAO PEDRO DO BUTIA** Código: 100080 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia - BR 392 - Trecho Cerro Largo a Porto Xavier - via São Pedro do Butiá

Data de Início: 02/01/88 Data de Paralisação: 31/12/90 Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **SALVADOR DAS MISSOES** Código: 100257 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR 392

Data de Início: 02/01/80 Data de Paralisação: 31/12/90 Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão: R\$15.000.000,00

Município : **SANTA CRUZ DO SUL** Código: 200597 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 25/08/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 93

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : SANTA MARIA Código: 100296 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Conclusão de 04 prédios para alojamento de estudantes da Universidade Federal de Santa Maria.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : SANTA MARIA Código: 100297 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Asfaltamento da BR 158 - ligação de Santa Maria a Rosário do Sul.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : SANTA MARIA Código: 100298 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Instalação de balança para pesagem de carga na BR 392 entre Santa Maria e São Sepé.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : SANTA MARIA Código: 200598 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 24/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : SANTO ANGELO Código: 200599 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 22/06/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 64
Valor para Conclusão:

Município : SAPUCAIA DO SUL Código: 100891 Estados / Municípios
Descrição da Obra: TRENSURB - Trecho Sapucaia - Unisinos - 3,9 Km
Data de Início: 01/01/89 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$63.000.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município : SAPUCAIA DO SUL Código: 200142 Ministérios
Descrição da Obra: PROJETO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS CIVIS BÁSICAS
DA 2ª ETAPA DO TREM METROPOLITANO - TRECHO: SAPUCAIA DO SUL -
SÃO LEOPOLDO.
Data de Início: 24/07/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão: R\$98.954.103,00

Município : SAPUCAIA DO SUL Código: 200461 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos
orçamentários da SEMTEC
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : SERAFINA CORREA Código: 200437 Ministérios
Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados
pelo FNDE através de convênios com as prefeituras
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : TAPES Código: 200438 Ministérios
Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados
pelo FNDE através de convênios com as prefeituras
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : TAVARES Código: 100083 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Municipal de Tavares, padrão SSMA, 25 leitos; Área de Construção
1.665,80 m².
Data de Início: 01/11/86 Data de Paralisação: 31/07/94 Percentual Concluído: 28
Valor para Conclusão: R\$577.509,00

Município : TERRA DE AREIA Código: 201134 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: RS

Município :	TORRES	Código:	200246	Ministérios
Descrição da Obra:	Obras de Restauração e Melhoramentos Remanescentes da Rodovia BR-101/RS Trecho Divisa SC/RS - Osório			
Data de Início:	12/11/93	Data de Paralisação:	07/03/95	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$23.000.000,00			

Município :	TRIUNFO	Código:	100899	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR-386/RS - Construção do viaduto de acesso ao Pólo Petroquímico.			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$3.500.000,00			

Município :	URUGUAIANA	Código:	200600	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	22/06/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 48
Valor para Conclusão:				

Município :	VACARIA	Código:	200253	Ministérios
Descrição da Obra:	Execução de serviços de melhoramentos e restaurações de rodovias - BR - 285/RS - Vacaria - Lagos Vermelha			
Data de Início:	20/10/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$8.000.000,00			

Unidade da Federação: RS

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :	R\$412.160.134,00
Total de Obras, informado pelos Ministérios :	66
Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:	R\$688.974.858,00
Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :	52

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : SANTA CATARINA Código: 100569 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Obras e serviços de proteção do Complexo Lagunar - despoluição das Lagoas Mirim, Imarú e Santo Antonio
Data de Início: 01/04/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$2.014.000,00

Município : SANTA CATARINA Código: 100570 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Obras de melhoria fluvial, compreendendo as bacias dos Rios Camboriú, Baixada da Palhoça, Tijucas, Biguaçu, Cubatão de Santo Amaro e Madre com volume a ser movimentado de 5.400.000,00 m³ (Bacias do Litoral Centro).
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$3.600.000,00

Município : SANTA CATARINA Código: 100572 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Dragagens para controle de enchente e recuperação de vales e cidades da área da Bacia do Iguaçu - volume a ser movimentado de 2.000.000 de m³.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$3.000.000,00

Município : SANTA CATARINA Código: 100573 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Conclusão da Barragem do Leão, incluindo o canal de interligação com a Barragem do Bonito, recuperação das obras de drenagem e obras de infra-estrutura de irrigação. (Litoral Sul de Santa Catarina).
Data de Início: Data de Paralisação: 30/04/90 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$8.710.000,00

Município : SANTA CATARINA Código: 100574 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Obras de dragagem e desassoreamento de cursos d'água e serviços complementares: Bacia do Tubarão - 4.800.000 m³, Bacia do Mampituba - 2.600.000 m³
Data de Início: 01/04/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$10.200.000,00

Município : SANTA CATARINA Código: 100575 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Dragagens, proteção de margens, indicamentos e recuperação de áreas compreendendo as Bacias dos Rios Cubatão, Cachoeira, Itapocu e Piçarras com volume a ser movimentado de 2.400.000 m³. (Bacia do Litoral Norte).
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$3.600.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

14-nov-95

Unidade da Federação: SC

Município : APIUNA

Código: 201135 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : APIUNA

Código: 200324 Ministérios

Descrição da Obra: Obras emergenciais na BR-470/SC, trecho Gaspar - Campos Novos, subtrecho km 110/km 110,2

Data de Início: 09/01/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão: R\$334.911,00

Município : ASCURRA

Código: 200325 Ministérios

Descrição da Obra: Recuperação e Reforço da ponte sobre o Ribeirão São Pedro na BR/470/SC, trecho Gaspar - Campos Novos, subtrecho km 88,5

Data de Início: 27/12/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 29,51

Valor para Conclusão: R\$175.566,00

Município : ASCURRA

Código: 100071 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ponte s/ Ribeirão São Pedro, Km 88,5 na BR-470, divisa dos municípios de Rodeio e Ascurra.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$250.000,00

Município : BLUMENAU

Código: 100581 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Proteção local da cidade de Blumenau, Bairro Itoupava, Vila Nova e Santa Efigênia. Obras de arte sobre o Rio Itajaí Açú. Acesso a BR-470. Drenagem pluvial dos 12 polderes projetados. Executou-se apenas o polder Santa Efigênia e parte do polder PI-9.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$4.360.000,00

Município : BLUMENAU

Código: 100582 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Melhoria pluvial dos Ribeirões Garcia e Velha, inclusive revestimento dos taludes e obras de arte.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$1.500.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS****INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS**

14-nov-95

Unidade da Federação: SC**Município : BLUMENAU****Código: 200330 Ministérios****Descrição da Obra:** Execução dos serviços de conclusão do acesso de Blumenau à BR-470/SC (Extensão 4,3km). Rodovia BR-470/SC, trecho: Navegantes - Blumenau**Data de Início:** 30/10/89**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:** R\$6.750.000,00**Município : BRUSQUE****Código: 200602 Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 19/08/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 65****Valor para Conclusão:****Município : BRUSQUE****Código: 200603 Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 19/08/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 68****Valor para Conclusão:****Município : CAMBORIU****Código: 200601 Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 25/08/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 81****Valor para Conclusão:****Município : CAMPO ERE****Código: 200440 Ministérios****Descrição da Obra:** Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras**Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 50****Valor para Conclusão:****Município : CAMPOS NOVOS****Código: 100474 Estados / Municípios****Descrição da Obra:** BR-282 - Trecho entre Lages e Campos Novos**Data de Início:** 02/01/60**Data de Paralisação:** 30/12/72**Percentual Concluído: 82****Valor para Conclusão:**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : CAMPOS NOVOS

Código: 100475 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Ponte s/ o Rio Uruguai na BR-470 - Divisa de SC com Rio Grande do Sul

Data de Início: 02/01/81

Data de Paralisação: 30/12/90

Percentual Concluído: 81

Valor para Conclusão:

Município : CAPINZAL

Código: 100072 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Grupo escolar

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CHAPECÓ

Código: 100585 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Hemocentro de Chapecó

Data de Início: 03/11/90

Data de Paralisação: 11/10/91

Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão:

R\$518.700,00

Município : CHAPECÓ

Código: 200442 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

Município : CORUPÁ

Código: 200331 Ministérios

Descrição da Obra: Implantação e Pavimentação (extensão 40,9km) na BR-280/SC, trecho: Jaraguá do Sul - São Bento do Sul, subtrecho: Corupá - São Bento do Sul

Data de Início: 04/11/87

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$2.760.000,00

Município : CORUPÁ

Código: 100566 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR-280 - Pavimentação do trecho Corupá-São Bento do Sul e contorno de São Bento. Extensão total = 40,9 km. Corupá-São Bento do Sul já está pavimentado (30,1 km). O contorno de São Bento do Sul está implantado, falta pavimentar. Extensão 108 km.

Data de Início: 23/10/86

Data de Paralisação: 30/04/93

Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão:

R\$2.500.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

14-nov-95

Unidade da Federação: SC

Município : **DIONISIO CERQUEIRA** Código: 100143 Estados / Municípios

Descrição da Obra: PORTO SECO INTERNACIONAL DIONISIO CERQUEIRA (BRASIL,) BERNARDO DE IRIGOYEN (Argentina): CONCLUSÃO DA BR -163: ACESSO AO TERMINAL INTERNACIONAL DE CARGAS. CONSTRUÇÃO DO TERMINAL COM SUA ÁREA DE ESTACIONAMENTO. CONSTRUÇÃO DA ADUANA DE CONTROLE INTEGRADO DE FR

Data de Início: 02/01/80 Data de Paralisação: 31/12/83 Percentual Concluído: 30

Valor para Conclusão: R\$4.000.000,00

Município : **FLORIANOPOLIS** Código: 200071 Ministérios

Descrição da Obra: Construção do Complexo Penitenciário de Florianópolis-SC

Data de Início: 29/01/93 Data de Paralisação: 19/04/93 Percentual Concluído: 0,1

Valor para Conclusão: R\$10.000.000,00

Município : **FLORIANOPOLIS** Código: 201136 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital do Rio do Sul

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **FLORIANOPOLIS** Código: 201137 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital São Lucas

Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **GASPAR** Código: 200333 Ministérios

Descrição da Obra: Execução de Serviços de Melhoramentos e Restauração na BR-470/SC, trecho Gaspar - Campos Novos, subtrecho: Gaspar - Entr. BR-477/(A)

Data de Início: 28/12/90 Data de Paralisação: 01/01/94 Percentual Concluído: 7,1

Valor para Conclusão: R\$4.501.390,00

Município : **GRAVATAL** Código: 100587 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de unidade mista de saúde no município de Gravatal

Data de Início: 02/05/89 Data de Paralisação: 01/03/91 Percentual Concluído: 65

Valor para Conclusão: R\$166.320,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : GRAVATAL Código: 201138 Ministérios
 Descrição da Obra: Hospital Municipal
 Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 85
 Valor para Conclusão:

Município : GUARACIABA Código: 100077 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: BR-163. Liga o município de São Miguel do Oeste ao município de Dionísio Cerqueira - Divisa com os países do MERCOSUL.
 Data de Início: 02/01/82 Data de Paralisação: 31/12/83 Percentual Concluído: 70
 Valor para Conclusão: R\$5.000.000,00

Município : IBIRAMA Código: 200326 Ministérios
 Descrição da Obra: Obras emergenciais de reforço e recuperação da estrutura da ponte sobre o Rio Itajaí - Açú na BR-470/SC, trecho Gaspar - Campos Novos, subtrecho km 112,6
 Data de Início: 24/04/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 85
 Valor para Conclusão: R\$586.161,00

Município : IMBITUBA Código: 201139 Ministérios
 Descrição da Obra: Posto de Saúde
 Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
 Valor para Conclusão:

Município : ITAJAI Código: 100578 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Manutenção e operação das Barragens Oeste, Sul e Norte. Recuperação da parte elétrica, comportas, casa dos operadores, muros de arrimo, motores, dragagem no reservatório, sistema de rádio, sistema de aquisição de dados. (Vale do Itajaí).
 Data de Início: 02/01/75 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído:
 Valor para Conclusão: R\$1.300.000,00

Município : ITAJAI Código: 100579 Estados / Municípios
 Descrição da Obra: Melhoria pluvial, dragagens no trecho Ilhota-Foz, confluência Itajaí Mirim. Volume a ser movimentado 4.700.000 m³. Executar no período entre 1995 à 1998 - 2.350.000 m³ (Baixo Vale do Itajaí).
 Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 55
 Valor para Conclusão: R\$4.700.000,00

SENADO FEDERAL**COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

14-nov-95

Unidade da Federação: SC**Município : ITAJAI****Código: 200604** Ministérios**Descrição da Obra: CAICS****Data de Início: 25/08/93****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 89****Valor para Conclusão:****Município : ITAPOA****Código: 100588** Estados / Municípios**Descrição da Obra: Construção unidade mista de Itapoá****Data de Início: 01/06/92****Data de Paralisação: 30/06/94****Percentual Concluído: 60****Valor para Conclusão:**

R\$118.664,00

Município : ITUPORANGA**Código: 100571** Estados / Municípios**Descrição da Obra: Complementação do canal de desague da Barragem Sul.****Data de Início: 02/01/64****Data de Paralisação: 31/12/75****Percentual Concluído: 80****Valor para Conclusão:**

R\$1.320.000,00

Município : JARAGUA DO SUL**Código: 200605** Ministérios**Descrição da Obra: CAICS****Data de Início: 24/06/94****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 1****Valor para Conclusão:****Município : JOACABA****Código: 201140** Ministérios**Descrição da Obra: Hospital Municipal****Data de Início: 01/01/92****Data de Paralisação:****Percentual Concluído: 70****Valor para Conclusão:****Município : JOINVILLE****Código: 100320** Estados / Municípios**Descrição da Obra: Conclusão da BR 101.****Data de Início:****Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : JOINVILLE Código: 100586 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do Hemocentro de Joinville
Data de Início: 03/11/90 Data de Paralisação: 18/12/91 Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão: R\$467.149,00

Município : JOSE BOITEUX Código: 100580 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Estudos e projetos complementares de obras de controle de cheias na Bacia e início da execução do Canal de desagüe do vertedor da Barragem Norte.
Data de Início: Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$600.000,00

Município : LAGES Código: 200335 Ministérios
Descrição da Obra: Execução de Serviços de Melhoramentos e Restauração na BR-116/SC, trecho: Divisa PR/SC, subtrecho: Entr. BR-470 - Lajes
Data de Início: 02/12/94 Data de Paralisação: 01/03/95 Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão: R\$14.107.361,00

Município : LAGUNA Código: 100576 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Retificação e prolongamento do Molhe Sul
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$6.000.000,00

Município : LAGUNA Código: 100577 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Dragagem do Canal Barra da Laguna Cabeçadas, volume 550.000 m³
Data de Início: 01/04/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$1.000.000,00

Município : LAURO MULLER Código: 100069 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Recuperação ambiental. Região carbonífera
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : LAURO MULLER Código: 100070 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Duplicação da BR-101 - Trecho Garuva. A passo de Torres.
Data de Início: 02/01/70 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : MAFRA Código: 100145 Estados / Municípios
Descrição da Obra: ESCOLA AGRÍCOLA DE 1º GRAU
Data de Início: 01/12/87 Data de Paralisação: 31/08/89 Percentual Concluído: 55
Valor para Conclusão: R\$340.000,00

Município : NAVEGANTES Código: 200329 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação e Pavimentação (Extensão 25,2 km) na BR-470/SC, trecho:
Navegantes - Blumenau, subtrecho: Entr. BR-101/SC - Gaspar
Data de Início: 31/10/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$3.378.000,00

Município : PALHOÇA Código: 200332 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação e Pavimentação (extensão 19,5km) na BR-282/SC, trecho:
Florianópolis - Bom Retiro, subtrecho: Entr. BR-101/SC - Santo Amaro da
Imperatriz
Data de Início: 29/12/87 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão: R\$3.000.000,00

Município : PALHOÇA Código: 100073 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Conclusão da rodovia - BR. 282 e sua interseção a BR 101
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão:

Município : PALHOÇA Código: 200327 Ministérios
Descrição da Obra: Adequação de Capacidade (Extensão 86,9 km) na BR-101/SC, trecho: Divisa PR/SC,
subtrecho: Divisa SC/RS - Palhoça
Data de Início: 13/06/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$17.623.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : PALHOCA Código: 200606 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 20/07/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : PASSO DE TORRES Código: 100210 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Sistema de Abastecimento de Água Potável
Data de Início: 02/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PICARRAS Código: 100204 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de molhe de contenção com enrocamento sintético, dragagem da foz do rio Picarras e aterro de faixa erodida.
Data de Início: 19/05/94 Data de Paralisação: 10/06/94 Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão: R\$2.424.457,00

Município : PORTO UNIAO Código: 201141 Ministérios
Descrição da Obra: Centro Cirúrgico
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : PRAIA GRANDE Código: 100232 Estados / Municípios
Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO RIO LEÃO.
Data de Início: 02/01/87 Data de Paralisação: 31/12/90 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$50.000.000,00

Município : PRAIA GRANDE Código: 100263 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção de um ginásio de esportes, sendo que foi construído as fundações e parte das arquibancadas.
Data de Início: 01/10/88 Data de Paralisação: 31/03/89 Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão: R\$150.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : RANCHO QUEIMADO Código: 100144 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Unidade Integrada de Saúde - pequeno hospital com 25 leitos
Data de Início: 01/10/89 Data de Paralisação: 31/01/93 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$300.000,00

Município : RANCHO QUEIMADO Código: 201142 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$100.000,00

Município : RANCHO QUEIMADO Código: 100584 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção Unidade Mista de Rancho Queimado
Data de Início: 26/04/90 Data de Paralisação: 30/04/94 Percentual Concluído: 75
Valor para Conclusão: R\$121.266,00

Município : RIO DO SUL Código: 200471 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de 2º Grau, com percentual executado acima de 50% e recursos orçamentários da SEMTEC
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

Município : RIQUEZA Código: 201143 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : ROMELANDIA Código: 201144 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : **SAO BENTO DO SUL** Código: 200607 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 20/07/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : **SAO JOAQUIM** Código: 201145 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **SAO JOSE** Código: 200328 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de dois viadutos nas interseções de Barreiros (km 203,5) e Forquilha (km 209) na BR-101/SC, trecho: Divisa PR/SC - Divisa SC/RS
Data de Início: 05/04/89 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$800.000,00

Município : **SAO JOSE DO CEDRO** Código: 100074 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola Agrícola Pe. Balduino Schneider - Linha Esquina Derrubada - São José do Cedro.
Data de Início: 01/09/91 Data de Paralisação: 31/03/95 Percentual Concluído: 17,02
Valor para Conclusão: R\$85.000,00

Município : **SAO JOSE DO CEDRO** Código: 100075 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Centro de Atividades Escolares no Bairro PROMORAR, em alvenaria, com área de 508,14m², composto de 04 banheiros, 02 depósitos, 01 cozinha, 01 refeitório, 01 fábrica de massas, 01 gabinete médico e odontológico, 01 sala de recreação e expressão corporal, 0
Data de Início: 01/08/91 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão: R\$42.000,00

Município : **SAO JOSE DO CEDRO** Código: 100076 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Pré-Escola do Bairro São Cristóvão que compreende a construção de sala de aula, cozinha, banheiro e depósito, em alvenaria, com área de 97,02m².
Data de Início: 01/09/93 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$15.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SC

Município : SAO JOSE DO CEDRO **Código:** 200441 **Ministérios**
Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão:

Município : SANTA ROSA DO SUL **Código:** 100567 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Duas barragens de terra com o objetivo de reservação de água no Rio Bonito e Leão. A barragem do Rio Bonito está pronta, sendo que a do Rio Leão falta aproximadamente 30% para a sua conclusão.
Data de Início: **Data de Paralisação:** 30/01/90 **Percentual Concluído:** 70
Valor para Conclusão: R\$5.000.000,00

Município : S.AMARO DA IMPERATRIZ **Código:** 100568 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: BR-282 - Conclusão do contorno de Santo Antonio da Imperatriz e acesso à BR-101. Extensão contrato DER/SC = 19 km, já pavimentados 11 km e implantados 15 km.
Data de Início: 12/06/92 **Data de Paralisação:** 01/10/94 **Percentual Concluído:** 63
Valor para Conclusão: R\$3.300.000,00

Município : SOMBRIO **Código:** 200608 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 08/09/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1
Valor para Conclusão:

Município : TIJUCAS **Código:** 200334 **Ministérios**
Descrição da Obra: Execução de Serviços de Restauração na BR-101/SC, trecho: Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho: Tijucas - Biguaçu
Data de Início: 16/11/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 19,84
Valor para Conclusão: R\$4.246.237,00

Município : TIJUCAS **Código:** 200336 **Ministérios**
Descrição da Obra: Execução de Serviços de Restauração na BR-101/SC, trecho: Divisa PR/SC - Divisa SC/RS, subtrecho: BR-470 - Tijucas
Data de Início: 04/11/93 **Data de Paralisação:** 19/06/95 **Percentual Concluído:** 21,2
Valor para Conclusão: R\$3.499.375,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: SC****Município : TIMBO GRANDE** **Código: 201146** **Ministérios****Descrição da Obra: Unidade de Saúde****Data de Início: 01/01/90** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído: 50****Valor para Conclusão: R\$200.000,00****Município : TIMBO GRANDE** **Código: 100583** **Estados / Municípios****Descrição da Obra: Construção Unidade Mista de Timbó Grande****Data de Início: 01/05/92** **Data de Paralisação: 30/04/95** **Percentual Concluído: 50****Valor para Conclusão: R\$121.134,00****Município : TRES BARRAS** **Código: 200609** **Ministérios****Descrição da Obra: CAICS****Data de Início: 20/07/94** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído: 1****Valor para Conclusão:****Município : URUBICI** **Código: 100996** **Estados / Municípios****Descrição da Obra: Construção e Pavimentação da BR 475, com três pontes já construídas****Data de Início:** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : XANXERE** **Código: 200610** **Ministérios****Descrição da Obra: CAICS****Data de Início: 13/06/94** **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído: 57****Valor para Conclusão:**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: SC****Unidade da Federação: SC****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :****R\$72.062.001,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios :****40****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:****R\$126.823.690,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :****43**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SE

Município : ARACAJU Código: 100692 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Obras de proteção da Praia da Coroa do Meio
Data de Início: 08/01/92 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 34,91
Valor para Conclusão: R\$9.012.000,00

Município : ARACAJU Código: 100693 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitário de Aracaju - 2ª etapa - construção de 88.411 m de rede coletora, 03 estações elevatórias, 02 emissários por recalque e 11.782 ligações domiciliares.
Data de Início: 31/07/86 Data de Paralisação: 31/03/91 Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$24.461.560,00

Município : ARACAJU Código: 100694 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Ampliação do Sistema de Abastecimento d'Água de Aracaju - construção de 18 km de adutoras, execução de 1 estação elevatória, 2 reservatórios de 10.000 m³ e 40 km de rede de distribuição.
Data de Início: 16/08/91 Data de Paralisação: 31/03/95 Percentual Concluído: 75
Valor para Conclusão: R\$11.785.000,00

Município : ARACAJU Código: 200070 Ministérios
Descrição da Obra: Construção da Penitenciária de Aracaju-SE
Data de Início: 24/05/93 Data de Paralisação: 01/03/94 Percentual Concluído: 1,8
Valor para Conclusão: R\$10.000.000,00

Município : ARACAJU Código: 100695 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Penitenciária da Grande Aracaju - com 19.505,05 m² de área construída, com o objetivo de abrigar 754 internos.
Data de Início: 24/05/93 Data de Paralisação: 26/08/93 Percentual Concluído: 1,8
Valor para Conclusão: R\$6.497.348,00

Município : BARRA DOS COQUEIROS Código: 100006 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Execução das obras de implantação do Canal do Guaxinim e Serviços Complementares.
Data de Início: 16/12/92 Data de Paralisação: 11/03/94 Percentual Concluído: 6,56
Valor para Conclusão: R\$5.928.490,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SE

Município : BARRA DOS COQUEIROS **Código:** 100691 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Estabilização do Molhe de Atalaia Nova
Data de Início: 01/11/89 **Data de Paralisação:** 30/04/94 **Percentual Concluído:** 47,45
Valor para Conclusão: R\$12.466.600,00

Município : BARRA DOS COQUEIROS **Código:** 100696 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Apoio à Implantação do Pólo Cloroquímico de Sergipe - visa basicamente a exploração das riquezas minerais existentes no sub-solo da região, destacando-se as ocorrências de evaporitos de calcário, de enxofre e gás natural, associados à exploração de Petról
Data de Início: 24/08/92 **Data de Paralisação:** 30/12/94 **Percentual Concluído:** 20
Valor para Conclusão: R\$58.477.061,00

Município : CANINDE DE S.FRANCISCO **Código:** 100700 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Projeto de Irrigação Nova Califórnia - com base em estudos procedidos pelo IPT, evidenciou-se a existência de cerca de 8.500 ha irrigáveis na região. Os referidos estudos foram fundamentais para a implantação do Projeto Califórnia I, do qual o Projeto Nov
Data de Início: 14/10/84 **Data de Paralisação:** 23/09/86 **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão: R\$35.200.000,00

Município : ESTANCIA **Código:** 200446 **Ministérios**
Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 50
Valor para Conclusão:

Município : ESTANCIA **Código:** 200391 **Ministérios**
Descrição da Obra: Eliminação de segmentos Críticos na Rodovia BR-101/SE, Segmento km 148,1 - km 153,0 (Travessia Urbana Estância - SE)
Data de Início: 14/09/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 10
Valor para Conclusão: R\$1.300.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SE

Município : ITABAIANA **Código:** 200012 **Ministérios**
Descrição da Obra: Obras de Ampliação do Projeto de irrigação Jacarecica
Data de Início: 26/05/92 **Data de Paralisação:** 30/09/93 **Percentual Concluído:** 15
Valor para Conclusão: R\$25.700.000,00

Município : ITABAIANA **Código:** 100701 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Ações complementares de Irrigação Jacarecica II - constitui-se na construção de uma barragem de 50,00 m de altura e volume de aterro de 600.000 m³, e a construção de 50 km de canais para irrigação, com 400 lotes de 400 ha, totalizando 1.600 ha irrigados.
Data de Início: 01/06/92 **Data de Paralisação:** 30/09/93 **Percentual Concluído:** 13,15
Valor para Conclusão: R\$30.423.172,00

Município : LARANJEIRAS **Código:** 200637 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 07/12/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 76
Valor para Conclusão:

Município : NEOPOLIS **Código:** 200058 **Ministérios**
Descrição da Obra: Enrocamento dos Diques de proteção do perímetro irrigado de Betum.
Data de Início: 23/12/92 **Data de Paralisação:** 30/06/94 **Percentual Concluído:** 63
Valor para Conclusão: R\$200.000,00

Município : NOSSA SRA.DO SOCORRO **Código:** 100699 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Terraplenagem, drenagem, pavimentação, água e sistema de esgoto para instalação de 1.400 residências no Conjunto Taiçoca IV
Data de Início: 01/04/92 **Data de Paralisação:** 30/01/94 **Percentual Concluído:** 8,41
Valor para Conclusão: R\$7.500.000,00

Município : NOSSA SRA.DO SOCORRO **Código:** 200638 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 07/12/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 53
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SE

Município : POCO REDONDO

Código: 201147 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/90

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PROPRIA

Código: 100427 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de 01 escola de 1º grau de 5ª a 8ª série com pré-qualificação em agropecuária.

Data de Início: 22/01/93

Data de Paralisação: 04/06/93

Percentual Concluído: 31

Valor para Conclusão:

R\$680.000,00

Município : PROPRIA

Código: 200059 Ministérios

Descrição da Obra: Enrocamento dos diques de proteção do Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba.

Data de Início: 30/11/93

Data de Paralisação: 30/06/94

Percentual Concluído: 33

Valor para Conclusão: R\$950.000,00

Município : PROPRIA

Código: 200060 Ministérios

Descrição da Obra: Fornecimento de materiais e equipamentos necessários e complementação do Projeto de irrigação de Propriá.

Data de Início: 01/08/89

Data de Paralisação: 31/12/93

Percentual Concluído: 92

Valor para Conclusão: R\$840.000,00

Município : PROPRIA

Código: 200639 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/07/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 53

Valor para Conclusão:

Município : RIACHAO DO DANTAS

Código: 200447 Ministérios

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SE

Município :	SAO CRISTOVAO	Código:	100233	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Drenagem, pavimentação e destinação de dejetos dos Bairros Jardins Rosa Elze e Rosa Maria.				
Data de Início:	12/09/94	Data de Paralisação:	29/11/94	Percentual Concluído:	30
Valor para Conclusão:	R\$7.668.893,00				

Município :	SAO CRISTOVAO	Código:	100697	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Execução de serviços de rede de esgoto, abastecimento de água, drenagem e pavimentação do CONJUNTO TERRA DURA II				
Data de Início:	01/09/93	Data de Paralisação:	31/01/94	Percentual Concluído:	24,6
Valor para Conclusão:	R\$6.000.000,00				

Município :	SAO CRISTOVAO	Código:	100698	Estados / Municípios	
Descrição da Obra:	Infra-estrutura do Conjunto Terra Dura I - pavimentação e drenagem de ruas				
Data de Início:	01/09/93	Data de Paralisação:	31/01/94	Percentual Concluído:	18
Valor para Conclusão:	R\$5.000.000,00				

Município :	TOBIAS BARRETO	Código:	200640	Ministérios	
Descrição da Obra:	CAICS				
Data de Início:	21/07/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído:	43
Valor para Conclusão:					

Unidade da Federação: SE

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios : R\$38.990.000,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios : 13

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios: R\$221.100.124,00

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios : 14

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : SAO PAULO **Código:** 100973 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Rodovia Régis Bittencourt - BR-116 (trecho paulista). Execução de 07 trevos e respectivas duplicações c/ melhorias da pista existente, no total de 43 Km (mini-duplicação).**Data de Início:** 01/12/92 **Data de Paralisação:** 30/11/94 **Percentual Concluído:** 34**Valor para Conclusão:** R\$130.000.000,00

Município : SAO PAULO **Código:** 100974 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Rodovia Régis Bittencourt - BR-116 (trecho paulista) - duplicação, melhoramentos, conservação e operação rodoviária (serviços de ajuda ao usuário, balança, etc.).**Data de Início:** 02/05/93 **Data de Paralisação:** 30/11/94 **Percentual Concluído:** 2**Valor para Conclusão:** R\$96.000.000,00

Município : SAO PAULO **Código:** 200225 **Ministérios****Descrição da Obra:** Serviços de adequação da alça de acesso à Jacareí/SP na BR-116/SP - Rod. Pres. Dutra, trecho: São José dos Campos - S. Paulo, subtrecho: km 160, 970 - Acesso à cidade de Jacareí/SP**Data de Início:** 29/11/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 12,18**Valor para Conclusão:** R\$86.376,00

Município : SAO PAULO **Código:** 200226 **Ministérios****Descrição da Obra:** Constr. 02 bueiros metálicos p/ método não destrutivo (Tunnel Liner Plate) revest c/ concreto projetado na BR-116/SP - Rod. Pres. Dutra, trecho: Div. RJ/SP - São José dos Campos, subtrecho: Div. RJ/SP - Aparecida do Norte, segmentos: km 68 + 547,5 e 69 +**Data de Início:** 03/12/93 **Data de Paralisação:** 01/01/94 **Percentual Concluído:** 40**Valor para Conclusão:** R\$53.521,00

Município : SAO PAULO **Código:** 200223 **Ministérios****Descrição da Obra:** Locação equip. recicl. a quente "In-Situ", de capas asfálticas Wirtgen Remixer, cumulado c/serviços assit. téc. especializ. e conjugados c/contrato apoio p/fornec. equip. aux., mat e pessoal na BR-116/SP - Rod. Pres. Dutra, Div.RJ/SP- São Paulo, km 0-23**Data de Início:** 05/06/91 **Data de Paralisação:** 10/07/93 **Percentual Concluído:** 38,63**Valor para Conclusão:** R\$1.726.115,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : SAO PAULO

Código: 200230 Ministérios

Descrição da Obra: Modernização e Ampliação da Capacidade da Rod. BR-381/SP - Fernão Dias, no estado de SP, compreendendo a implantação e pavimentação da 2ª pista entre os km 36,3 (interseção c/ a rodovia SP-65 D. Pedro I) e o km 90 (interseção c/ a rodovia BR-116 - Pres. D

Data de Início: 13/04/94

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

Município : SAO PAULO

Código: 100546 Estados / Municípios

Descrição da Obra: BR 381 Rodovia Fernão Dias - Modernização e ampliação de capacidade da Rodovia trecho Paulista entre os kms 36,3 e 90 - 1ª Etapa

Data de Início: 01/05/94

Data de Paralisação: 31/01/95

Percentual Concluído: 9,6

Valor para Conclusão:

R\$78.500.000,00

Município : SAO PAULO

Código: 200231 Ministérios

Descrição da Obra: Modernização e Ampliação da Capacidade da Rodovia BR-381/SP - Fernão Dias, no estado de São Paulo, compreendendo a implantação e pavimentação da 2ª pista entre os km 36,3 (interseção com a rodovia SP-65 D. Pedro I) e o km 90 (interseção com a rodovia BR-1

Data de Início: 13/04/94

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 10

Valor para Conclusão:

Município : SAO PAULO

Código: 200224 Ministérios

Descrição da Obra: Obras de estabilização de taludes na BR-153/SP - Rodovia Transbrasiliana, trecho: Marília - Ourinhos, subtrecho: km 274,32 ao km 275,175

Data de Início: 04/12/92

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 29,99

Valor para Conclusão: R\$5.000.000,00

Município : SAO PAULO

Código: 100969 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Projeto Qualidade das águas e controle de poluição hídrica - Bacia dos rios Piracicaba, Capivarí e Jundiá.

Data de Início: 27/09/95

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : SAO PAULO

Código: 100970 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Projeto de Descentralização dos Trens Metropolitanos de São Paulo - BIRD 1

Data de Início: 01/10/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 34,09

Valor para Conclusão:

R\$170.286.544,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : **SAO PAULO** Código: 201156 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Geral
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão:

Município : **AGUAS DE LINDOIA** Código: 100146 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola Fundamental com 1.325,50 m²
Data de Início: 13/12/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$203.767,00

Município : **ARAMINA** Código: 201148 Ministérios
Descrição da Obra: Unidade de Saúde
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 38
Valor para Conclusão: R\$750.000,00

Município : **ARARAQUARA** Código: 200611 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 16/06/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 9
Valor para Conclusão:

Município : **ARARAQUARA** Código: 100262 Estados / Municípios
Descrição da Obra: CAIC: Centro de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente. Área total
construída: 4.681,24 m²: Anfiteatro, Ginásio de Esportes, Núcleo de
Capacitação/Teledifusão/Alimentação, Educação para o Trabalho, Núcleo de
Saúde/Assistência à Criança e Família,
Data de Início: 22/06/94 Data de Paralisação: 31/12/94 Percentual Concluído: 10
Valor para Conclusão: R\$2.500.000,00

Município : **ARARAS** Código: 200612 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 22/07/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 95
Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município :	ARUJA	Código:	100967	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rede de Esgoto, Coletor, Linha de Recalque e EEE Final de Arujá			
Data de Início:	03/03/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão:	R\$1.561.986,00			

Município : ATIBAIA	Código: 200227	Ministérios
Descrição da Obra: Modernização e Ampliação da Capacidade da Rod. BR-381/SP - Fernão Dias, no est. de São Paulo, compreend. a implant. e paviment. da 2ª pista entre os km 36,3 (interseção c/ a rod. SP-65 D. Pedro I) e o km 90 (inters. c/ a rod. BR-116 - Presid. Dutra) (Lote		

Data de Início: 13/04/94 **Data de Paralisação:** 31/12/94 **Percentual Concluído:** 40
Valor para Conclusão:

Município :	AURIFLAMA	Código:	200444	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído: 50		
Valor para Conclusão:				

Município : BAURU **Código:** 200613 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 01/11/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 1
Valor para Conclusão:

Município :	BEBEDOURO	Código:	100307	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Coleta e tratamento de esgoto.			
Data de Início:	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:		
Valor para Conclusão:				

Município :	BIRIGUI	Código:	100110	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal, com capacidade para 150 leitos, objetivando atender não só Birigui, polo industrial dos mais importantes do Estado, e sub-sede regional de saúde que integra 9 Municípios.			
Data de Início:	22/12/88	Data de Paralisação:	30/11/90	Percentual Concluído: 20
Valor para Conclusão:	R\$12.000.000,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : BOITUVA

Código: 201149 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 95

Valor para Conclusão:

Município : BOTUCATU

Código: 201150 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão: R\$95.000,00

Município : BRAGANCA PAULISTA

Código: 100207 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Centro de Abastecimento

Data de Início: 02/01/92

Data de Paralisação: 31/12/92

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

R\$470.000,00

Município : BRAGANCA PAULISTA

Código: 100208 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Escola de 1º e 2º graus do Jardim da Fraternidade

Data de Início: 01/04/93

Data de Paralisação: 31/05/93

Percentual Concluído: 6

Valor para Conclusão:

R\$350.000,00

Município : BRODOWSKI

Código: 201152 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$235.000,00

Município : BRODOWSKI

Código: 100162 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Unidade Mista Hospitalar com 1.000 m²

Data de Início: 02/01/91

Data de Paralisação: 31/01/95

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

R\$250.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : BRODOWSKI

Código: 201151 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BRODOWSKI

Código: 201153 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : BURITIZAL

Código: 100056 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma unidade escolar com 4 salas de aula, sala p/ vídeo, copa-cozinha, sanitários, administração e equipamentos de esporte e lazer. Área const. = 816, 52m², piscina 18,00m², jardins gramados = 768,48m²

Data de Início: 01/01/94

Data de Paralisação: 01/04/94

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

R\$225.849,00

Município : CAMPINAS

Código: 200114 Ministérios

Descrição da Obra: Construção do prédio da Fonte Iluz Sincotron

Data de Início: 01/11/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão: R\$61.952,00

Município : CAMPINAS

Código: 201154 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Geral

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : CAMPO LIMPO PAULISTA

Código: 100237 Estados / Municípios

Descrição da Obra: TRANSPOSIÇÃO EM DESNÍVEL DAS LINHAS CBTU DISTRITO DE BOTUJURU

Data de Início: 06/10/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 0

Valor para Conclusão:

R\$1.500.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : CAMPO LIMPO PAULISTA Código: 100238 Estados / Municípios

Descrição da Obra: REMODELAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão: R\$2.000.000,00

Município : CAMPOS NOVOS PAULISTA Código: 100059 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma Escola Pública c/ 04 salas de aula

Data de Início: 13/01/94 Data de Paralisação: 23/06/94 Percentual Concluído: 43,96

Valor para Conclusão: R\$162.069,00

Município : CARAPICUIBA Código: 100538 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Hospital Geral de Carapicuíba: edificação em 6 pavimentos, contendo Pronto Socorro, Ambulatório, Clínica Médica, Centro Cirúrgico, Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, podendo contar em casos especiais com serviços de UTI. Capacidade de 220 leitos.

Data de Início: 04/10/89 Data de Paralisação: 30/06/91 Percentual Concluído: 48

Valor para Conclusão: R\$11.306.822,00

Município : CARAPICUIBA Código: 100966 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rede de Esgoto, Coletor, Emissário de Recalque e EEE's de Carapicuíba

Data de Início: 17/02/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 24

Valor para Conclusão: R\$2.404.420,00

Município : CASA BRANCA Código: 200614 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 20/12/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 98

Valor para Conclusão:

Município : CERQUEIRA CESAR Código: 100148 Estados / Municípios

Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO CARDOSO DE OLIVEIRA, Nº 77.

Data de Início: 29/01/88 Data de Paralisação: 31/12/88 Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão: R\$180.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município :	CERQUILHO	Código:	100151	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de uma unidade escolar para ensino fundamental com 09 salas de aula com área total de construção de 1.501,19 m ²			
Data de Início:	26/04/92	Data de Paralisação:	10/10/92	Percentual Concluído: 35
Valor para Conclusão:	R\$390.000,00			

Município :	COLINA	Código:	200443	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				

Município :	CONCHAL	Código:	100564	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau			
Data de Início:	01/11/90	Data de Paralisação:	30/12/90	Percentual Concluído: 37
Valor para Conclusão:	R\$314.118,00			

Município :	CONCHAL	Código:	200615	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	25/08/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 85
Valor para Conclusão:				

Município :	CRAVINHOS	Código:	100147	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de um prédio (pré-escola) com 04 (quatro) salas de aula, pátio coberto, sanitários masculino e feminino, diretoria, cozinha, despensa, almoxarifado, sala de professores.			
Data de Início:	01/04/94	Data de Paralisação:	31/12/94	Percentual Concluído: 49,4
Valor para Conclusão:	R\$129.145,00			

Município :	CRUZEIRO	Código:	200616	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	25/08/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 83
Valor para Conclusão:				

14-nov-95

Código: 201155 **Ministérios**

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 35

Código: 100965 **Estados / Municipios**

Data de Paralisação:

Percentual Conclusão: 33

R\$2.338.453,00

Código: 200617 **Ministérios**

Data de Paralisação:

Percentual Concluido: 1

Código: 100539 **Estados / Municipios**

s, contendo Pronto Socorro,
ologia, Obstetrícia e Pediatria,
I. Capacidade de 220 leitos.

Data de Paralisação: 31/07/91

Percentual Concluido: 44

R\$14.440.832,00

Código: 100300 Estados / Municípios

acional "Emílio Zannata".

Data de Paralisação: 09/02/95

Percentual Concluido: 48

R\$247.547,00

Código: 100301 **Estados / Municípios**

to de Jamaica

Data de Paralisação: 25/11/94

Percentual Concluido: 46

R\$22.568,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município :	DRACENA	Código:	100302	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Emissário de Esgoto Sanitário e Sistema de Tratamento de Esgoto por Lagoas de Estabilização. Bacia F - Jardim Jussara - 2º Lote PROSEGE.			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$460.382,00			
Município :	EMBU	Código:	100462	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Regional de Pirajussara, localizado na divisa dos Municípios de Embu e Taboão da Serra, previsto para contar com 220 leitos, com as especialidades de Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia, Toco-Ginecologia e Psiquiatria, Banco de Sangue, Laboratóri			
Data de Início:	04/10/89	Data de Paralisação:	31/03/91	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$6.950.787,00			
Município :	ENGENHEIRO COELHO	Código:	100463	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Ampliação da E.T.A., da adutora de Água Bruta, do emissário de esgoto; construção: estação de esgoto e anel de reforço de Água Limpa.			
Data de Início:	01/05/94	Data de Paralisação:	30/06/94	Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:	R\$3.528.735,00			
Município :	ESTRELA D'OESTE	Código:	100065	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de uma escola de ensino fundamental			
Data de Início:	07/11/94	Data de Paralisação:	24/12/95	Percentual Concluído: 53
Valor para Conclusão:	R\$113.400,00			
Município :	FERNANDOPOLIS	Código:	100404	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	CAIC - Centro de Atendimento Integral a Criança.			
Data de Início:	19/11/94	Data de Paralisação:	15/01/95	Percentual Concluído: 66,12
Valor para Conclusão:	R\$400.000,00			
Município :	FERNANDOPOLIS	Código:	200618	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	17/09/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 81
Valor para Conclusão:				

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : **FERRAZ DE VASCONCELOS** Código: 100968 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rede de Esgotos e Coletor Tronco de Ferraz de Vasconcelos.
Data de Início: 17/02/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 82
Valor para Conclusão: R\$295.165,00

Município : **FRANCA** Código: 200619 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 01/09/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 43
Valor para Conclusão:

Município : **GASTAO VIDIGAL** Código: 100111 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da 1ª etapa de prédio escola na zona urbana para ensino fundamental.
Data de Início: 02/05/94 Data de Paralisação: 30/07/94 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão: R\$51.000,00

Município : **GUARUJA** Código: 100303 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Produrb Paecará II. Recuperação do Canal da Av. Luiz Gama.
Data de Início: 02/01/91 Data de Paralisação: 31/12/92 Percentual Concluído: 82,18
Valor para Conclusão: R\$528.762,00

Município : **GUARUJA** Código: 100964 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Sistema de Esgotos Sanitários
Data de Início: 03/03/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 52
Valor para Conclusão: R\$3.926.095,00

Município : **GUARUJA** Código: 200121 Ministérios
Descrição da Obra: Ampliação do Terminal para Contêineres na margem esquerda do Porto de Santos.t
Data de Início: 30/07/88 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 37,49
Valor para Conclusão: R\$93.974.816,00

14-nov-95

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Município :	GUARULHOS	Código:	100540	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Geral de Guarulhos: edificação em 6 pavimentos, contendo Pronto Socorro, Ambulatório, Clínica Médica, Centro Cirúrgico, Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, podendo contar em casos especiais com serviços de UTI. Capacidade de 280 leitos.			
Data de Início:	15/09/89	Data de Paralisação:	31/07/91	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$14.054.794,00			

Município : GUARULHOS **Código:** 200222 **Ministérios**

Descrição da Obra: Execução das obras remanescentes de terraplenagem pavimentação e obras de arte especiais, necessárias à conclusão do Lote 2.1. e 2.2. Extensão de 10,90 Km.

Data de Início: 22/10/93 **Data de Paralisação:** 31/12/93 **Percentual Concluído:** 3,89

Valor para Conclusão: R\$50.800.000,00

Município : HORTOLANDIA Código: 200620 Ministérios
 Descrição da Obra: CAICS
 Data de Início: 17/09/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 69
 Valor para Conclusão:

Município :	IPORANGA	Código:	100547	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Centro de Visitantes - Núcleo Ouro Grosso - Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira - PETAR			
Data de Início:	02/03/95	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão:			R\$35.300,00	

Município : IPORANGA **Código:** 100971 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Centro de Visitantes Núcleo Ouro Grosso - Petar

Data de Início: 03/03/95 **Data de Paralisação:** 28/07/95 **Percentual Concluído:** 70

Valor para Conclusão: R\$37.949,00

Município : ITAJOBÍ **Código:** 201157 **Ministérios**
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:**
Valor para Conclusão:

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : ITAJU

Código: 201158 **Ministérios**

Descrição da Obra: Pronto Socorro

Data de Início: 01/01/91**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido:

Valor para Conclusão:

Município : ITAPECERICA DA SERRA

Código: 100321 **Estados / Municípios**

Descrição da Obra: Hospital Regional de Itapecerica da Serra com 150 leitos situado no Município de Itapecerica da Serra e será retaguarda para os Municípios de Embu-Guaçu, Juquitiba e São Lourenço da Serra, totalizando 150.000 habitantes.

Data de Início: 08/10/89

Data de Paralisação: 02/01/91

Percentual Concluido: 52

Valor para Conclusão:

R\$5.000.000,00

Município : ITAPECERICA DA SERRA

Código: 100541 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Hospital Geral de Itapeçerica da Serra: será constituído de 12 prédios (hospital pavilhonar) interligados que abrigarão os serviços de apoio, centro cirúrgico e obstétrico, pronto socorro, ambulatório e radiologia, enfermarias, clínica médica e internação

Data de Início: 05/10/89

Data de Paralisação: 30/06/91

Percentual Concluido: 55

Valor para Conclusão:

R\$5.024.721,00

Município : ITAPEVI

Código: 100537 **Estados / Municipios**

Descrição da Obra: Hospital Geral de Itapevi: Edificação em 6 pavimentos, contendo Pronto Socorro, Ambulatório, Clínica Médica, Centro Cirúrgico, Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, podendo contar em casos especiais, com serviços de,UTI. Capacidade de 220 leitos.

Data de Início: 02/04/90**Data de Paralisação: 04/09/93**

Percentual Concluido: 45

Valor para Conclusão:

R\$8.966.749,00

Município : ITAPOLIS

Código: 200445 **Ministérios**

Descrição da Obra: Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras

Data de Início:**Data de Paralisação:**

Percentual Concluido: 50

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : ITAQUAQUECETUBA Código: 100544 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Geral de Itaquaquecetuba: edificação em 6 pavimentos, contendo Pronto Socorro, Ambulatório, Clínica Médica, Centro Cirúrgico, Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, podendo contar em casos especiais com serviços de UTI. Capacidade de 220 leitos.

Data de Início: 06/11/89 Data de Paralisação: 30/06/91 Percentual Concluído: 53
Valor para Conclusão: R\$12.042.484,00

Município : ITATIBA Código: 200621 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 04/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : ITIRAPUA Código: 100057 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção da Pré-Escola Municipal
Data de Início: 14/10/94 Data de Paralisação: 30/12/94 Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$50.000,00

Município : ITIRAPUA Código: 201159 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : ITIRAPUA Código: 100058 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Construção do Hospital Municipal
Data de Início: 04/11/94 Data de Paralisação: 30/12/94 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$180.000,00

Município : ITUVERAVA Código: 100152 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola Municipal de 1º Grau
Data de Início: 04/10/91 Data de Paralisação: 10/01/92 Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão: R\$245.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : JABOTICABAL Código: 100975 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Reforma e ampliação da Biblioteca Central

Data de Início: 20/01/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 90

Valor para Conclusão: R\$30.000,00

Município : JACAREI Código: 201160 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : JALES Código: 100436 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Escola de primeiro grau do conjunto habitacional JACB.

Data de Início: 01/01/92 Data de Paralisação: 31/12/93 Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão: R\$400.000,00

Município : JALES Código: 200622 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 25/08/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 81

Valor para Conclusão:

Município : JUNQUEIROPOLIS Código: 100067 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Prédio escolar c/ 6 salas de aula e anexos e quadra coberta. Destina-se ao ensino fundamental voltado para a qualificação para o trabalho.

Data de Início: 26/10/93 Data de Paralisação: 16/05/94 Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$403.708,00

Município : JUQUIA Código: 100205 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Obras e serviços de implantação e pavimentação do dispositivo do Km 413,30 da estrada BR-116, Régis Bitencourt, acesso à cidade de Juquiá, duplicação entre o KM 411,5 e o Km 415,20 inclusive melhoramentos e recapeamento da pista existente,

Data de Início: 20/12/91 Data de Paralisação: 30/06/94 Percentual Concluído: 44

Valor para Conclusão: R\$7.200.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : LAVRINHAS

Código: 200221 Ministérios

Descrição da Obra: Execução das obras de construção do acesso para Lavinha- Cruzeiro.

Data de Início: 28/07/94

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 0,5

Valor para Conclusão: R\$1.500.000,00

Município : LEME

Código: 200623 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 27/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

Município : LINS

Código: 200624 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 23/07/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 94

Valor para Conclusão:

Município : LORENA

Código: 100550 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Escola de Ensino Fundamental. Pavimento em alvenaria em bloco estrutural e aparente com cobertura metálica e 554,00 m² de área construída no Bairro Jardim Novo Horizonte (Bairro Operário).

Data de Início: 02/01/95

Data de Paralisação: 05/06/95

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

R\$150.000,00

Município : LORENA

Código: 100551 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Escola de Ensino Fundamental, em Pavimento, alvenaria em bloco de concreto estrutural e aparente com cobertura metálica e 554,00 m² de área construída localizada no Bairro Industrial (Bairro Operário).

Data de Início: 01/02/95

Data de Paralisação: 31/03/95

Percentual Concluído: 5

Valor para Conclusão:

R\$290.000,00

Município : LORENA

Código: 200625 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 27/09/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : LORENA

Código: 201161 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : MACAUBAL

Código: 100149 Estados / Municípios

Descrição da Obra: PRE ESCOLA C/ 04 CLASSES.

Data de Início: 05/09/94

Data de Paralisação: 05/03/95

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

R\$200.000,00

Município : MACEDONIA

Código: 100063 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de matadouro municipal

Data de Início: 27/03/92

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão:

R\$20.000,00

Município : MACEDONIA

Código: 100064 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de um prédio destinado a pré escola

Data de Início: 29/10/94

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 60

Valor para Conclusão:

R\$35.000,00

Município : MAIRIPORA

Código: 200228 Ministérios

Descrição da Obra: Modernização e Ampliação da Capacid. da Rod. BR-381/SP - Fernão Dias, no est. de São Paulo, compreendendo a implantação e paviment. da 2ª pista entre os km 36,3 (interseção c/ a rod. SP-65 D. Pedro I) e o km 90 (interseção c/ a rod. BR-116 - Presid. Dutra

Data de Início: 13/04/94

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 20

Valor para Conclusão:

Município : MAIRIPORA

Código: 200229 Ministérios

Descrição da Obra: Modernização e Ampliação da Capacidade da Rodovia BR-381/SP Fernão Dias no estado de São Paulo, compreendendo a implantação e pavimentação da 2ª pista entre os km 36,3 (interseção c/ a rod. BR-116 - Pres. Dutra) (Lote 3).

Data de Início: 13/04/94

Data de Paralisação: 31/12/94

Percentual Concluído: 2,4

Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : MARACAI Código: 100159 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Escola Municipal
Data de Início: 03/01/92 Data de Paralisação: 31/03/92 Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão: R\$400.000,00

Município : MARTINOPOLIS Código: 100150 Estados / Municípios
Descrição da Obra: PROSEGE- Sistema de Esgotamento Sanitário de Martinópolis- SP.
Data de Início: 30/07/93 Data de Paralisação: 27/12/93 Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão: R\$600.000,00

Município : MATAO Código: 100156 Estados / Municípios
Descrição da Obra: PRÉDIO COMPLETO COM AMBIENTES PEDAGÓGICOS,
ADMINISTRATIVOS, MÉDICO- ODONTOLÓGICOS, COZINHA, REFEITÓRIO,
BIBLIOTECA, QUADRAS DESPORTIVAS DESCOBERTAS, GINÁSIO
POLIESPORTIVO COBERTO, OFICINAS, ETC.
Data de Início: 02/05/94 Data de Paralisação: 31/01/95 Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão:

Município : MATAO Código: 200626 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 27/04/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 64
Valor para Conclusão:

Município : MATAO Código: 201162 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : MAUA Código: 200627 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 15/07/92 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 43
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **SP**Município : **MIGUELOPOLIS**

Código: 201163 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade Mista

Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 77,86

Valor para Conclusão: R\$30.000,00

Município : **MIRA ESTRELA**

Código: 201164 Ministérios

Descrição da Obra: Centro de Saúde

Data de Início: 01/01/94 Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão:

Município : **MIRASSOL**

Código: 100410 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção da Escola Urbana com área de 1201,48 m²

Data de Início: 30/06/94 Data de Paralisação: 08/12/94 Percentual Concluído: 36

Valor para Conclusão: R\$231.000,00

Município : **MONCOES**

Código: 100055 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Escola de ensino fundamental

Data de Início: 01/08/94 Data de Paralisação: 01/12/94 Percentual Concluído: 50

Valor para Conclusão: R\$100.000,00

Município : **MONTE APRAZIVEL**

Código: 100153 Estados / Municípios

Descrição da Obra: ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU com 8 salas de aula e dependências administrativas e áreas de lazer- quadras de esportes, etc.

Data de Início: 02/05/94 Data de Paralisação: 01/04/95 Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão: R\$80.000,00

Município : **MOTUCA**

Código: 201165 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 55

Valor para Conclusão: R\$200.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : OLIMPIA **Código:** 100565 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção de Nova Estação de Tratamento de Água, adutora de água bruta e sistema de distribuição.**Data de Início:** 15/03/94 **Data de Paralisação:** 23/10/94 **Percentual Concluído:** 40**Valor para Conclusão:** R\$4.000.000,00

Município : OSASCO **Código:** 200628 **Ministérios****Descrição da Obra:** CAICS**Data de Início:** 22/07/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 80**Valor para Conclusão:**

Município : OURINHOS **Código:** 201166 **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Geral**Data de Início:** 01/01/90 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:**

Município : OURINHOS **Código:** 100235 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL GERAL COM 7 PAVIMENTOS, COM ÁREA DE 14.700,00 m² CAPACIDADE NOMINAL OPERACIONAL DE 200 LEITOS.**Data de Início:** 13/09/90 **Data de Paralisação:** 24/03/92 **Percentual Concluído:** 15**Valor para Conclusão:** R\$20.424.027,00

Município : OURINHOS **Código:** 100236 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 10 SALAS DE AULA EM 2 PAVIMENTOS E UMA ZELADORIA COM ÁREA DE 1.678,76 m², E UMA QUADRA POLIESPORTIVA**Data de Início:** 28/11/90 **Data de Paralisação:** 20/02/91 **Percentual Concluído:** 7**Valor para Conclusão:** R\$1.061.000,00

Município : PALMITAL **Código:** 100206 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Unidade escolar do ciclo pré-escolar com área de construção igual a 406,88 m².**Data de Início:** 21/10/94 **Data de Paralisação:** 14/12/94 **Percentual Concluído:** 60**Valor para Conclusão:** R\$65.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município :	PENAPOLIS	Código:	100169	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção de uma unidade escolar de 1º grau, no Bairro Jardim Delrey, na Rua Soldado PM Guerino Polônio, s/nº, com 840,82 m².			
Data de Início:	15/08/94	Data de Paralisação:	29/05/95	Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão:	R\$98.000,00			

Município :	PIEDADE	Código:	100154	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	MINI - CEASA ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO = 2.000 m²			
Data de Início:	17/01/94	Data de Paralisação:	18/05/94	Percentual Concluído: 70
Valor para Conclusão:	R\$250.000,00			

Município :	PIEDADE	Código:	100155	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Unidade Central de Saúde. Área de construção total: 882,03 m².			
Data de Início:	26/05/94	Data de Paralisação:	13/07/94	Percentual Concluído: 7
Valor para Conclusão:	R\$850.000,00			

Município :	PINDAMONHANGABA	Código:	200220	Ministérios
Descrição da Obra:	Execução de obras de implantação e pavimentação das alças do Trevo de acesso que constituem as obras de construção da 1ª fase do dispositivo de interseção das pistas em desnível, de acesso a Villares e Moreira Cesar.			
Data de Início:	14/10/92	Data de Paralisação:	31/12/93	Percentual Concluído: 15
Valor para Conclusão:	R\$2.500.000,00			

Município :	PIRACICABA	Código:	200629	Ministérios
Descrição da Obra:	CAICS			
Data de Início:	25/08/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 69
Valor para Conclusão:				

Município :	PIRACICABA	Código:	201167	Ministérios
Descrição da Obra:	Posto de Saúde			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 56
Valor para Conclusão:	R\$128.172,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : PIRACICABA

Código: 201168 Ministérios

Descrição da Obra: Unidade de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 23

Valor para Conclusão: R\$225.014,00

Município : POA

Código: 201169 Ministérios

Descrição da Obra: Hospital Municipal

Data de Início: 01/01/91

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 70

Valor para Conclusão:

Município : POA

Código: 100209 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Conclusão da obra do Hospital Municipal de Poá, já iniciada, restando o acabamento final p/ o seu funcionamento.

Data de Início: 01/03/94

Data de Paralisação: 30/11/94

Percentual Concluído: 80

Valor para Conclusão:

R\$1.100.000,00

Município : POA

Código: 100963 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rede de esgoto e coletor tronco Guaió

Data de Início: 17/02/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

R\$1.405.976,00

Município : POLONI

Código: 100060 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de Escola com 495,36 m²

Data de Início: 03/02/94

Data de Paralisação: 20/11/94

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

R\$120.000,00

Município : PONTALINDA

Código: 100068 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção da pré-escola

Data de Início: 06/01/94

Data de Paralisação: 21/03/94

Percentual Concluído: 25

Valor para Conclusão:

R\$160.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : PONTALINDA

Código: 201170 Ministérios

Descrição da Obra: Posto de Saúde

Data de Início: 01/01/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : PORTO FERREIRA

Código: 200630 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 17/09/93

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 89

Valor para Conclusão:

Município : PRESIDENTE BERNARDES

Código: 100304 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção de uma Escola de Ensino Fundamental

Data de Início: 01/03/92

Data de Paralisação: 31/08/92

Percentual Concluído: 40

Valor para Conclusão:

R\$45.000,00

Município : QUINTANA

Código: 100157 Estados / Municípios

Descrição da Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DE QUINTANA, COMPOSTO DE 10.737 ML DE REDE COLETORA, 1.150 ligações domiciliares, 09 fossas sépticas e 09 filtros anaeróbicos.

Data de Início: 30/06/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 63

Valor para Conclusão:

R\$870.327,00

Município : REGENTE FEIJÓ

Código: 100158 Estados / Municípios

Descrição da Obra: Escola Municipal composta de seis salas de aula, sanitários, cozinha, secretaria, com a área de 500 m², em fase de receber a cobertura.

Data de Início: 31/07/93

Data de Paralisação: 31/03/94

Percentual Concluído: 32

Valor para Conclusão:

R\$95.000,00

Município : RIBEIRAO PRETO

Código: 200631 Ministérios

Descrição da Obra: CAICS

Data de Início: 01/11/94

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : RIBEIRAO PRETO**Código: 201171** Ministérios**Descrição da Obra:** Hospital de Oncologia**Data de Início:** 01/01/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município : ROSEIRA****Código: 100061** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Prédio para escola de ensino fundamental, localizada no bairro resid. Primavera com área de construção de 701,59m².**Data de Início:** 11/11/94**Data de Paralisação:** 24/04/95**Percentual Concluído:** 53**Valor para Conclusão:**

R\$64.449,00

Município : SAO JOSE DA BELA VISTA**Código: 201173** Ministérios**Descrição da Obra:** Posto de Saúde**Data de Início:** 01/01/94**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 70**Valor para Conclusão:** R\$30.000,00**Município : SAO JOSE DO RIO PRETO****Código: 100062** Estados / Municípios**Descrição da Obra:** Ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, com extensão de 2.600m, com viadutos de acesso rodoviário de 1.170 m e acesso ferroviário da Ponte a Santa Fé do Sul com extensão de 17.000 m.**Data de Início:** 24/01/91**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 58,75**Valor para Conclusão:**

R\$282.400.000,00

Município : SAO JOSE DOS CAMPOS**Código: 200115** Ministérios**Descrição da Obra:** OBRA CIVIL DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DO PRÉDIO DO C.T.E. (CENTRO DE TECNOLOGIA ASSOCIADAS).**Data de Início:** 30/12/94**Data de Paralisação:** 23/05/95**Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:** R\$1.500.000,00**Município : SAO JOSE DOS CAMPOS****Código: 201174** Ministérios**Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** 01/01/93**Data de Paralisação:****Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : **SAO JOSE DOS CAMPOS** Código: 101037 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Viaduto Kanebo - Km 154,2 da via Presidente Dutra
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **SAO JOSE DOS CAMPOS** Código: 101038 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 100542 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Pérola Byington (Anexo): edificação em 2 pavimentos, subsolo, térreo e cobertura, contendo radioterapia (acelerador linear, gama, camara, HDR), biotério, morgue, oficinas e estacionamentos de veículos na cobertura. Sobre a cobertura do Anexo será
Data de Início: 21/02/91 Data de Paralisação: 31/10/94 Percentual Concluído: 26
Valor para Conclusão: R\$1.819.673,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 100543 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Hospital Geral do Itaim Paulista: edificação em 6 pavimentos, contendo Pronto Socorro, Ambulatório, Clínica Médica, Centro Cirúrgico, Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria, podendo contar em casos especiais com serviços de UTI. Capacidade de 220 leitos.
Data de Início: 03/07/89 Data de Paralisação: 04/12/94 Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão: R\$6.943.828,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200078 Ministérios
Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DE 30,000 M² PARA O EDIFÍCIO-SEDE DA SR/DPF/SP
Data de Início: 14/12/88 Data de Paralisação: 01/03/94 Percentual Concluído: 6,83
Valor para Conclusão: R\$19.180.000,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200110 Ministérios
Descrição da Obra: Construção de prédio na Região Fiscal de Ipiranga com 1.035m² e 3 pavimentos e subsolo.
Data de Início: 01/02/88 Data de Paralisação: 31/03/89 Percentual Concluído: 65
Valor para Conclusão: R\$2.500.000,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200632 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 17/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200633 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 17/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 3
Valor para Conclusão:

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200634 Ministérios
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 06/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão:

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200647 Ministérios
Descrição da Obra: Sinalização STU.
Data de Início: 14/05/81 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 60
Valor para Conclusão: R\$110.000,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200648 Ministérios
Descrição da Obra: Reforma das estações de Mooca, Ipiranga, Utinga, Guapituba e Rio Grande da Serra
Data de Início: 13/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 9,3
Valor para Conclusão: R\$772.527,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200652 Ministérios
Descrição da Obra: Serviços de reforma das estações Comendador e Matarazo São Miguel Paulista, Itaim Itaguecetuba.
Data de Início: 08/02/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão: R\$1.374.289,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200653 Ministérios
Descrição da Obra: Elaboração de projetos fabricação e fornecimento de materiais e equipamentos para implantação Sistema Sinalização Campo
Data de Início: 11/04/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 33,2
Valor para Conclusão: R\$2.323.512,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200654 Ministérios
Descrição da Obra: Implantação do Sistema de Telecomunicações
Data de Início: 12/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 25,1
Valor para Conclusão: R\$15.273.561,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200655 Ministérios
Descrição da Obra: Sistema de Transmissão de Dados
Data de Início: 11/04/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 35,9
Valor para Conclusão: R\$1.867.361,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200656 Ministérios
Descrição da Obra: Renovação da superestrutura da via permanente linha leste.
Data de Início: 11/04/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 20,1
Valor para Conclusão: R\$1.627.656,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200657 Ministérios
Descrição da Obra: Fornecimento e serviços série 101 - 23TUE
Data de Início: 25/04/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 2,5
Valor para Conclusão: R\$39.366.065,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200658 Ministérios
Descrição da Obra: Renovação da superestrutura da via permanente Santo/Jundiaí.
Data de Início: 18/04/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 16,5
Valor para Conclusão: R\$2.847.861,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200659 Ministérios
Descrição da Obra: Fornecimento e execução para implantação dos sistemas de sonorização de TUE e rádio comunicação terra
Data de Início: 26/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 48,6
Valor para Conclusão: R\$7.407.099,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200660 Ministérios
Descrição da Obra: Fornecimento execução serviço de modernização de 11 TUE série 160 (lote 1 e 2)
Data de Início: 26/05/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 6,3
Valor para Conclusão: R\$12.573.589,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200661 Ministérios
Descrição da Obra: Construção da estação de Lajeado
Data de Início: 07/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão: R\$1.251.133,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200662 Ministérios
Descrição da Obra: Fornecimento instalação de Sistema de parada automática de trens (ATS)
Data de Início: 27/10/94 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 14,9
Valor para Conclusão: R\$13.765.116,00

Município : **SAO PAULO (CAPITAL)** Código: 200663 Ministérios
Descrição da Obra: Serviços de construção de edificações para implantação do laboratório de manutenção
Data de Início: 13/03/95 Data de Paralisação: Percentual Concluído: 0
Valor para Conclusão: R\$1.759.085,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : SAO PAULO (CAPITAL) **Código:** 200664 **Ministérios**
Descrição da Obra: Serviços de recuperação geral de 08 locomotivas alcors 3 e fornecimento de materiais e equipamentos
Data de Início: 27/03/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 0
Valor para Conclusão: R\$6.674.485,00

Município : SAO PAULO (CAPITAL) **Código:** 200665 **Ministérios**
Descrição da Obra: Serviço de reforma das estações Itaquera, XV Novembro, Guaianazes e Jundiapéba.
Data de Início: 13/03/95 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 8,5
Valor para Conclusão: R\$745.356,00

Município : SAO PAULO (CAPITAL) **Código:** 200666 **Ministérios**
Descrição da Obra: Projeto, fornecimento, instalação e montagem de subestações elétricas e cabines seccionadoras
Data de Início: 14/05/82 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 60
Valor para Conclusão: R\$18.300,00

Município : SAO PAULO (CAPITAL) **Código:** 200667 **Ministérios**
Descrição da Obra: Recuperação da infraestrutura da via permanente Gualberto/Roosevelt linha T. zona leste (km 490+600/497+310)
Data de Início: 01/10/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 46,1
Valor para Conclusão: R\$1.010.188,00

Município : SAO PAULO (CAPITAL) **Código:** 200668 **Ministérios**
Descrição da Obra: Recuperação da infraestrutura via permanente Gualberto Roosevelt linha T. zona leste (km. 492+400/499+153)
Data de Início: 01/10/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 29,8
Valor para Conclusão: R\$670.048,00

Município : SAO PAULO (CAPITAL) **Código:** 200669 **Ministérios**
Descrição da Obra: Serviços de construção de A3 valas de inspeção de trens BA extensão do abrigo "a"/mecânica lapa
Data de Início: 01/10/93 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 70
Valor para Conclusão: R\$70.066,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **SP**Município : **SAO PAULO (CAPITAL)**Código: **200670** MinistériosDescrição da Obra: **Fornecimento e execução dos serviços de modernização de 12 TUS série 400 (lote 1 e 2)**Data de Início: **01/10/93**

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: **85,3**Valor para Conclusão: **R\$1.502.937,00**Município : **SAO VICENTE**Código: **201175** MinistériosDescrição da Obra: **Posto de Saúde**Data de Início: **01/01/93**

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: **15**Valor para Conclusão: **R\$10.000,00**Município : **SAO VICENTE**Código: **201176** MinistériosDescrição da Obra: **Hospital Regional**Data de Início: **01/01/90**

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

Município : **SANTA FE DO SUL**Código: **100972** Estados / MunicípiosDescrição da Obra: **Construção da Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná**Data de Início: **24/01/91**

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: **58,75**

Valor para Conclusão:

R\$282.613.582,00Município : **S.RITA DO PASSA QUATRO**Código: **200636** MinistériosDescrição da Obra: **CAICS**Data de Início: **01/09/94**

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: **1**

Valor para Conclusão:

Município : **SANTANA DE PARNAIBA**Código: **100962** Estados / MunicípiosDescrição da Obra: **Rede de esgoto, coletor, linha de recalque e EEE's de Santana do Parnaíba**Data de Início: **17/02/94**

Data de Paralisação:

Percentual Concluído: **23**

Valor para Conclusão:

R\$1.329.884,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : SANTANA DE PARNAIBA **Código:** 201172 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/91 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 70
Valor para Conclusão:

Município : SANTO ANDRE **Código:** 100545 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Hospital Geral de Santo André: obras de complementação do Hospital que estava apenas com a estrutura executada: o Hospital atenderá as seguintes especialidades: Pronto Socorro, Ambulatório, Clínica Médica, Centro Cirúrgico, Ginecologia, Obstetrícia e Pedi
Data de Início: 04/12/89 **Data de Paralisação:** 30/06/91 **Percentual Concluído:** 45
Valor para Conclusão: R\$16.281.585,00

Município : SANTOS **Código:** 200124 **Ministérios**
Descrição da Obra: Ampliação e recuperação do cais de Valongo/Paqueta no Porto de Santos.
Data de Início: 28/02/85 **Data de Paralisação:** 31/10/94 **Percentual Concluído:** 42,05
Valor para Conclusão: R\$97.300.000,00

Município : SERTAOZINHO **Código:** 200635 **Ministérios**
Descrição da Obra: CAICS
Data de Início: 09/03/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 49
Valor para Conclusão:

Município : SUMARE **Código:** 100066 **Estados / Municípios**
Descrição da Obra: Hospital Regional de Sumaré
Data de Início: 07/12/89 **Data de Paralisação:** 07/03/92 **Percentual Concluído:** 41
Valor para Conclusão: R\$27.604.000,00

Município : TABOAO DA SERRA **Código:** 201177 **Ministérios**
Descrição da Obra: Hospital Geral
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 60
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: SP

Município : TABOAO DA SERRA **Código:** 100234 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção de Hospital Regional do Pirajuçara com capacidade para 220 leitos**Data de Início:** 02/01/89 **Data de Paralisação:** 31/12/90 **Percentual Concluído:** 50**Valor para Conclusão:** R\$10.000.000,00**Município :** TAQUARITINGA **Código:** 201178 **Ministérios****Descrição da Obra:** Hospital Municipal**Data de Início:** 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 10**Valor para Conclusão:****Município :** UNIAO PAULISTA **Código:** 100425 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Construção de uma Pré-Escola Municipal.**Data de Início:** 01/08/94 **Data de Paralisação:** 31/03/95 **Percentual Concluído:** 70**Valor para Conclusão:** R\$80.000,00**Município :** URANIA **Código:** 201179 **Ministérios****Descrição da Obra:** Unidade de Saúde**Data de Início:** 01/01/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:****Valor para Conclusão:****Município :** VALINHOS **Código:** 100306 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Ampliação do complexo hospitalar (constituído de pediatria, berçário, cirurgia e unidade de serviço, num total de 1.430 m²), dando um total de 1.825,00 m².**Data de Início:** 27/09/93 **Data de Paralisação:** 30/09/94 **Percentual Concluído:** 25**Valor para Conclusão:** R\$300.000,00**Município :** VARGEM **Código:** 100161 **Estados / Municípios****Descrição da Obra:** Pré-Escola do Município de Vargem, com área de 683, 25m² localizado na Rua Fioravante Restivo, antiga Rua Julio Preste.**Data de Início:** 03/01/94 **Data de Paralisação:** 30/12/94 **Percentual Concluído:** 54**Valor para Conclusão:** R\$56.231,00

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS**INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS****Unidade da Federação: SP****Unidade da Federação: SP****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :****R\$390.896.200,00****Total de Obras, informado pelos Ministérios :****100****Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:****R\$1.259.852.713,00****Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :****89**

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: TO

Município :	TOCANTINS	Código:	101032	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR 230 - Transamazônica com 150 km de extensão.			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$20.000.000,00			
Município :	TOCANTINS	Código:	101033	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Rodovia BR 235 com 167 km de extensão até a divisa com o Maranhão.			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$22.000.000,00			
Município :	ALMAS	Código:	200448	Ministérios
Descrição da Obra:	Escola de 1º grau com percentual executado acima de 50% e recursos repassados pelo FNDE através de convênios com as prefeituras			
Data de Início:		Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 50
Valor para Conclusão:				
Município :	ARAGUACEMA	Código:	100163	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUACEMA - TO			
Data de Início:	02/01/92	Data de Paralisação:	31/01/94	Percentual Concluído: 40
Valor para Conclusão:	R\$1.000.000,00			
Município :	ARAGUACEMA	Código:	201180	Ministérios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal			
Data de Início:	01/01/93	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 80
Valor para Conclusão:				
Município :	ARAGUAINA	Código:	200300	Ministérios
Descrição da Obra:	Serviços de Conservação e Recuperação Rodoviária na BR-153/226/TO - Trecho BR-153: Div. PA/TO - Div. TO/GO - BR-226: Div. MA/TO - Araguaína - Ext. 278,3 km			
Data de Início:	16/12/94	Data de Paralisação:		Percentual Concluído: 45,56
Valor para Conclusão:	R\$766.550,00			

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **TO**

Município : COLINAS DO TOCANTINS **Código:** 101029 **Estados / Municípios :**
Descrição da Obra: Rodovia - TO 335 no trecho entre Colinas do Tocantins e Ponte Prof. Balduino
Ferreira - Divisa Tocantins-Pará com extensão de 98 km.
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 78
Valor para Conclusão: R\$5.000.000,00

Município : CONCEICAO DO TOCANTINS **Código:** 101028 **Estados / Municípios :**
Descrição da Obra: Ponte sobre o rio Palmas entre Conceição do Tocantins e Arraias com extensão de
136,0m.
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 10
Valor para Conclusão: R\$600.000,00

Município : GUARAI **Código:** 200299 **Ministérios :**
Descrição da Obra: Rodovia: BR-153/TO - Trecho: Div.MA/TO - Div.TO/GO - Subtrecho: Entr.TO-
239 (Presidente Kennedy) - Ent.TO/225(B) - Ext.: 259,1km
Data de Início: 13/10/94 **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 74,67
Valor para Conclusão: R\$165.387,00

Município : GURUPI **Código:** 200079 **Ministérios :**
Descrição da Obra: Construção da Penitenciária de Gurupi - TO
Data de Início: 19/07/88 **Data de Paralisação:** 28/12/88 **Percentual Concluído:** 80
Valor para Conclusão: R\$2.002.859,00

Município : GURUPI **Código:** 200305 **Ministérios :**
Descrição da Obra: Terraplenagem, Pavimentação, Obras de Arte Correntes e Especiais da Rodovia: BR-
242/TO - Trecho: Gurupi - Peixe - Extensão: 72,0
Data de Início: 13/04/89 **Data de Paralisação:** 30/09/93 **Percentual Concluído:** 43,11
Valor para Conclusão: R\$8.106.829,00

Município : MIRACEMA DO TOCANTINS **Código:** 101027 **Estados / Municípios :**
Descrição da Obra: Ponte de Concreto armado e protendido sobre o rio Tocantins com extensão Total de
879,0 m situado na rodovia TO-10 entre Miracema do Tocantins e Tocantínia.
Data de Início: **Data de Paralisação:** **Percentual Concluído:** 23,86
Valor para Conclusão: R\$26.000.000,00

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **TO**

Município :	NATIVIDADE	Código:	201181	Ministérios
Descrição da Obra:	Unidade de Saúde			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:	Percentual Concluído:	
Valor para Conclusão:				

Município :	NOVO ACORDO	Código:	100464	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Creche Padrão - Programa Pronave. LBA/Banco do Brasil com aproximadamente 500m². Perímetro urbano.			
Data de Início:	01/01/91	Data de Paralisação:	31/12/92	Percentual Concluído: 45
Valor para Conclusão:	R\$100.000,00			

Município :	NOVO ACORDO	Código:	100465	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Hospital Municipal de Novo Acordo com capacidade para 22 leitos, enfermarias, centro clínico, maternidade, consultório odontológico, etc...			
Data de Início:	01/12/91	Data de Paralisação:	21/02/92	Percentual Concluído: 30
Valor para Conclusão:	R\$350.000,00			

Município :	PALMAS	Código:	100686	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção do Hospital Geral do Estado do Tocantins - área construída: 8.300,00 m²			
Data de Início:	27/11/89	Data de Paralisação:	04/03/91	Percentual Concluído: 12,5
Valor para Conclusão:	R\$7.410.164,00			

Município :	PALMAS	Código:	100687	Estados / Municípios
Descrição da Obra:	Construção do Laboratório Central de Saúde Pública. Área construída: 5.994,38 m²			
Data de Início:	03/05/93	Data de Paralisação:	20/12/94	Percentual Concluído: 32,59
Valor para Conclusão:	R\$4.090.927,00			

Município :	PALMAS	Código:	200080	Ministérios
Descrição da Obra:	Construção da Penitenciária de Palmas TOI			
Data de Início:	07/01/91	Data de Paralisação:	04/02/93	Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:	R\$14.000.000,00			

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: **TO**

Município : **PALMAS** Código: 101026 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Centro Penitenciário de Palmas Área Construída: 3.033 m² com capacidade para 269 detentos.
Data de Início: Data de Paralisação: 30/06/93 Percentual Concluído: 1
Valor para Conclusão: R\$6.150.000,00

Município : **PEDRO AFONSO** Código: 200304 Ministérios
Descrição da Obra: Terraplenagem e Pavimentação, Obras de Arte Correnetes e Especiais - Rodovia BR-235/TO - Trecho: Pedro Afonso - Div. TO/MA - Extensão: 195,0 Km.
Data de Início: 28/04/89 Data de Paralisação: 31/08/93 Percentual Concluído: 78,3
Valor para Conclusão: R\$10.728.945,00

Município : **PEIXE** Código: 101031 Estados / Municípios
Descrição da Obra: Rodovia BR 242 no trecho entre Peixe e a divisa com a Bolívia com extensão de 280,0 km.
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão: R\$36.000.000,00

Município : **PORTO NACIONAL** Código: 201182 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Regional
Data de Início: Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **S.TEREZA DO TOCANTINS** Código: 201183 Ministérios
Descrição da Obra: Hospital Municipal
Data de Início: 01/01/90 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

Município : **SITIO NOVO DO TOCANTINS** Código: 201184 Ministérios
Descrição da Obra: Posto de Saúde
Data de Início: 01/01/91 Data de Paralisação: Percentual Concluído:
Valor para Conclusão:

SENADO FEDERAL

14-nov-95

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: TO

Município : WANDERLANDIA

Código: 200081

Ministérios

Descrição da Obra: Construção da Penitenciária de Wanderlândia - TO

Data de Início: 03/03/93

Data de Paralisação: 28/12/93

Percentual Concluído: 1,22

Valor para Conclusão: R\$9.661.275,00

Município : WANDERLANDIA

Código: 100688

Estados / Municípios

Descrição da Obra: Construção do Centro Penitenciário de Wanderlândia. Área construída: 6.314,00 m²

Data de Início: 03/03/93

Data de Paralisação: 20/12/94

Percentual Concluído: 1

Valor para Conclusão:

R\$4.697.093,00

Município : WANDERLANDIA

Código: 101030

Estados / Municípios

Descrição da Obra: Rodovia BR - 153 no trecho entre Wanderlândia e Xambioá com extensão de 90 km.

Data de Início:

Data de Paralisação:

Percentual Concluído:

Valor para Conclusão:

R\$16.000.000,00

Unidade da Federação: TO

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :

R\$45.431.845,00

Total de Obras, informado pelos Ministérios :

13

Total dos recursos para conclusão, informado pelos

Estados/Municípios:

R\$149.398.184,00

Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios :

14

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INVENTÁRIO DAS OBRAS INFORMADAS PELOS MINISTÉRIOS E PELOS ESTADOS / MUNICÍPIOS

Unidade da Federação: TO

RESUMO DO RELATÓRIO

Total dos recursos para conclusão, informado pelos Ministérios :	R\$6.073.894.750,11
Total de Obras, informado pelos Ministérios:	1172
Total dos recursos para conclusão, informado pelos Estados/Municípios:	R\$8.968.740.150,69
Total de Obras, informado pelos Estados/Municípios:	1042

SENADO FEDERAL
COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

ANEXO B

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

DEPARTMENT OF EDUCATION

REGIONAL OFFICE

SENADO FEDERAL
COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

RELATÓRIO FINAL

OBRAS CADASTRADAS PELA COMISSÃO
COM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nº	MUNICÍPIO	UF/DESCRIÇÃO DA OBRA
ALAGOAS		
1	Maceió	Hospital Geral de Maceió
2		Penitenciária Masculina de Alagoas
3	Penedo	Projeto de irrigação drenagem da Várzea de Marituba
4		Adutora Pão de Açúcar Olho d'água das flores
5	Delmiro Gouveia	Projeto de Irrigação de Moxotó
BAHIA		
6	Jeremoabo	BR-110, Jeremoabo-BA-220
7	João Dourado	Barragem Mata Milho
8	Paramirim	Barragem do Zabumbão
9	Camaçari	Centro de Saúde do Trabalhador
10	Uruçuca	Hospital Municipal
CEARÁ		
11	Fortaleza	Conservação da rodovia BR-116/C
12	Fortaleza	Barragem Paula Pessoa
13	Maracanaú	Unidade de Saúde
14	Marco	Projeto de Irrigação Baixo Acaraú
15	Mombaca	Barragem Serafim Dias
16	Morada Nova	Projeto de Irrigação Tabuleiros de Russas
17	Paraipaba	Projeto de irrigação de Curu-Paraipoba
18	Quixeramobim	Barragem Fogareiro
19	Acaraú	Projeto de irrigação Baixo Acaraú
20	Crato	Abastecimento de água e esgotamento
21	Granja	Acude público Paula Pessoa
22	Iguatu	Barragem do Rio Trussu
23	Paraipaba	Projeto de irrigação Caruparaipaba 3ª etapa
24	Russas	Projeto de irrigação do Tabuleiro de Russas
ESPÍRITO SANTO		
25	Cachoeiro de Itapemirim	Construção de estabelecimento polivalente
26	Cariacica	Duplicação da Rod. BR-262/ES - Div. ES/MG
27	Itaguaçu	Construção de 1 escola com 10 salas de aulas
MINAS GERAIS		
29		Restauração Rod. BR-116/MG Div. BA/MG Km 378,8
30		Restauração Rod. BR-116/MG Div. Ba/Mg Km 378,8/413,1

MATO GROSSO DO SUL

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 31 | Paranaíba | Posto de saúde |
| 32 | São Gabriel do Oeste | Hospital de Emergência no Loteamento Capão |
| 33 | Campo Grande | Constr. do Anel Viário de Campo Grande e acessos |

MATO GROSSO

- | | | |
|----|--------|--|
| 34 | Itauba | Implant. e pav. Rod. BR-163/MT Tr- Cuiabá/Santarem |
|----|--------|--|

PARÁ

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 35 | Santa Isabel do Pará | Constr. da Penitenciária de Segurança Máxima do Pará |
|----|----------------------|--|

PARAÍBA

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 36 | Cabaceiras | Barragem Pelo Sinal |
| 37 | Nova Olinda | Barragem Canoas |
| 38 | Picui | Barragem Varzea Grande |
| 39 | Santana de Mangueira | Barragem Poço Redondo |

PERNAMBUCO

- | | | |
|----|-------------|--|
| 40 | Belo Jardim | Barragem Belo Jardim |
| 41 | Cabo | Terrapl/Pavim. Rod. BR-101/PE Subtr. Prazeres KM 99,22 |
| 42 | Cabo | Terrapl/Pavim. Rod. BR-101/PE Subt. Prazeres KM 84,20 |
| 43 | Cabo | Obra de Arte Especiais na Rod. BR 101/PE KM 84,20 |
| 44 | Dormentes | Construção da Barragem de Chico Velho |
| 45 | Ibimirim | Projeto irrigado Moxotó |
| 46 | Petrolina | Transnordestina Cons. de 349 Km de linha férrea |
| 47 | Carnaíba | Construção de uma ponte sobre o Rio Pajeú |
| 48 | Olinda | Const. Hospital Geral de Olinda |
| 49 | Petrolina | Implantação trechos ferroviários entre Salgueiro e Petrolina |
| 50 | Surubim | Barragem Jucazinho |

PIAUI

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 51 | Guadalupe | Projeto de irrigação Platôs de Guadalupe |
| 52 | Nazaré do Piauí | Barragem Salinas |
| 53 | Parnaíba | Projeto de irrigação Tabuleiros Litorâneos |
| 54 | São João do Piauí | Barragem Jenipapo |
| 55 | Piracuruca | Projeto de irrigação |
| 56 | São Francisco do Piauí | Açude Salinas |
| 57 | Teresina | Pronto Socorro de Teresina |

PARANÁ

- | | | |
|----|----------|--|
| 58 | Curitiba | Construção do contorno Leste de Curitiba |
|----|----------|--|

RIO DE JANEIRO

- | | | |
|----|----------------|-------------------------------------|
| 59 | Rio de Janeiro | Restauração rodoviária na BR-393/RJ |
| 60 | Rio de Janeiro | Restauração rodoviária na BR-393/RJ |
| 61 | Rio de Janeiro | Restauração rodoviária na BR-101/RJ |
| 62 | Rio de Janeiro | Restauração rodoviária na BR-101/RJ |

SANTA CATARINA

63	Iajes	Barragem Santa Cruz
64	Tijucas	Serv. Restauração na BR-101/SC
65		Dragagens da Baía do Iguaçu
66	Joinville	Conclusão da BR 101

RIO GRANDE DO NORTE

67	Apodi	Construção da Barragem de Santa Cruz
----	-------	--------------------------------------

RONDÔNIA

68	Cacoal	Construção de Hospital com 150 leitos
69	Porto Velho	Construção da Casa de Detenção

RORAIMA

70	Caracarai	Pronto Socorro
71	Boa Vista	Sistema de Esgotamento sanitário de Boa Vista

RIO GRANDE DO SUL

72	Caxias do Sul	Obras de restauração de rodovias BR-116/RS Entr. 452
73	Caxias do Sul	Obras de restauração de rodovias BR-116/RS Entr. 452
74	Guaíba	Serv. de melhoramentos e restauração na BR-116/RS
75	Guaíba	Melhoramento e restauração da Rod. BR-116
76	Lajeado	Duplicação da Rodovia BR-386/RS
77	Nova Petropolis	Serv. Melhoramentos e restauração da Rod. BR-116/RS
78	São Marcos	Obras de Restauração da Rodovia BR-116/RS
79	Canoas	Recuperação de ruas laterais na Rod. 116/RS

SÃO PAULO

80	São Paulo	Rod. Régis Bittencourt BR-116 (trecho paulista) Duplicação
81	São Paulo	Rod. Régis Bittencourt BR-116 (trecho paulista) Duplicação

TOCANTINS

82	Palmas	Construção da Penitenciária de Palmas
83	Palmas	Construção do Hospital Geral do Estado

SENADO FEDERAL
COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

ANEXO C

17. 10. 1944

18. 10. 1944

SENADO FEDERAL
COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

RELATÓRIO FINAL

RELAÇÃO DAS OBRAS PRIORITÁRIAS

Nº	UNIDADE DA FEDERAÇÃO/DESCRIÇÃO	VALOR P/ CONCLUSÃO(R\$)
Acre		
1	Urbanização e Drenagem do Canal da Maternidade	(a)
2	Estação de Tratamento de Água - ETA II	(b)
3	Hospital Regional de Cruzeiro do Sul	12.500.000,00
3	Subtotal	12.500.000,00
Alagoas		
1	Hospital Geral de Maceió	23.848.200,00
2	Restauração da BR-316	3.500.000,00
3	Terminal de Granéis Líquidos do Porto de Maceió	3.000.000,00
3	Subtotal	30.348.200,00
Amapá		
1	Penitenciária Agrícola de Macapá	1.947.987,00
2	Revestimento do Canal do Belrol	21.479.197,00
3	Drenagem e Pavimentação da Baixada do Adonias	683.300,00
3	Subtotal	24.110.484,00
Amazonas		
1	Prédio da Justiça Estadual - Varas Cíveis e Criminais	16.500.000,00
2	Hospital Dona Francisca Mendes	2.000.000,00
3	BR-174, trecho Manaus-Divisa AM/RR	42.771.480,00
4	Penitenciária Agrícola Anísio Jobim	4.100.000,00
4	Subtotal	48.871.512,00
Bahia		
1	BR-116, trecho Euclides da Cunha-Entroncamento com BR-2	6.200.000,00
2	Barragem do Zabumbão	10.000.000,00
3	Projeto de Irrigação do Brumado	2.500.000,00
3	Subtotal	18.700.000,00

Ceará

1	Hospital das Clínicas da UFCE	4.722.739,00
2	Barragem Trussu, em Igatu	6.000.000,00
3	Projeto de Irrigação de Araras Norte, em Varjota	1.200.000,00
4	BR-402, trecho Marco-Granja	10.885.000,00
5	BR-402, trecho Granja-Camocim-Chaval	5.202.604,00
5	Subtotal	28.010.343,00

Distrito Federal

1	Metrô do Distrito Federal	90.600.000,00
2	Hospital Regional do Paranoá	15.456.000,00
2	Subtotal	106.056.000,00

Espírito Santo

1	Hospital Geral e Infantil de Vila Velha	8.000.000,00
2	Duplicação da BR-262 (bairros de Viana e Cariacica)	14.000.000,00
3	Construção da Segunda Ponte de Colatina	10.000.000,00
4	Complementação do Sistema de Abastecimento de água na Grande Vitória - 3ª fase	8.967.967,00
5	Hospital Geral de Linhares	1.760.000,00
5	Subtotal	32.727.967,00

Goiás

1	Contorno Sudoeste de Goiânia	22.015.324,00
2	Ponte de Concreto sobre o Rio Maranhão	6.045.429,00
3	BR-128, trecho Jataí-Caiapônia-Piranhas	27.148.048,00
4	Hospital Geral de Goiânia-Reforma e Adequação	2.700.000,00
5	Sistema de Abastecimento de Água de Luziânia	55.000.000,00
5	Subtotal	112.908.801,00

Maranhão

1	Terminal Petroleiro do Porto de Itaqui	20.000.000,00
2	Barragem do Pericumã	2.000.000,00
3	Duplicação da BR-135, trecho São Luís-Estiva	10.000.000,00
4	Pavimentação da BR-226, trecho Barra do Corda-Porto Fran	30.000.000,00
5	Barragem do Flores	2.270.000,00
6	Ponte da Amizade, s/ Rio ParnaíbaTeresina/PI-Timon/MA	10.000.000,00
6	Subtotal	64.270.000,00

Mato Grosso

1	Hospital Central do Estado do Mato Grosso	7.500.000,00
2	Duplicação de trecho da BR-163/364/070 (em Culabá)	6.400.000,00
3	Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto em Culat	25.000.000,00
3	Subtotal	38.900.000,00

Mato Grosso do Sul

1	Hospital Geral de Campo Grande		9.265.033,00
2	CAIC Aero Rancho		200.000,00
2		Subtotal	9.465.033,00

Minas Gerais

1	Hospital CARDIOMINAS		30.000.000,00
2	Pronto Socorro de Venda Nova		21.154.700,00
3	Ponte em Porto Alencastro sobre o rio Paranaíba, na BR-497		30.000.000,00
4	Pavimentação da BR-482, trecho Cons. Lafaete-Piranga		10.000.000,00
5	Pavimentação da BR-387, trecho Almenara - Salto da Divisa		25.000.000,00
5		Subtotal	116.154.700,00

Pará

1	Eclusas de Tucuruí, no Rio Araguaia		300.000.000,00
2	Perenização do Lago Arari		5.257.871,00
3	Hospital das Clínicas Gaspar Viana, em Belém		12.100.000,00
4	BR-230, trecho Divisa TO/PA-Marabá-Jacareacanga		290.000.000,00
4		Subtotal	607.357.871,00

Paraíba

1	Restauração e Dupl. da BR-230, tr. Cabedelo-Divisa PB/CE		4.600.000,00
2	Hospital de Emergência de João Pessoa		5.078.700,00
3	Barragem de Várzea Grande		4.400.000,00
3		Subtotal	14.078.700,00

Paraná

1	Anel Viário de Campo Mourão		2.640.000,00
2	Ponte Rodoviária s/ Rio Paraná, em Porto Camargo		68.000.000,00
3	Ponte s/ Rio Paraná, Divisa PR-MS		15.000.000,00
4	BR-487, trecho Campo Mourão-Cruzeiro D'Oeste		73.444.000,00
4		Subtotal	159.084.000,00

Pernambuco

1	BR-408, conclusão de trecho de 4 km		1.800.000,00
2	BR-101, duplicação do trecho Prazeres-Cabo		32.449.600,00
3	Adutora do Oeste - 1ª e 2ª etapas		100.000.000,00
4	Barragem do Jucazinho		25.000.000,00
5	Hospital Geral de Olinda		4.000.000,00
6	Barragem de Serrinha		3.000.000,00
6		Subtotal	166.249.600,00

Piauí

1	Hospital Universitário		15.360.400,00
2	Anel Viário de Teresina		3.400.000,00
3	Barragem Petrólio Portela		1.758.000,00
4	Ponte sobre o rio Poti		4.000.000,00
4		Subtotal	24.518.400,00

Região Nordeste

1	Ferrovia Transnordestina- Implantação de dois trechos: Salgueiro-Petrolina/PE e Salgueiro-Missão Velha/CE	267.000.000,00
2	Ferrovia Norte-Sul, trecho Imperatriz-Estrelito, com 109 km	136.000.000,00
3	BR-226, trechos Jaguaribe-Sen.Pompeu, Pedra Branca-Cruzeira e Crateús- Divisa do Piauí	30.000.000,00
3	Subtotal	433.000.000,00

Rio de Janeiro

1	BR-101, duplicação do trecho Rio Bonito-Silva Jardim	37.500.000,00
2	Hospital de Queimados	12.250.000,00
3	Hospital de Saracuruna	11.325.000,00
3	Subtotal	61.075.000,00

Rio Grande do Norte

1	Adutora do Agreste/Trairi	38.570.000,00
2	Unidade Mista de Saúde de Igapó	3.300.000,00
3	Unidade Mista de Saúde de Assu	2.800.000,00
4	BR-101, trecho Natal-Touros	24.719.685,00
5	Barragem de Santa Cruz	170.000.000,00
5	Subtotal	239.389.685,00

Rio Grande do Sul

1	Usina Term. de Candiota III	(c)
2	Usina Term. de Jacuí I	(c)
3	Ponte na BR-470, sobre o rio Uruguai	3.000.000,00
4	Hospital Regional de Caxias do Sul	2.192.873,00
4	Subtotal	5.192.873,00

Rondônia

1	Hospital Municipal de Cacoal	25.000.000,00
2	Duas Escolas com ginásios cobertos	12.503.574,00
3	Complexo Penitenciário de Seg. Máx. de Guajará Mirim	35.330.765,00
4	Casa de Detenção de Porto Velho	6.600.500,00
4	Subtotal	79.434.839,00

Roraima

1	BR-174, trecho Caracará-Divisa RR/AM	71.850.000,00
2	BR-401, trechos I e II, Boa Vista-Normandia	32.194.000,00
3	Hospital de Urgências de Boa Vista	8.386.000,00
4	Posto de Saúde de Pricumã	243.000,00
4	Subtotal	112.673.000,00

Santa Catarina

1	BR-282, trecho Lages-Campos Novos	20.000.000,00
2	Hemocentros de Chapecó, Joinville e Criciúma	1.500.000,00
3	Conclusão da UTE Jorge Lacerda IV (procedimentos legais)	(c)
4	BR-280, trecho Corupá-São Bento	2.000.000,00
5	BR-101-duplicação (em equacionamento)	(c)
6	Usina hidroelétrica de ITÁ (em equacionamento)	(c)
7	Barragens do Alto Vale do Itajaí (procedimentos legais)	(c)
7	Subtotal	23.500.000,00

São Paulo

1	Hospital de Itapeirica da Serra	6.567.310,00
2	Hospital Geral de Itaim Paulista	9.075.583,00
3	Ponte Rodoferroviária s/rio Paraná - SP/MS	282.613.582,00
4	BR-381, trecho São Paulo - Atibaia	190.000.000,00
5	BR-116, trecho São Paulo- Cajati	96.000.000,00
5	Subtotal	584.256.475,00

Sergipe

1	Ampliação do Sist. Abast. de água de Aracaju	11.785.000,00
2	Molhe de Atalaia Nova	12.466.600,00
3	Obras de proteção da Praia da Coroa do Meio	9.012.000,00
4	Projeto de Irrigação de Jacareica	22.881.329,00
4	Subtotal	56.144.929,00

Tocantins

1	Hospital Geral de Tocantins	7.410.164,00
2	Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Tocantins	1.500.000,00
3	BR-153, trecho Wanderlândia-Xambioá	16.000.000,00
4	Ponte de Concreto sobre Rio Tocantins, na rodovia TO-010	26.000.000,00
4	Subtotal	50.910.164,00

113

TOTAL GERAL

3.259.888.576,00

Observações

(a) e (b) - O Governo do Estado está revendo os projetos;

(c) - Estas obras não necessitam de recursos orçamentários para sua conclusão, mas de procedimentos legais e administrativos

SENADO FEDERAL

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS PODERES E ÓRGÃOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
QUADRO COMPARATIVO DO N° DE OBRAS INFORMADAS, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

UF	N° DE OBRAS INFORMADAS PELA UNIÃO	N° DE OBRAS INFORMADAS PELOS EST / MUN	N° DE OBRAS TOTAL	N° DE OBRAS COINCIDENTES	N° DE OBRAS NÃO COINCIDENTES
AC	4	22	26	1	25
AL	27	36	63	12	51
AM	15	8	23	2	21
AP	2	4	6	1	5
BA	125	85	210	14	196
CE	56	39	95	20	75
DF	10	4	14	2	12
ES	33	26	59	7	52
GO	57	28	85	6	79
MA	24	19	43	0	43
MG	176	108	284	28	256
MS	64	95	159	20	139
MT	40	54	94	7	87
PA	22	19	41	2	39
PB	41	35	76	5	71
PE	41	45	86	6	80
PI	30	42	72	8	64
PR	65	96	161	12	149
RJ	66	21	87	2	85
RN	27	18	45	2	43
RO	10	18	28	2	26
RR	5	8	13	2	11
RS	66	52	118	9	109
SC	40	43	83	5	78
SE	13	14	27	2	25
SP	100	89	189	7	182
TO	13	14	27	1	26
TOTAL	1172	1042	2214	185	2029

SENADO FEDERAL

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

QUADRO RESUMO DAS OBRAS INFORMADAS, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

UF	Nº TOTAL DE OBRAS	Nº DE OBRAS C/VALOR PARA CONCLUSÃO	% DE OBRAS C/VALOR PARA CONCLUSÃO	VALOR TOTAL (R\$) PARA CONCLUSÃO	% EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL
AC	22	10	45%	140.509.356,00	1,57%
AL	36	35	97%	206.103.132,00	2,30%
AM	8	8	100%	69.241.647,00	0,77%
AP	4	4	100%	33.261.724,00	0,37%
BA	85	73	86%	646.031.784,00	7,20%
CE	39	29	74%	205.045.727,00	2,29%
DF	4	4	100%	378.955.145,00	4,23%
ES	26	24	92%	58.773.192,00	0,66%
GO	28	24	86%	245.607.342,00	2,74%
MA	19	14	74%	143.469.121,00	1,60%
MG	108	94	87%	523.441.580,00	5,84%
MS	95	68	72%	364.941.529,00	4,07%
MT	54	51	94%	343.413.745,00	3,83%
PA	19	16	84%	1.078.813.448,00	12,03%
PB	35	33	94%	219.723.797,00	2,45%
PE	45	41	91%	453.153.503,00	5,05%
PI	42	32	76%	176.839.097,00	1,97%
PR	96	81	84%	307.568.113,00	3,43%
RJ	21	20	95%	76.217.562,00	0,85%
RN	18	17	94%	496.540.412,00	5,54%
RO	18	15	83%	254.029.626,00	2,83%
RR	8	8	100%	100.910.000,00	1,13%
RS	52	42	81%	688.974.858,00	7,68%
SC	43	34	79%	126.823.690,00	1,41%
SE	14	14	100%	221.100.124,00	2,47%
SP	89	84	94%	1.259.852.713,00	14,05%
TO	14	14	100%	149.398.184,00	1,67%
TOTAL	1042	889	85%	8.968.740.151,00	100,00%

SENADO FEDERAL

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS PODERES E ÓRGÃOS DA UNIÃO
QUADRO RESUMO DAS OBRAS INFORMADAS, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

UF	Nº TOTAL DE OBRAS	Nº DE OBRAS C/VALOR PARA CONCLUSÃO	% DE OBRAS C/VALOR PARA CONCLUSÃO	VALOR TOTAL (R\$) PARA CONCLUSÃO	% EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL
AC	4	2	50%	13.700.000,00	0,23%
AL	27	15	56%	82.032.983,00	1,35%
AM	15	4	27%	4.001.689,00	0,07%
AP	2	0	0%	0,00	0,00%
BA	125	31	25%	252.643.261,00	4,16%
CE	56	23	41%	292.738.458,00	4,82%
DF	10	8	80%	175.084.721,00	2,88%
ES	33	11	33%	33.114.536,00	0,55%
GO	57	19	33%	717.679.046,00	11,82%
MA	24	15	63%	668.643.135,00	11,01%
MG	176	81	46%	729.062.943,00	12,00%
MS	64	45	70%	138.173.928,00	2,27%
MT	40	11	28%	168.160.129,00	2,77%
PA	22	10	45%	34.107.905,00	0,56%
PB	41	19	46%	38.663.208,00	0,64%
PE	41	15	37%	537.173.147,00	8,84%
PI	30	15	50%	182.216.047,00	3,00%
PR	65	29	45%	234.133.198,00	3,85%
RJ	66	41	62%	569.788.195,00	9,38%
RN	27	11	41%	230.751.757,00	3,80%
RO	10	3	30%	11.961.000,00	0,20%
RR	5	2	40%	525.284,00	0,01%
RS	66	33	50%	412.160.134,00	6,79%
SC	40	16	40%	72.062.001,00	1,19%
SE	13	6	46%	38.990.000,00	0,64%
SP	100	43	43%	390.896.200,00	6,44%
TO	13	7	54%	45.431.845,00	0,75%
TOTAL	1172	515	44%	6.073.894.750,00	100,00%

SENADO FEDERAL

COMISSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRAS INACABADAS

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

QUADRO RESUMO DAS OBRAS INFORMADAS, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

UF	Nº TOTAL DE OBRAS	Nº DE OBRAS C/VALOR PARA CONCLUSÃO	% DE OBRAS C/VALOR PARA CONCLUSÃO	VALOR TOTAL (R\$) PARA CONCLUSÃO	% EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL
AC	22	10	45%	140.509.356,00	1,57%
AL	36	35	97%	206.103.132,00	2,30%
AM	8	8	100%	69.241.647,00	0,77%
AP	4	4	100%	33.261.724,00	0,37%
BA	85	73	86%	646.031.784,00	7,20%
CE	39	29	74%	205.045.727,00	2,29%
DF	4	4	100%	378.955.145,00	4,23%
ES	26	24	92%	58.773.192,00	0,66%
GO	28	24	86%	245.607.342,00	2,74%
MA	19	14	74%	143.469.121,00	1,60%
MG	108	94	87%	523.441.580,00	5,84%
MS	95	68	72%	364.941.529,00	4,07%
MT	54	51	94%	343.413.745,00	3,83%
PA	19	16	84%	1.078.813.448,00	12,03%
PB	35	33	94%	219.723.797,00	2,45%
PE	45	41	91%	453.153.503,00	5,05%
PI	42	32	76%	176.839.097,00	1,97%
PR	96	81	84%	307.568.113,00	3,43%
RJ	21	20	95%	76.217.562,00	0,85%
RN	18	17	94%	496.540.412,00	5,54%
RO	18	15	83%	254.029.626,00	2,83%
RR	8	8	100%	100.910.000,00	1,13%
RS	52	42	81%	688.974.858,00	7,68%
SC	43	34	79%	126.823.690,00	1,41%
SE	14	14	100%	221.100.124,00	2,47%
SP	89	84	94%	1.259.852.713,00	14,05%
TO	14	14	100%	149.398.184,00	1,67%
TOTAL	1042	889	85%	8.968.740.151,00	100,00%

