


Atuação TCU no Proinfância



seinfraurbana@tcu.gov.br

Brasília – abril/2019

Representação – TC 019.318/2013-8



Registro de preços para obras

Ausência de parcelamento

Projeto de referência x metodologia inovadora

Restrição à competitividade (ensaios)

Representação – TC 019.318/2013-8



Decisão – Ac. 2600/2013-TCU-Plenário

Parcialmente procedente

Determinação – plano de monitoramento (qualidade e sanções)

Auditoria – TC 001.073/2014-1



9 Estados (BA, GO, ES, MT, PB, PI, RR, SC e SP)

153 empreendimentos (creches, escolas, quadras e terrenos)

R\$ 186 milhões

	Quantidade	%
Paralisação	45	29
Atrasos	44	28

Auditoria – TC 001.073/2014-1



Acórdão 608/2015-TCU-Plenário

Plano de ação - Aprimoramento do Simec (preenchimento situação da obra, confronto automatizado, emissão de alertas e outros 8 pontos de melhoria)

Providências para assegurar: laudos de execução das obras (supervisora); identificação de atrasos e adiantamento de pagamento (supervisora);

Auditoria – TC 001.073/2014-1



Acórdão 608/2015-TCU-Plenário

Procedimentos para garantir acessibilidade, retomada de obras paralisadas;

Outras recomendações (controle social, treinamentos, cadastro restritivo)

Monitoramento – TC 029.802/2016-4



Estados do PA, MA, MG, PR e DF

50
empreendimentos
(creches e pré-
escolas)

Ano	Valores repassados
2008	R\$ 666.540.000,00
2009	R\$ 155.147.875,22
2010	R\$ 533.653.636,86
2011	R\$ 788.701.403,22
2012	R\$ 1.477.638.581,74
2013	R\$ 698.631.892,40
2014	R\$ 929.174.550,71
2015	R\$ 306.316.321,57
2016	R\$ 415.133.848,10
Total Geral	R\$ 5.970.938.109,82


Monitoramento – TC 029.802/2016-4



Situação da obra	Quantidade de obras Convencional + Metodologia Inovadora	%	Convencional	% das obras convencionais	Metodologia inovadora	%
Concluída	3443	39,02%	3374	38%	69	0,78%
Contratação	182	2,06%	175	2%	7	0,08%
Em Reformulação	474	5,37%	11	0%	463	5,25%
Em execução	1813	20,55%	1666	19%	147	1,67%
Inacabada	477	5,41%	462	5%	15	0,17%
Licitação	508	5,76%	503	6%	5	0,06%
Obra Cancelada	374	4,24%	213	2%	161	1,82%
Paralisada	409	4,64%	256	3%	153	1,73%
Planejamento pelo proponente	1144	12,96%	700	8%	444	5,03%
Total	8824	100,00%	7360	83%	1464	16,59%

Tabela 8 – Obras convencionais e Metodologia inovadora por “Situação da obra” em 1º/2/2017

Monitoramento – TC 029.802/2016-4

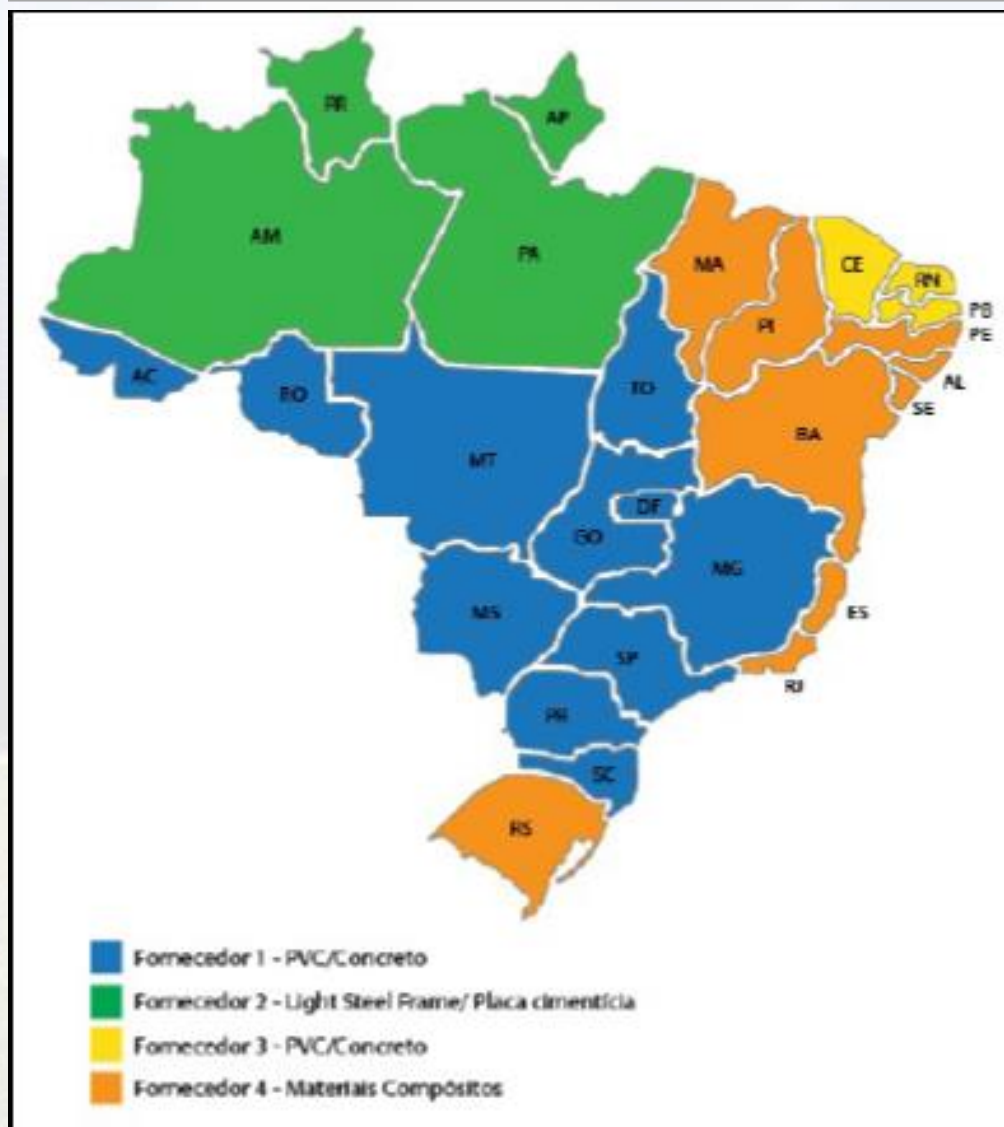

Fornecedor/nº	Metodologia	Concluídas	Total Geral	% concluído
Casa Alta Construções Ltda (1)	PVC/Concreto	25	456	5,5%
Consórcio Proinfância Brasil - PIB (2) *	Light Steel Frame - Placa cimentícia	13	248	5,2%
Consórcio Concreto PVC (3) **	PVC/Concreto	15	143	10,5%
MVC Plásticos (4)	Materiais compósitos - perfis pultrudados	16	635	2,5%
Total		69	1482	4,7%

Monitoramento – TC 029.802/2016-4



De 1.482 creches com metodologia inovadora, apenas 69 foram concluídas

1.413 creches: 290 mil (parcial) vagas

Monitoramento – TC 029.802/2016-4



Acórdão 2504/2018-TCU-Plenário


Plano de ação para retomada e conclusão de 314 obras com metodologia inovadora paralisadas

Promover o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário

Aplicar as devidas sanções às empresas

Emissão de relatórios mensais no site com a situação geral do programa


Auditoria – TC 011.196/2018-1

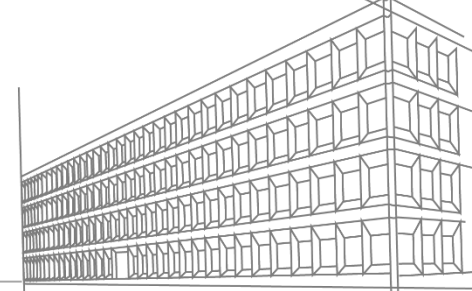

Diagnóstico sobre obras paralisadas financiadas com recursos federais e suas respectivas causas

*Ainda sem julgamento

Obrigado



seinfraurbana@tcu.gov.br
