MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GABINETE DO MINISTRO

Ofício n.156/2022/GM-MDR

Brasília, 29 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Romário
Presidente da Comissão Temporária Externa destinada a acompanhar "in loco a situação do Município de Petrópolis-RJ (CTEPETR).
Senado Federal - COCETI - Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo.
70165-900 Brasília-DF

Assunto: Requerimento de Informação n. 13/2022-CTEPETR.

Anexos: Ofício n. 023/2022 - CTEPETR (3653363); Requerimento de Informação n. 13/2022-CTEPETR (3653383); Despacho SNS, de 25 de março de 2022 (3658893); Fichas de Empreendimento SEI 3657018, 3657019 e 3657021.

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao Ofício n. 023/2022 - CTEPETR (3653363), de 21 de março de 2022, pelo qual V. Exa. enviou o Requerimento de Informação n. 13/2022-CTEPETR (3653383), aprovado na Comissão Temporária Externa destinada a acompanhar "*in loco* a situação do Município de Petrópolis-RJ (CTEPETR), no qual solicita "*informações sobre projetos de recuperação de infraestruturas de drenagem em Petrópolis/RJ".*

2. O referido Requerimento possui 3 (três) requisições:

I - informações eventualmente disponíveis no MDR sobre a recuperação e ampliação do túnel extravasor do rio Palatino, em Petrópolis/RJ;

II - informações sobre outras obras de drenagem eventualmente previstas ou em andamento no Município de Petrópolis/RJ, sob a responsabilidade ou em parceria com o MDR; e

III - a remessa dos documentos eventualmente disponíveis no MDR sobre projetos de construção, recuperação e ampliação dessas infraestruturas, inclusive com estimativas de custos e de duração das obras.

3. Tendo sido a demanda analisada pela Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) deste Ministério, encaminho a anexa documentação da SNS, **contendo os respectivos esclarecimentos/respostas**.

4. Sendo estas as informações a encaminhar, renovo meus votos de distinta consideração, colocando a equipe técnica deste Ministério à disposição para esclarecimentos que eventualmente se fizerem necessários.

Atenciosamente,

[assinado eletronicamente]

ROGÉRIO MARINHO

Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional

Documento assinado eletronicamente por **Rogério Simonetti Marinho**, **Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional**, em 29/03/2022, às 18:27, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3669220** e o código CRC **9238532A**.

Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 8º andar Brasília-DF CEP: 70067-901

(61) 2034 5814 e 2034 5815 www.mdr.gov.br

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Saneamento

DESPACHO

Processo nº 59000.004749/2022-92

À Assessoria Especial de Relações Institucionais,

1. Trata-se do Despacho GAB-Sedec (SEI 3654391), que contém solicitação de manifestação quanto ao Ofício n. 023/2022 – CTEPETR (SEI 3653363), de 21 de março de 2022, por meio do qual o Presidente da Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito, Senador Romário, com base no Requerimento n. 13/2022-CTEPETR (SEI 3653398), solicita informações sobre projetos de recuperação de infraestruturas e drenagem em Petrópolis-RJ.

2. Quanto aos projetos de Drenagem, informamos sobre a execução e andamento dos seguintes empreendimentos desta Secretaria:

- **Termo de Compromisso nº 0419.272-55/2013**

  Objeto atual: Estudo de Alternativas e Elaboração de Projeto Executivo Para Controle de Inundações no Centro Histórico de Petrópolis

  Situação da obra: Em execução

  Valor de repasse total: R$ 4.101.825,92

  Valor de repasse empenhado: R$ 4.101.825,92

  Valor pago: R$ 4.101.825,92

  Valor desbloqueado: R$ 1.182.697,88

  Observação: Este contrato de 2013 previu inicialmente a execução de obras no túnel extravasor do rio Palatinato. No entanto, não houve atendimento para retirada de cláusulas suspensivas do contrato, limitando o objeto ao Estudo de Alternativas e Elaboração de Projeto Executivo Para Controle de Inundações no Centro Histórico de Petrópolis.

- **Termo de Compromisso nº 0367.941-38/2011**

  Objeto atual: Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão

  Situação da obra: Em execução

  Valor de repasse total: R$ 75.798.510,49

  Valor de repasse empenhado: R$ 54.478.455,86

  Valor pago: R$ 53.058.957,29

  Valor desbloqueado: R$ 44.153.758,49

- **Contrato de Repasse nº 1042.279-62/2017**

Objeto atual: Drenagem e contenção na rua primeiro de maio

Situação da obra: Não iniciada

Valor de repasse total: R$ 935.939,60

Valor de repasse empenhado: R$ 987.600,00

Valor pago: -

Valor desbloqueado: -

3. Informações complementares podem ser localizadas nas Fichas SEI 3657018, 3657019 e 3657021. Comunicamos que não há, neste momento, cartas-consulta ou contratos de financiamento na Secretaria Nacional de Saneamento envolvendo a modalidade de manejo de águas pluviais que contemplem o município de Petrópolis/RJ.

4. Feitas as considerações atinentes a esta área, encaminho as informações para articular resposta ao Ofício n.º 023/2022 (3653363).

Anexos:

- Fichas SEI 3657018, 3657019 e 3657021;

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

ANDRÉ GALVÃO

Chefe de Gabinete

Secretaria Nacional de Saneamento

Documento assinado eletronicamente por **André Braga Galvão Silveira**, **Chefe de Gabinete**, em 25/03/2022, às 10:47, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3658893** e o código CRC **BCC21ED6**.

SENADO FEDERAL

Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões
Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Ofício nº 023/2022 – CTEPETR

Em 21 de março de 2022

A Sua Excelência o Senhor
Rogério Marinho
Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional

Assunto: **Solicitação de Informações – Requerimento 13/2022-CTEPETR**

Senhor Ministro,

No intuito de instruir os trabalhos da Comissão Temporária Externa criada pelo Requerimento do Senado Federal nº 90 de 2022 para "acompanhar *in loco* a situação do Município de Petrópolis/RJ em decorrência dos fortes temporais que assolaram a cidade", encaminho a Vossa Excelência o Requerimento 13/2022-CTEPETR, aprovado nesta data, solicitando informações a esse Ministério.

Solicito que a documentação seja encaminhada no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista o exíguo prazo de funcionamento desta Comissão. O encaminhamento deverá ser feito em meio magnético, para o endereço eletrônico coceti@senado.leg.br. Caso haja algum problema no envio em virtude do tamanho dos arquivos, favor contatar a Secretaria da Comissão no telefone do rodapé deste ofício.

Atenciosamente,

[assinado eletronicamente]
Senador Romário
Presidente da CTEPETR

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CB7183520043DEC6.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

SENADO FEDERAL

SF/22796.17791-69 (LexEdit)

REQUERIMENTO Nº DE - CTEPETR

Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informações sobre projetos de recuperação de infraestruturas de drenagem em Petrópolis/RJ.

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e dos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informações sobre projetos de recuperação de infraestruturas de drenagem em Petrópolis/RJ.

Nesses termos, requisita-se:

1. informações eventualmente disponíveis no MDR sobre a recuperação e ampliação do túnel extravasor do rio Palatinato, em Petrópolis/RJ;
2. informações sobre outras obras de drenagem eventualmente previstas ou em andamento no Município de Petrópolis/RJ, sob a responsabilidade ou em parceria com o MDR; e
3. a remessa dos documentos eventualmente disponíveis no MDR sobre projetos de construção, recuperação e ampliação dessas infraestruturas, inclusive com estimativas de custos e de duração das obras.

Página: 1/2 20/03/2022 10:35:05
6a3cb59ed9cd4b8aeba7221af8bd17f446d48121

JUSTIFICAÇÃO

O forte temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro de 2022, deixou 233 mortos, 4 desaparecidos, um rastro de destruição em vários pontos do município e uma comunidade traumatizada por mais essa calamidade. Para "acompanhar 'in loco' a situação do Município de Petrópolis/RJ em decorrência dos fortes temporais que assolaram a cidade", o Senado Federal criou Comissão Temporária Externa composta por nove Senadores, sendo sete titulares e dois suplentes. Em diligência àquele Município, realizada em 17 de março de 2022, a Comissão constatou que um elemento indicado como possível agravante da tragédia é o estado de conservação e a capacidade de vazão do túnel extravasor do rio Palatinato, que percorre três quilômetros e desemboca no rio Quitandinha. O túnel foi construído há cerca de cinco décadas e apresenta sinais de desgaste e falta de manutenção, com desmoronamentos parciais e buracos que possibilitam a saída da água para o solo ao redor. Especula-se, inclusive, que a infiltração de grandes quantidades de água no subsolo esteja a ameaçar a integridade das fundações e, portanto, a estabilidade das edificações próximas. Trata-se de infraestrutura de grande porte, fundamental para a segurança dos petropolitanos. Porém, ao que tudo indica, a reforma demandará a atuação articulada entre todas as esferas de governo, tendo em vista tratar-se de obra complexa e de alto custo.

Sala das Comissões, 21 de março de 2022.

Comissão Temporária Externa Destinada a Acompanhar "in Loco" a Situação do Município de Petrópolis-rj

SF/22796.17791-69 (LexEdit)
Página: 2/2 20/03/2022 10:35:05
6a3cb59ed9cd4b8aeba7221af8bd17f446d48121

BRASIL (HTTPS://GOV.BR)

Imprimir

Ministério do Desenvolvimento Regional

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Ficha do Empreendimento

Data: 22/03/2022

Nº do Contrato: 0419.272-55

Resumo

Nº do Contrato: **0419.272-55**

Monitor: **francisco.leite**

Modalidade: **Manejo de Águas Pluviais**

Empreendimento: **Recuperação do túnel do Palatinato, construção de galeria entre o canal do centro e o Rio Piabanha e implantação de parques fluviais no Rio Piabanha**

Fonte: **OGU**

Agente Finaceiro: **CAIXA**

Municipio/UF: **Petrópolis/RJ**

Proponente: **Governo do Estado do Rio de Janeiro**

Área de Intervenção: **SNSA**

Interveniente Exec: **Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro**

Cláusulas Suspensivas: **Em Situação Normal**

Objeto: **Recuperação estrutural do túnel extravasor do Palatinato e construção de galeria extravasora entre o canal do centro e o Rio Piabanha com implantação de parques fluviais ao longo do rio Piabanha**

Descrição Detalhada:
Recuperação estrutural do túnel extravasor do Palatinato e construção de galeria extravasora entre o canal do centro e o Rio Piabanha com implantação de parques fluviais ao longo do rio Piabanha

Famílias Beneficiadas: **0**

Informações sobre dados financeiros

Investimento: **R$ 5.603.225,92**

Saldo em Conta: **R$ 2.919.128,04**

Repasse: **R$ 4.101.825,92**

Repasse devolvido: **R$ 0,00 (0,00 %)**

Contrapartida: **R$ 0,00**

Portaria: **Sim**

Liberado(%): **R$ 4.101.825,92 (100,00 %)**

Data do ultimo BM: **09/11/2021**

Desbloqueado(%) : **R$ 1.182.697,88 (28,83 %)**

Desbloqueado Contrapartida (%): **R$ 157.286,74 ()**

Data do último desbloqueio: **30/12/2021**

Empenho: **R$ 22.780.309,08**

Informações sobre Andamento

Execução

Execução Física(%): **0,00 %**

Situação do contrato: **Contratado - Em situação normal**

Andamento: **Iniciada**

Situação do Objeto: **Em Execucao**

Calendário

Data seleção: **13/08/2013**

Data de vigência: **31/01/2023**

Data Assinatura: **30/09/2013**

Início Efetivo: **23/08/2021**

Prev. Término: **31/12/2022**

Término Obra Física:

Autorização da Caixa : **12/02/2021**

Autorização do Gestor: **01/04/2016**

Serviços Executados

(vazio)

Anotações/Observações Gerais

28/08/2017: Aviso nº 52/2017 encaminhado ao MPOG solicitando o remanejamento de recursos do TC nº 0419.272-55 para o TC nº 0367.940-24.
27/12/2016: Portaria nº 634/2016 - Prorroga o prazo para retirada da suspensiva parcial de 30/12/2016 para 30/06/2017.
19/12/2016: Videoconferência: 1ª Etapa – Elaboração de Projetos Executivos – Obra Túnel do Palatinato - SPA de projetos homologada pelo MCIDADES em 30/03/2016 – R$ 4.414.825,92 - INEA informa que o edital de licitação encontra-se em análise na Procuradoria do INEA e que em seguida será enviado ao Tribunal de Contas do Estado – TCE /RJ para análise. Previsão de publicação do edital de licitação: 02/04/2017.
CAIXA alerta sobre o prazo entre a conclusão do projeto, cuja licitação será publicada em abril, e o levantamento da suspensiva da 2ª Etapa, que poderá ser tornar inviável, transformando o TC apenas em projeto.
MCIDADES orienta INEA a manter apenas a 1ª Etapa e postergar as obras para uma nova sele-ção. INEA prefere que as obras caiam por suspensiva.
2ª Etapa – Recuperação do Túnel do Palatinato - Esta Etapa depende da conclusão dos projetos da 1ª Etapa
22/09/2016 - Reunião CAIXA e DIRAM/INEA:
1ª Etapa - Elaboração de Projetos - SPA homologada pelo MCIDADES - Previsão de publicação do edital - Novo prazo: 20/10/2016;
2ª Etapa - Recuperação do Túnel do Palatinato: Depende dos projetos executados na 1ª Etapa;
TTS: Pendências do Projeto de trabalho social apresentado em 09/09/2016 - CAIXA conclui análise até 30/11/2016.
14/06/2016 - GGI:
1ª Etapa - Elaboração de Projetos - SPA homologada pelo MCIDADES - Previsão de pulbicação do edital: 10/07/2016;
2ª Etapa - Recuperação do Túnel do Palatinato: Depende dos projetos executados na 1ª Etapa;
TTS: Projeto de trabalho social preliminar em análise. PRAZO análise CAIXA: 05/07/2016.
05/04/2016 - SPA homologada pelo Ministro em 31/03/2016, liberando o valor da 1ª Etapa - Projetos
13/08/2013: Portaria nº 364/2013, transferindo operação do FGTS para OGU - Melhorias do túnel do Palatinato, construção de galeria extravasora entre o canal do centro e o Rio Piabanha e implantação de parques fluviais no Rio Piabanha - R$ 150.000.000,00

Resumo Gerencial

SNS emitiu AIO em 01/02/2021 da Etapa Única (Projetos) com VR de R$ 4.101.825,92.

1ª Etapa – Elaboração de Projetos Executivos da Obra Túnel do Palatinato - SPA de projetos homologada pelo MCIDADES em 30/03/2016 no valor de R$ 4.414.825,92
2ª Etapa – Obras de Recuperação do Túnel do Palatinato - Etapa Cancelada - Suspensiva parcial venceu em 30/12/2016 e não foi prorrogada.

Pendências Caixa

#	Cód. da etapa	Previsão de solução	Solução efetiva	Tipo de pendência	Desrição	Observações	Descrição da etapa
Nenhum resultado foi encontrado.							

Etapas

Exibindo de **1** a **1** de **1** etapas

#	Número da etapa	Descrição	Previsão início	Início efetivo	Previsão de fim	Fim efetivo	% exec. etapa	Valor da etapa	% do Orçamento
1	1	elabora&#65533;??&#65533;?¿&#65533;XXXo de projeto executivo do t&#65533;??&#65533;?¿nel do Palatinato e de estudo das &#65533;XXXreas de amortecimento de cheias a montante	28/02/2022	23/08/2021	31/12/2022	-	0,00	4.466.615,40	100,00

Atualizações ==> De acordo com os últimos dados informados pelo Agente Financeiro

CAIXA

MDR

Valor Contrapartida R$

364789.48

-

Contrapartida

0.00

Data Previsao Inicio De Obra

-

Previsão início

28/02/2022

Valores Desbloqueados

Total **2** itens.

#	Data Desbloqueio	Repasse Desbloquedo	Contrapartida Desbloqueda
1	30/12/2021	R$ 1.182.697,88	R$ 0,00
2	01/12/2021	R$ 0,00	R$ 157.286,74
Total:		R$ 1.182.697,88	R$ 157.286,74

Gráfico

Execução do Contrato

Demandas Específicas

Checkbox

- [ ] **Baía de Guanabara**
- [ ] **Destaque**
- [x] **Medição Parcela**
- [ ] **Novo Chico**
- [ ] **Obra emblemática**
- [ ] **Plano de Ação TCU**

☑ **Portaria 130** ☐ **Portaria 348** ☐ **Avançar 2018**

Portaria 130

☑ **Presente Lista Risco 2012** ☑ **Publicação Risco**

Classificação de risco: **170 prioritários - não iniciados**

Publicado: **Sim**

Imprimir

BRASIL (HTTPS://GOV.BR)

Imprimir

Ministério do Desenvolvimento Regional

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental

Ficha do Empreendimento

Data: 22/03/2022

Nº do Contrato: 0367.941-38

Resumo

Nº do Contrato: **0367.941-38**

Monitor: **francisco.leite**

Modalidade: **Manejo de Águas Pluviais**

Empreendimento: **Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão**

Fonte: **OGU**

Agente Finaceiro: **CAIXA**

Municipio/UF: **Petrópolis/RJ**

Proponente: **Governo do Estado do Rio de Janeiro**

Área de Intervenção: **SNSA**

Interveniente Exec: **Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro**

Cláusulas Suspensivas: **Em Situação Normal**

Objeto: **Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão - execução de serviços de terraplenagem, obras hidráulicas para proteção de taludes, recomposição vegetal e parque fluvial.**

Descrição Detalhada:

Famílias Beneficiadas: **12443**

Informações sobre dados financeiros

Investimento: **R$ 76.557.895,58**

Saldo em Conta: **R$ 8.905.198,80**

Repasse: **R$ 75.798.510,49**

Repasse devolvido: **R$ 0,00 (0,00 %)**

Contrapartida: **R$ 0,00**

Portaria: **Sim**

Liberado(%): **R$ 53.058.957,29 (70,00 %)**

Data do ultimo BM: **28/10/2021**

Desbloqueado(%) : **R$ 44.153.758,49 (58,25 %)**

Desbloqueado Contrapartida (%): **R$ 0,00 ()**

Data do último desbloqueio: **28/12/2021**

Empenho: **R$ 53.058.957,29**

Informações sobre Andamento

Execução

Execução Física(%): **47,09 %**

Situação do contrato: **Contratado - Em situação normal**

Andamento: **Iniciada**

Situação do Objeto: **Em Execucao**

Calendário

Data seleção: **03/11/2011**

Data de vigência: **31/07/2023**

Data Assinatura: **12/12/2011**

Início Efetivo: **10/05/2013**

Prev. Término: **31/07/2023**

Término Obra Física:

Autorização da Caixa : **10/05/2013**

Autorização do Gestor: **09/04/2013**

Serviços Executados

(vazio)

Anotações/Observações Gerais

27/12/2016: Portaria nº 634/2016 - Prorroga o prazo para retirada da suspensiva parcial de 30/12/2016 para 30/06/2017.
19/12/2016: Videoconferência:
1ª Etapa – Intervenções na Calha dos Rios Santo Antônio e Cuiabá - CAIXA reitera necessidade de devolução imediata dos recursos glosados (R$ 3,21mi), uma vez que como os recursos foram pagos indevidamente não é possível postergar o prazo para devolução dos recursos. INEA solicita devolver os recursos à medida que se faça o pagamento das medições da 2ª Etapa, uma vez que não dispõe de recursos. CAIXA sugere que se faça a devolução parcelada. MCIDADES esclarece que a Consultoria Jurídica do MCIDADES não aceita parcelamento de dívida e orienta à CAIXA a efetuar a cobrança oficialmente.
2ª e 3ª Etapas – Complemento do Rio Santo Antônio, Deságue do Rio Carvão e 2 Parques Fluviais - CAIXA informa que tais etapas já possuem LAE, ou seja, as suspensivas estão solucionadas.
CAIXA informa que novas pendências da reprogramação das etapas – para ajustar a redução de metas - foram encaminhadas ao INEA. INEA informa que está revendo metas e orçamento para o TC em pauta.

14/06/2016 - GGI:
Glosas da 1ª etapa: - Análise concluída, com manutenção de glosas . - CAIXA fará verificação dos valores pagos a maior e informará ao INEA até 25/06/2016, para devolução dos recursos ao término da etapa.
TC paralisado, possível redução de metas e valores da operação. - INEA apresentará reprogramação à 1ª etapa para inserir intervenções complementares de forma a concluir o objeto com funcionalidade. - Metas a serem inseridas na 1ª etapa: Complemento do Rio Santo Antônio, Deságue do Rio Carvão e 2 Parque Fluviais.
21/03/16 - Reunião MCid: apresentado laudo técnico 001/16 sobre possíveis alterações na meta do TC.
02/02/2015: TC dividido em 06 etapas - 1ª Etapa concluída e demais aguardando nova licitação, declaração INEA TCU e aporte de R$ 38,8mi de CTPA
1ª Etapa - R$ 44mi - Calha Santo Antônio e Cuiaba - Adequação Calhas, Dessassoreamento e Contenção Margens - Obra concluída - consórcio encerrou atividades e desmobilizou canteiro de obras - não teve obras no Rio Carvaão (nova etapa a ser licitada)
2ª Etapa - R$ 41,5mi - Calha Complementar - em reprogramação
3ª Etapa - R$ 23,5mi - 11 Parques Fluviais
4ª Etapa - R$ 4,9mi - Substituição de 05 travessias
5ª Etapa - R$ 1,1mi - Revegetação de encostas - 42ha
6ª Etapa - R$ 2,2mi - Estrutura de amortecimento no Rio Cuiabá
31/08/2012: Portaria nº 442/2012 - Acréscimo de VR de R$ 45.000.000,00 alterando VR de R$ 30.798.510,49 para R$ 75.798.510,49
02/01/2012: Ajuste de valores -Alteração de CTPA de R$ 0 para R$ 12.968.522,75.
04/11/2011: Portaria de Seleção nº 515/2011 - Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão - execução de serviços de terraplenagem, obras hidráulicas para proteção de taludes, recomposição vegetal e parque fluvial. VR R$ 30.798.510,49 e CTPA de R$ 0,00.

Resumo Gerencial

Até o momento o TC possui AIO para R$ 51.464.994,94. Reprogramadas as Etapas 1, em 13/11/2020 (SEI nº 2869025), e Etapa 2, aprovada em 27/01/2021 (SEI nº 2985179).
Tomando-se como limite esse montante de repasse de R$ 51,5 milhões, a reprogramação da Etapa 2 foi aprovada no valor de R$ 20.466.590,56, conforme Nota Técnica nº 2/2021/CGSI/DRP/SNS-MDR (SEI nº 2985179). TC possui R$ 10.539.990,35 em conta. Resta agora a SNS providenciar o repasse do restante correspondente a Etapa 2, no valor limite de R$ 10 milhões, mediante o avanço das obras.

Pendências Caixa

Exibindo de **1** a **2** de **2** pendências

#	Cód. da etapa	Previsão de solução	Solução efetiva	Tipo de pendência	Desrição	Observações	Descrição da etapa
1	1a Etapa	2022-03-31 23:25:49	-	PENDENCIA OPERACIONAL	Prestação de Contas Parcial com pendências resultantes da análise	24/03/2021 - Reiterada as pendências anteriores. (Ofício nº 636/2021/GIGOV/RJ) 29/01/2021 - Reiterada as pendências anteriores. (OFÍCIO Nº 248/2021/GIGOVRJ) 07/08/2020 - Reiterada as pendências anteriores.. Aguardamos o encaminhamento de documentação de prestação de contas no valor de R$ 64.749,43 referente ao Trabalho Social. Recolhimento de valores à União, devidamente corrigidos. (OFÍCIO Nº 2271/2020/GIGOVRJ) 08/04/2020 - permanecem pendências de PCP relativas a 1 etapa 03/01/19 - of 27/2019 REITERA PEND 31/10/18 - of 3091/18 PEND PCP - SOCIAL E DEVOLUÇÃO RECURSOS 24/07/2018 - comunicada pend PCP 10/11/17- Ofício nº 2642/2017 GIGOV/RJ pend PCP 24/10/2017- INEA encaminhou docs p regularização de pendências. Em análise 18/07/17 - Reitera regularização PCP 03/04/2017- comunicadas pend PCP relacionadas a documentação apresentada 31/03/17 - permanecem pendencias a serem regularizadas e valor a ser devolvido. Pendencias comunicadas em 28/04/2016, ainda sem atendimento. Conclusão da análise é fundamental para identificar valores a devolver à operação, em virtude de glosas aplicadas sem perspectiva de revisão. Acordou-se prazo de até 10/11/2016 para INEA atender.	-

#	Cód. da etapa	Previsão de solução	Solução efetiva	Tipo de pendência	Desrição	Observações	Descrição da etapa
2	2a Etapa	2022-03-31 23:25:49	-	PENDENCIA DE ENGENHARIA	Documentação técnica com pendências resultantes da análise	24/03/2021 - Apresentar via numerada das ARTs de Fiscalização Apresentar cópia da ordem de início dos serviços. Mesmo havendo cronograma global, solicitamos apresentação do cronograma desta etapa. Para a medição de obra correspondente: Apresentação de cópia da documentação de titularidade adstrita às áreas de implantação dos parques fluviais Apresentação de cópias das Licenças de Operação referentes à jazida e bota-fora Apresentação de manifestação favorável da concessionária, quanto ao fornecimento de energia elétrica (parques) Apresentação de termo de responsabilidade para operação e manutenção da rede de iluminação pública projetada Apresentação de detalhe gráfico cotado do item ES.04.030.0140 (guarda-corpo h=1,00m). (Ofício nº 636/2021/GIGOV/RJ) 29/01/2021 - Reiterada as pendências anteriores. (OFÍCIO Nº 248/2021/GIGOVRJ) 07/08/2020 - Reiterada as pendências anteriores. (OFÍCIO Nº 2271/2020/GIGOVRJ) 06/05/2020 - Reiterada as pendências anteriores. (Ofício nº 1339/2020/GIGOVRJ) 25/03/2020 - Reiterada as pendências anteriores. (Ofício nº 889/2020/GIGOVRJ) 26/12/2019 - Etapa 2 Obras - Para Autorização de Início de Objeto (AIO): Encaminhar documentação do processo licitatório, visando emissão de verificação do resultado processo licitatório Apresentar cópia da Licença Ambiental renovada para o empreendimento em curso. Para a medição correspondente: Apresentar cópia da documentação de titularidade adstrita às áreas de implantação dos parques fluviais Apresentar cópias das Licenças de Operação referentes à jazida e bota-fora Apresentar manifestação favorável da concessionária, quanto ao fornecimento de energia elétrica (parques) Apresentar termo de responsabilidade para operação e manutenção da rede de iluminação pública projetada Apresentar detalhe gráfico cotado do item ES.04.030.0140 (guarda-corpo h=1,00m). (Ofício nº 3620/2019/GIGOVRJ) 07/05/2019 - Observamos que o BM (Boletim de Medição) apresentado (34ª medição) foi emitido em 26/01/2016 portanto depreendemos que se refere à projetos vinculados a etapa 2 do presente contrato de repasse. Consideramos, então, que este não oferece condições para ateste, pelos seguintes motivos: O proponente ainda não efetuou a reprogramação com vistas a consolidar o escopo de projetos adstrito à etapa 2 O boletim de medição apresentado contempla produtos que não guardam relação com o escopo de obra reprogramado, tais como os projetos de barreiras de contenção de sólidos e de recuperação de FMPs e APPs Deverão ser apresentadas cópias dos termos aditivos celebrados com a empresa executora, compreendendo as alterações de prazo e valor. Face ao exposto, consideramos que o proponente deverá efetuar a reprogramação do escopo de projetos associados a etapa 2, concernente aos produtos e quantidades relacionados aos trechos de recomposição da calha bem como àqueles relacionados à implantação dos parques fluviais pactuados. Considerando a manutenção do CTEF (Contrato de Execução e/ou Fornecimento) em questão, observamos que deverão ser mantidos os custos unitários e as composições orçamentárias dos produtos conforme licitados. (Ofício nº 1193/2019/GIGOV/RJ) 05/11/18 - Recebido OF INEA/DIRAM Nº 275/18 encaminhando docs técnicos em atendimento ao OF 2461/2018/GIGOV/RJ. 13/09/18 - OF 2461 encaminhando pend LAE 22/09/17- comunicada pend ao INEA (junção etapas 2 e 3) 01/09/17 - INEA apresentou esclarecimentos em relação à junção das etapas 2 e 3 a qual encontra-se em análise. 06/07/17 Informada pend para análise da junção etapas 2 e 3 Proposta para a etapa aprovada com pendências para a 1ª medição. INEA deverá apresentar QCIs revisados da 2ª e 1ª etapas (Of.3105 de 18/09)	-

Etapas

Exibindo de **1** a **2** de **2** etapas

#	Número da etapa	Descrição	Previsão início	Início efetivo	Previsão de fim	Fim efetivo	% exec. etapa	Valor da etapa	% do Orçamento
1	1	DRENAGEM PETROPOLIS - RIOS SANTO ANTONIO, CUIABÁ E CARVÃO	31/07/2013	10/05/2013	30/06/2022	-	97,90	28.253.393,99	37,27
2	2	ET02 = Conclus¿???o das clhas de prote¿??¿?§¿???o Rios Santo Ant¿??¿?´nio e Cuiab¿???, Parque fluvial e barragem	30/06/2022	-	31/07/2023	-	0,00	47.545.116,50	62,73

Atualizações ==> De acordo com os últimos dados informados pelo Agente Financeiro

Este contrato ainda não possui dados a serem atualizados.

Valores Desbloqueados

Total **13** itens.

#	Data Desbloqueio	Repasse Desbloquedo	Contrapartida Desbloqueda
1	28/12/2021	R$ 2.791.473,27	R$ 0,00
2	29/10/2021	R$ 4.826.505,94	R$ 0,00
3	24/03/2021	R$ 5.713.484,41	R$ 0,00
4	13/10/2014	R$ 8.295.829,59	R$ 0,00
5	22/07/2014	R$ 4.913.725,36	R$ 0,00
6	21/03/2014	R$ 5.393.843,99	R$ 0,00
7	24/02/2014	R$ 1.182.629,34	R$ 0,00
8	31/01/2014	R$ 2.203.887,08	R$ 0,00
9	30/12/2013	R$ 3.024.520,01	R$ 0,00
10	17/10/2013	R$ 62.332,40	R$ 0,00
11	18/09/2013	R$ 4.083.750,50	R$ 0,00
12	27/08/2013	R$ 1.128.113,54	R$ 0,00
13	26/06/2013	R$ 533.663,06	R$ 0,00
Total:		R$ 44.153.758,49	R$ 0,00

Gráfico

Execução do Contrato

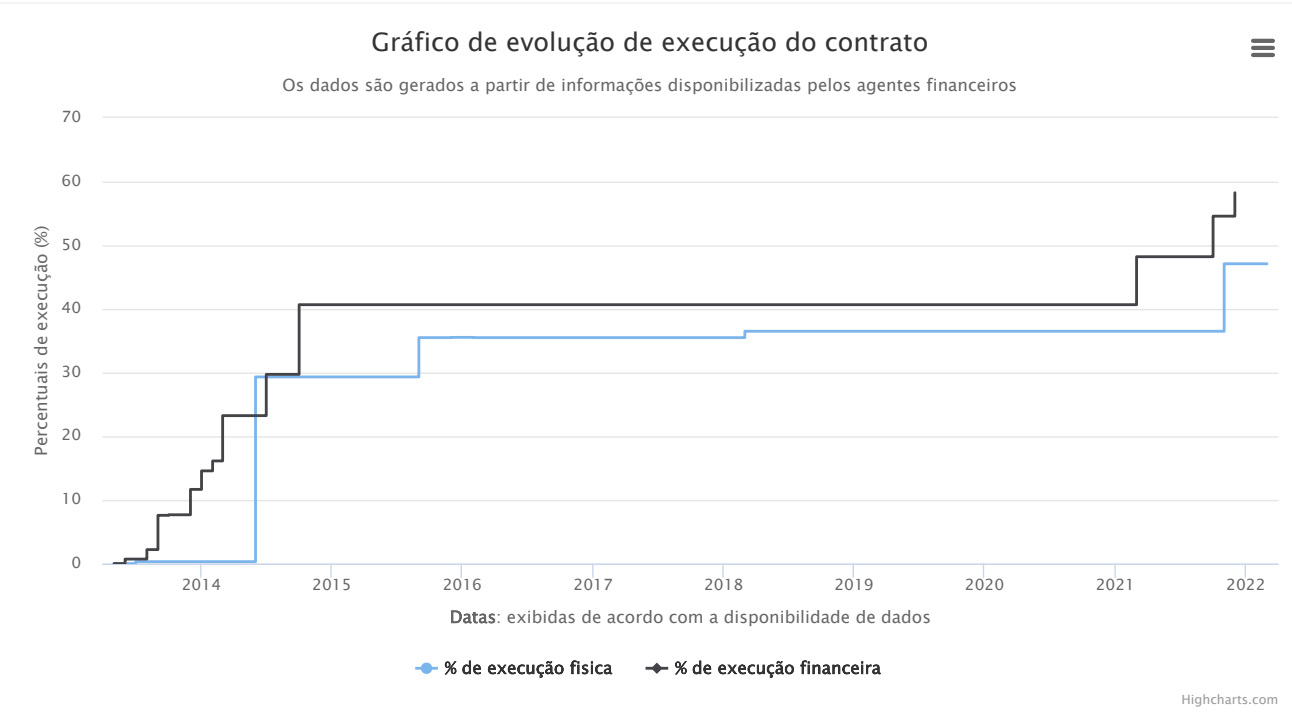

Demandas Específicas

Checkbox

- ☐ **Baía de Guanabara**
- ☐ **Destaque**
- ☑ **Medição Parcela**
- ☐ **Novo Chico**
- ☐ **Obra emblemática**
- ☐ **Plano de Ação TCU**
- ☑ **Portaria 130**
- ☐ **Portaria 348**
- ☑ **Avançar 2018**

Nível de prioridade

Nível de prioridade: **1**

Portaria 130

- ☑ **Presente Lista Risco 2012**
- ☑ **Publicação Risco**

Classificação de risco: **170 prioritários - não iniciados**

Publicado: **Sim**

Imprimir

Ficha da Operacão

Ct.nº 104227962

Drenagem e Contencao na Rua Primeiro de Maio

OGU - SNSA 0,00%

Petrópolis/RJ

Dados Gerais da Operacao | $ Execucao Fisica | Orçamentario & Financeiro | Doumentos Emitidos /Recebidos | SPA & Prestação de Contas | Contatos

Informações do Contrato

Objeto

drenagem e contenção na rua primeiro de maio

Txt Empreendimento

Drenagem e Contencao na Rua Primeiro de Maio

Ativo?

Ativo

Programa

PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo

MCID/PLANEJ URBANO - Drenagem Urbana

Modalidade

Manejo de Águas Pluviais

Submodalidade

Monitor

Localidade

Logradouro

Txt Funcional

1545120541D730033

Of Autorizacao

ID. Externo

NÃO

Justificativas

Dados da Obra

Área

SNSA

Sit Contrato

NORMAL

Exerc Orcam

2017

Ano Mes Percent

Prc Exec Num

0.00

Informações de datas

Dt Assinatura

12/09/2017

Dt Cauc

Dt Publicacao Dou

19/09/2017

Dt Vigencia

31/12/2020

Dt Aut Inicio Gestor

Dt Aut Inicio Caixa

Dt Inicio Obra

Dt Fim Obra

Valores R$

Vlr Repasse

R$ 935.939,60

Vlr Contrapartida

R$ 9.453,94

Vlr Investimento

R$ 945.393,54

Vlr Solicitado

R$ 187.187,92

Vlr Liberado

R$ 0,00

Vlr Desbloqueado

R$ 0,00

Taxa Administrativa

!!! De onde vem isso?? !!!

Informações da obra

Providencia Obra

Txt Inconsistencias

Acompanhamento

Monitoramento

Exportar

#	Descrição	Previsão de solução	Nº Etapa	Usuário	Solucionado
Nenhum Dado Cadastrado!					

Salvar | Verificar Erros

Monitoramento
