

# DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ANO LXIX - SUP. "G" AO Nº 210 TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMRO DE 2014



SECRETARIA-GERAL DA MESA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

> Relatório Final nº 10, de 2014 Da Comissão Temporária Externa

Destinada a acompanhar os Programas de Transposição e Revitalização do Rio São Francisco

**BRASÍLIA - DF** 

#### MESA DO SENADO FEDERAL \*

PRESIDENTE

Renan Calheiros - (PMDB-AL)

1° VICE-PRESIDENTE

Jorge Viana - (PT-AC)

2° VICE-PRESIDENTE

Romero Jucá - (PMDB-RR)

1° SECRETÁRIO

Flexa Ribeiro - (PSDB-PA)

2° SECRETÁRIA

Angela Portela - (PT-RR)

3º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira - (PP-PI)
4º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino - (PTB-PI)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º - Magno Malta - (PR-ES) 2º - Jayme Campos - (DEM-MT) 3º - João Durval - (PDT-BA)

4º - Casildo Maldaner - (PMDB-SC)

\* As notas referentes à Mesa do Senado Federal encontram-se publicadas na Composição do Senado Federal (Vide Sumário).

#### **LIDERANÇAS**

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV) - 26

Líder

Eunício Oliveira - PMDB (62,68)

.....

Líder do PMDB - 19

Eunício Oliveira (62,68)

Vice-Líderes do PMDB Ricardo Ferraço (104) Romero Jucá (40,105) Vital do Rêgo (107)

Líder do PP - 5

Benedito de Lira (137)

Vice-Líder do PP Ana Amélia (12,88)

Líder do PSD - 1

Sérgio Petecão (84,87)

Líder do PV - 1

Paulo Davim (75)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/SD) - 11

Líder

Gim - PTB (56,58,59)

Vice-Líder Alfredo Nascimento (41,70)

Líder do PTB - 6

**Gim** (56,58,59)

Vice-Líderes do PTB João Vicente Claudino <sup>(126)</sup> Mozarildo Cavalcanti <sup>(57,125)</sup>

Líder do PR - 3

Alfredo Nascimento (41,70)

Líder do PSC - 1

Eduardo Amorim (17,47,48,76,131)

Líder do SD - 1

Vicentinho Alves (42,54,71,111)

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PCdoB/PSOL/PRB) - 23

Líder

Humberto Costa - PT (115,121)

Vice-Líderes

Acir Gurgacz (49,55,69,100) Inácio Arruda (90,94,117,128) Marcelo Crivella (36,120,127)

.....

Líder do PT - 14 Humberto Costa (115,121)

Vice-Líderes do PT Walter Pinheiro (22,28,93) Anibal Diniz (27,103) Paulo Paim (102)

Eduardo Suplicy (101)

Líder do PDT - 5

Acir Gurgacz (49,55,69,100)

Vice-Líder do PDT Zeze Perrella (86)

Líder do PCdoB - 2

Vanessa Grazziotin (1,89,116)

Vice-Líder do PCdoB Inácio Arruda <sup>(90,94,117,128)</sup>

Líder do PSOL - 1

Randolfe Rodrigues (18,77)

Líder do PRB - 1

Marcelo Crivella (36,120,127)

Governo

Líder

Eduardo Braga - PMDB (39)

Vice-Líderes Gim (56,58,59) Benedito de Lira <sup>(137)</sup> Jorge Viana

Vital do Rêgo (107)

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) - 17

Líder

Wilder Morais - DEM (97,112,118,130)

Vice-Líderes Mário Couto (32,61,122) Jayme Campos (26,106,110,124)

> ..... Líder do PSDB - 13

Aloysio Nunes Ferreira (6,64,113)

Vice-Líderes do PSDB Cássio Cunha Lima (72) Paulo Bauer (7,31,74,80) Ruben Figueiró (133)

Líder do DEM - 4

José Agripino (2,10,14,44,46,78)

PSB - 4

Líder

Lídice da Mata - PSB (29,38,82,129,134)

Vice-Líder João Capiberibe (135)

EXPEDIENTE

Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho

Diretor-Geral do Senado Federal Florian Augusto Coutinho Madruga Diretor da Secretaria de Editoração e Publicações José Farias Maranhão

Coordenador Industrial

Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal Rogério de Castro Pastori

Diretor da Secretaria de Atas e Diários

Quésia de Farias Cunha

Diretora da Secretaria de Registro e Redação Parlamentar RELATÓRIO FINAL Nº 40, DE 2014,

DA COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

# **SUMÁRIO**

- Memorando nº 2, de 2014, do Presidente da Comiss	ão Externa
para Acompanhar os Programas de Transposição e Re	vitalização
do Rio São Francisco	i
- Requerimento nº 514, de 2011, que cria a	Comissão
Temporária Externa	ii
- Sinopse da tramitação	iii
- Relatório Final	iv

Memorando nº 2/2014 - CTERIOSFR

Brasilia, 17 de dezembro de 2014

A Sua Excelência o Senhor Senador Renan Calheiros

Presidente do Senado Federal

Assunto: Encerramento dos Trabalhos de Comissão Temporária

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que a Comissão Temporária Externa do Senado Federal destinada a acompanhar as obras do Projeto de Transposição do Rio São Francisco - CTERIOSFR, criada pelo RQS nº 514, de 2011, encerrou seus trabalhos na presente data, oportunidade na qual ocorreu a sua 10ª Reunião Ordinária e foi aprovado o relatório final de autoria do Senador Humberto Costa, relator.

Encaminho, em anexo, a lista de presença da referida reunião e os autos dos trabalhos da Comissão.

Atenciosamente,

Senador Cicero Lucena
Presidente Eventual de CTEDIOSED

Senado Federal
Protocolo Legislativo
(LS nº S (4 | 20 //
Elst. 11.05.20 //
S 3 GEOLISMO

REQUERIMENTO Nº 544, DE 2011 Sur. Ciura I muna

INCLUA-SE ORDEM DO OPORTUNAMENTE.

EM DIA

Senhor Presidente,

Em \$1.05 1.11

Requeiro, nos termos do disposto nos Arts. 74 e 75 do Regimento Interno do Senado Federal, seja criada Comissão Temporária Externa, composta de 05 (cinco) membros Titulares e igual número de Suplentes, com prazo de funcionamento de 12 (doze) meses, destinada a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como "Transposição do Rio São Francisco", bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, podendo para tanto realizar audiências públicas e diligências externas, requerer informações, bem como outros atos que julgue necessários para a consecução dos objetivos da Comissão".

# JUSTIFICAÇÃO

A obra de Transposição do Rio São Francisco se refere ao polêmico e antigo projeto de transposição de parte das águas do rio São Francisco, no Brasil, nomeado pelo governo brasileiro como "Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional". O projeto é um empreendimento do Governo Federal, sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional – MI. Tal projeto, teoricamente, irrigará a região nordeste e semi-árida do Brasil.

Esta obra vem se constituindo em um dos temas mais polêmicos dos últimos anos em nosso País, gerando acalorados debates em todas as esferas da nossa sociedade. A polêmica criada por esse projeto tem como base o fato de ser uma obra cara e que abrange somente 5% do território e 0,3% da população do semi-árido brasileiro e também que se a transposição for concretizada afetará intensamente o ecossistema ao redor de todo o rio

Name legron! Audito
Rubrica: Auditatio
Matricula: 2005
Date: 11 / 1001
Hore: (Chiul





São Francisco. Há também o argumento de que essa transposição só vai ajudar os grandes latifundiários nordestinos pois grande parte do projeto passa por grandes fazendas e os problemas nordestinos não serão solucionados. O principal argumento da polêmica dá-se sobretudo pela destinação do uso da água: os críticos do projeto alegam que a água será retirada de regiões onde a demanda por água para uso humano e dessedentação animal é maior que a demanda na região de destino e que a finalidade última da transposição é disponibilizar água para a agroindústria e a carcinicultura.

Não existe consenso sobre o tema e todos parecem ter uma opinião sobre a questão.

A questão envolve o interesse de vários Estados da Federação, remetendo às atribuições Constitucionais desta Casa, e ainda, pelo volume de recursos que serão investidos nas obras, tem despertado o interesse de toda a sociedade e da imprensa.

Diante destes fatos, é conveniente que o Senado Federal acompanhe de perto a questão, resguardando os interesses dos Estados e da sociedade brasileira.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2011.

LICERO LUCI

Senador PSDB/PB

Senado Federal Protocolo Legislativo

RQS n



Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

#### Identificação da Matéria

# REQUERIMENTO N° 514, DE 2011

Autor: SENADOR - Cícero Lucena

Ementa: Requer, nos termos dos arts. 74 e 75 do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de comissão temporária externa, composta de 5 (cinco) membros titulares e igual número de suplentes, com prazo de funcionamento de 12 (doze) meses, destinada a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como "Transposição do Rio São Francisco", bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, podendo para tanto realizar audiências públicas e diligências externas, requerer informações, e outros atos que julgue necessários para a consecução dos

objetivos da comissão.

Natureza: Criação ou alteração de comissão temporária

Data de apresentação: 11/05/2011

Situação atual: Local: 18/12/2014 - SERVIÇO APOIO COM, ESP. PARL, DE INQUERITO

Situação: 18/12/2014 - COMISSÃO CONCLUIDA

Matérias relacionadas: RQS - REQUERIMENTO 961 de 2012 (Senador Vital do Rêgo e outros)

RQS - REQUERIMENTO 1456 de 2013 (Comissão Externa para acompanhar os Programas de

Transposição e Revitalização do Rio São Francisco (SF))

Indexação da matéria: Indexação: REQUERIMENTO, SENADO, REGIMENTO INTERNO, CRIAÇÃO,

COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA, COMPOSIÇÃO, MEMBROS, TITULAR, SUPLENTE, PRAZO DETERMINADO, OBJETIVO, ACOMPANHAMENTO, OBRA PÚBLICA, PROJETO DE INTEGRAÇÃO, RIO SÃO FRANCISCO, BACIA

HIDROGRÁFICA, NORDESTE SETENTRIONAL, BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO

FRANCISCO.

#### Sumário da Tramitação

#### Tramitação encerrada

# TRAMITAÇÕES (ordem ascendente)

11/05/2011 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO

Ação: Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e rubricadas. Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

11/05/2011 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA

Ação: Leitura.

O requerimento será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Publicação em 12/05/2011 no DSF Página(s): 15137 ( Ver Diário )

Encaminhado para: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

12/05/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

28/02/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: AGENDADA PARA ORDEM DO DIA

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 15/03/2012.

14/03/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Situação: INCLUÍDA EM ORDEM DO DIA

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 15/03/2012.

Votação, em turno único.



# Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

Matéria não apreciada na sessão do dia 15/03/2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 20/03/2012.

Matéria não apreciada na sessão do dia 20/03/2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 21/03/2012. Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

21/03/2012 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Situação: APROVADA Ação: Aprovado.

Será cumprida a deliberação do Plenário.

Publicação em 22/03/2012 no DSF Página(s): 7795 ( Ver Diário )

Encaminhado para: SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

21/03/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data, às 19h32.

28/03/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Enviado à SSCLSF a pedido.

Encaminhado para: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

28/03/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, às 20h.

Juntada às fls.4/6, cópias dos Ofícios nºs 427 a 429, de 2012, do Presidente Sarney, solicitando das Lideranças Partidárias a indicação de membros da Comissão Temporária Externa, referente à Transposição do Rio São Francisco.

04/04/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

#### 04/04/2012 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 30/2012, da Liderança do PSDB, o Senador Cícero Lucena para integrar, como titular, a Comissão criada pelo presente requerimento.

À publicação.

Publicação em 05/04/2012 no DSF Página(s): 11241 ( Ver Diário )

Encaminhado para: SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

04/04/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Recebido neste órgão em 04/04/2012 às 19h40.

11/04/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Encaminhado à SSCLSF a pedido.

Encaminhado para: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

11/04/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, às 11:10h.

11/04/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

# 11/04/2012 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 48, de 2012, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, o Senador Humberto Costa e a Senadora Lídice da Mata, como titulares, e os Senadores Inácio Arruda e Antonio Carlos Valadares, como suplentes, para integrarem a Comissão Temporária Externa destina a acompanhar os programas de transposição e revitalização do rio São Francisco.

Publicação em 12/04/2012 no DSF Página(s): 12135 ( Ver Diário )

Encaminhado para: SACEI - SERVIÇO APOIO COM, ESP. PARL. DE INQUERITO



Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

12/04/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Recebido neste Órgão em 12/04/2012 às 11h35.

26/04/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Encaminhado à SSCLSF a pedido.

Encaminhado para: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

26/04/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Recebido neste Órgão, às 17h00.

26/04/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

#### 26/04/2012 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: A Presidência designa, nos termos do Ofício nº 93, de 2012, da Liderança do Bloco da Maioria, para integrarem, como titulares os Senadores Vital do Rêgo e Paulo Paim e como suplentes os Senadores Benedito de Lira e Ciro Nogueira, a Comissão Temporária Externa, nos termos do presente Requerimento.

\*\*\*\*\*\*\* Retificado em 26/04/2012\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Onde se lê: ...Paulo Paim... Leia-se: ...Paulo Davim...

Publicação em 27/04/2012 no DSF Página(s): 14689 ( Ver Diário )

Encaminhado para: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

02/05/2012 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado à SACEI.

Encaminhado para: SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

02/05/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Recebido, neste Órgão, nesta data, às 09h53min.

28/06/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL, DE INQUERITO

Ação: Juntado Aviso nº 668-Seses-TCU-Plenário que encaminha cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 026.570-/2011-4, pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 13 de junho de 2012, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam. (Fls. 14 a 59)

12/11/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Encaminhado à SGM a pedido.

Encaminhado para: SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA

12/11/2012 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA

Ação: Recebido neste Órgão, às 15:33.

Encaminhado ao Plenário.

Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

12/11/2012 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: A Presidência designa o Senador Cássio Cunha Lima para integrar, como suplente, a Comissão Temporária externa para acompanhar os programas de transposição do Rio São Francisco, nos termos do Oficio nº 234, da Liderança do PSDB, no Senado federal.

Publicação em 13/11/2012 no DSF Página(s): 60500 ( Ver Diário )

Encaminhado para: SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

13/11/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: À SGM a pedido.

Encaminhado para: SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA



# Senado Federal Secretaria-Geral da Mesa Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

#### 13/11/2012 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA

Ação: Encaminhado ao Plenário.

Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

#### 13/11/2012 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Lido e aprovado o Requerimento nº 961, de 2012, de autoria do Senador Vital do Rego e outros Senadores, que solicita prorrogação do prazo da Comissão até 22 de dezembro de 2013.

Publicação em 14/11/2012 no DSF Página(s): 60802 ( Ver Diário )

Publicação em 14/11/2012 no DSF Página(s): 60732 - 60733 ( Ver Diário )

Encaminhado para: SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

#### 14/11/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Recebido neste Órgão, às 9:00.

# 14/11/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA

Ação: Em 13.11.2012 foi realizada a 1ª Reunião da Comissão, oportunidade em que ocorreu sua instalação, foram eleitos os Senadores Vital do Rêgo e Cícero Lucena, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, além de ter sido designado relator o Senador Humberto Costa.

#### Foram juntados os seguintes documentos:

Lista de Presença da 1ª Reunião e Ofício nº 001/2012-CEE -São Francisco, comunicando ao Presidente do Senado Federal a instalação da Comissão, a eleição de seu Presidente e Vice, bem como a designação de seu Relator (fls. 63 e 640.

# 

Onde se lê; (fls. 63 e 640.;

Leia-se:(fls. 63 e 64).

Publicação em 04/12/2012 no DSF Página(s): 139 - 141 PUB ATA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO Suplemento (Suplemento nº C) (Ver Diário)

# 21/11/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Na presente data foi realizada a 2ª Reunião da Comissão, oportunidade em que foi dada a palavra ao Deputado Estadual da Paraíba, Francisco de Assis Quintans.

# Juntada a Lista de Presença da 2ª Reunião e Ata da 1ª Reunião. (Fis. 65 a 70)

Publicação em 04/12/2012 no DSF Página(s): 141 - 145 PUB ATA DA 2ª REUNIÃO Suplemento ( Suplemento nº C) ( **Ver Diário** )

# 28/11/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação. Na presente data foi realizada a 3ª Reunião da Comissão, oportunidade em que foram aprovados o Plano de Trabalho da Comissão e os seguintes requerimentos:

001/12 - Requer a realização de audiência pública para debater este tema com representantes do Tribunal de Contas da União – TCU e da Controladoria Geral da União – CGU. Autoria: Senador Humberto Costa;

002/12 - Requer a realização de audiência pública para debater este tema com representantes do Ministério da Defesa (Comando do Exército). Autoria: Senador Humberto Costa;

003/12 - Requer a realização de audiência pública para debater este tema com representantes do Ministério do Planejamento. Autoria: Senador Humberto Costa;

004/12 - Requer a realização de audiência pública para debater este tema com representantes do Ministério da Integração. Autoria: Senador Humberto Costa.

Juntados os requerimentos aprovados (Fls. 71 a 74), Plano de Trabalho aprovado (Fls. 75 a 87), Ata da 2ª Reunião (Fls. 88 a 97) e Lista de Presença da 3ª Reunião (Fls. 97)

Publicação em 18/12/2012 no DSF Página(s): 63 - 69 PUB ATA 3ª REUNIÃO Suplemento ( Suplemento nº B) ( Ver Diário )



#### Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

#### 10/12/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: As Atas da 1ª e 2ª Reuniões da Comissão foram publicadas nas páginas 139 e 141, respectivamente, do Suplemento "C" ao Diário do Senado Federal nº 197, de 04 de dezembro de 2012.

#### 11/12/2012 SACEI - SERVICO APOIO COM, ESP, PARL, DE INQUERITO

Ação: Na presente data ocorreu a 4ª Reunião da Comissão, oportunidade em que foi realizada audiência pública com a presença dos seguinte convidados: Ministro Fernando Bezerra Coelho, Ministério da Integração Nacional; General de Exército Joaquim Maia Brandão Júnior, Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, Representando o Ministério da Defesa e Roberto Nami Garibe Filho, Secretário do Programa de Aceleração do Crescimento — Substituto, Representando o Ministério do Planejamento.

#### Juntadas Ata da 3ª Reunião e Lista de Presença da 4ª Reunião (Fls. 99 a 116)

Publicação em 18/06/2013 no DSF Página(s): 50 - 79 PUB ATA 4ª REUNIÃO Suplemento ( Suplemento nº B) ( Ver Diário )

#### 12/12/2012 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Na presente data ocorreu a 5ª Reunião da Comissão, oportunidade em que foi realizada audiência pública com a presença dos seguinte convidados: Luis Claudio de Freitas, Diretor de Auditoria de Programas da Área de Infraestrutura, representando a Controladoria Geral da União; e Juliana Pontes Monteiro de Carvalho, Titular da Secretaria de Fiscalização de Obras 4 (Secob-4), representando o Tribunal de Contas da União.

#### Juntada a Lista de Presença da 5ª Reunião (Fl. 117).

Publicação em 02/03/2013 no DSF Página(s): 4 - 20 PUB ATA 5ª REUNIÃO Suplemento ( Suplemento nº B) ( <u>Ver Diário</u> )

## 06/02/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado Ofício nº 50/MI, do Ministério da Integração, que encaminha a relação das empresas contratadas para as obras referentes à Transposição do Rio São Francisco, em resposta ao Ofício nº 009/2012-CTERIOSF. (Fls. 119 e 120)

#### 19/02/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Na presente data ocorreu a 6.ª Reunião da Comissão, oportunidade em que foi realizada audiência pública com a presença dos seguinte convidados: Adriano Fernandez (representante da Carioca Engenharia), Willian Tannus (representante do GRUPO SERVENG), Cassio Vitorri (representante da S/A Paulista Construções e Comércio) e Elmar Varjão (representante da Construtora OAS, Coesa e Barbosa Mello).

Foi aprovado o requerimento n. 005/2013, de autoria do Senador Cássio Cunha Lima.

Juntada a seguinte documentação:

- 1) Lista de Presença da 6ª Reunião (fls. 121/122);
- 2) Requerimento do Senador Cássio Cunha Lima (fl. 123); e
- 3) Ata da 5.ª Reunião (fls. 124/153).

Publicação em 18/06/2013 no DSF Página(s): 80 - 91 PUB ATA 6ª REUNIÃO Suplemento ( Suplemento nº B) ( Ver Diário )

#### 08/03/2013 SACEI - SERVICO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: A ata da 6ª reunião da comissão está publicada na página 48 do Suplemento "B" ao Diário do Senado Federal nº 20, de 02 de março de 2013.

#### 11/03/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado ofício nº 27-SIH/MI da Secretaria de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, que encaminha lista com os nomes das empresas contratadas, bem como a situação de cada, sendo contratos com



Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

escopo reduzido ou rescindido com o Ministério da Integração Nacional para execução das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF).

(Fls. 154 a 160)

# 21/03/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Nos dias 07e 08 de março de 2013 a Comissão visitou o eixo norte da obra de transposição do Rio São Francisco, nos Estados de Pernambuco e Ceará, com a presença dos senhores senadores: Vital do Rêgo, Cícero Lucena, Inácio Arruda e o Ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra, de acordo com o plano de trabalho aprovado pela Comissão.

# 21/03/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado ofício OF/CONLEG-GB/SF Nº 00054/2013, da Consultoria Legislativa, que indica os Consultores Legislativos RICARDO NUNES MIRANDA, mat. 56082; MÁRCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, mat. 56264; e LUCIANO MRTINS COSTA PÓVOA, mat. 257853, para assessorarem os trabalhos da Comissão.

(Fl. 161)

## 23/04/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Conforme o Plano de Trabalho aprovado, a Comissão, no dia 19.04.2013, visitou as obra de Transposição do Trecho Leste, nos municípios de Floresta, Sertânea, Monteiro e Campina Grande, nos Estados da Paraíba e Pernambuco. Participaram da visita as seguintes autoridades: os Senadores Vital do Rêgo, Humberto Costa, Cícero Lucena e Cássio Cunha Lima; os Deputados Federais Hugo Motta e Carlos Brandão; o Ministro de Estado da Integração Nacional, Fernando Bezerra; o Diretor de Recursos Hídricos do Ministério da Integração, Robson Botelho; e o representante da CGU, Luiz Cláudio de Freitas.

#### Juntada a seguinte documentação:

- 1) Texto da Assessoria de Comunicação do Ministério da Integração Nacional denominado de Projeto de Integração do Rio São Francisco (fls. 162/164);
- 2) Texto da Assessoria de Comunicação do Ministério da Integração Nacional com o título "Integração Nacional reforça investimentos em infraestrutura hídrica no semiárido" (fls. 165/166);
- 3) Texto do Ministério da Integração Nacional com o título "Transposição Pelo Mundo" (fls. 167/168); e
- 4) Mapa do Projeto de Integração do Rio São Francisco METAS (fl. 169).

# 02/05/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado Ofício 5/2013 - GAB-RC/TCU, de 26/04/2013, que encaminha em meio digital doze Relatórios, Votos e Acórdãos proferidos sob a relatoria do Ministro Raimundo Carreiro em 10 processos relativos às obras de transposição do Rio São Francisco (fl. 170). Juntado, também, envelope contendo CD enviado junto com o ofício (fl. 171).

# 07/06/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado Ofício 17.037/2013/GM/CGU-PR, de 06/06/2013, que encaminha em meio digital relatórios da Controladoria-Geral da União referentes à obra de Transposição do Rio São Francisco (fls. 172 e 173). Juntado, também, envelope contendo CD enviado junto com o ofício (fls. 174).

# 12/06/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Na presente data ocorreu a 7ª Reunião da Comissão, oportunidade em que foi aprovado o Requerimento N ° 006/13, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando a realização de audiência pública na cidade de Serra Talhada/PE, com a finalidade de discutir o andamento da obra da transposição do Rio São Francisco, bem como as obras de segurança hídrica, tal como da Adutora do Agreste.

Foi juntada a seguinte documentação:

- 1) Lista de presença da 7ª Reunião (fl. 175).
- 2) Requerimento do Senador Humberto Costa (fl. 176-179).
- 3) Atas da 4ª e 6ª Reunião (fl. 180-257).

Publicação em 19/12/2013 no DSF Página(s): 58 - 60 PUB ATA 7ª REUNIÃO Suplemento ( Suplemento nº C) ( Ver Diário )

# 12/06/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntados:



# Senado Federal Secretaria-Geral da Mesa Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

- 01 Termo de Encerramento do Voulme I (fl. 258);
- 02 Termo de Abertura do Volume II (fl.259).

#### 13/06/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado Oficio nº 2571/2013 - DCO, da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, que informa a aprovação do Requerimento nº 4732/2013, de autoria do Deputado Francisco de Assis Quintans, propondo que seja consignado na Ata dos trabalhos, Voto de Aplauso pela iniciativa de terem convocado o Ministro da Integração Nacional e Órgãos Fiscalizadores (CGU/TCU), para participarem de uma Audiência Pública no Município de Monteiro/ PB, para discutirem e fazerem uma avaliação do andamento das obras do eixo leste do PISF e externarem a previsão para a sua conclusão em 2015. (FIs.259 a 264)

Onde se lê: "(Fls.259 a 264)"; leia-se: "(Fls.260 a 265)".

#### 20/06/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM, ESP. PARL, DE INQUERITO

Ação: As Atas da 4ª e 6ª Reuniões da Comissão foram publicadas nas páginas 50 e 80, respectivamente, do Suplemento "B" ao Diário do Senado Federal nº 92, de 18 de junho de 2013.

# 02/07/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado Ofício 244/MI, de 02/07/2013 (fls. 266), que encaminha Nota Técnica 01/2013/DPE/SIH/MI (fls. 267 a 272), de 28/06/2013, e CD (fls. 273) contendo Relatório Executivo e Relatório de Progresso, em resposta a solicitação de informações desta comissão sobre a remodelagem do projeto na execução da obra de Transposição do Rio São Francisco e de relatório sobre a reconfiguração das frentes de trabalho.

#### 15/08/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntados os seguintes documentos:

- i) Aviso nº 987-Seses-TCU-Plenário, de 07 de agosto de 2013, que encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo plenário do TCU nos autos do processo nº TC 009.861/2013-0, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam (fls. 274 a 288);
- ii) Aviso nº 988-Seses-TCU-Plenário, de 07 de agosto de 2013, que encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo plenário do TCU nos autos do processo nº TC 013.069/2013-6, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam (fls. 289 a 303);
- iii) Aviso nº 991-Seses-TCU-Plenário, de 07 de agosto de 2013, que encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo plenário do TCU nos autos do processo nº TC 013.071/2013-0, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam (fls 304 a 310);
- iv) Aviso nº 993-Seses-TCU-Plenário, de 07 de agosto de 2013, que encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo plenário do TCU nos autos do processo nº TC 008.894/2013-2, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam (fls. 311 a 328).

#### 20/08/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL, DE INQUERITO

Ação: Juntado Aviso nº 996-Seses-TCU-Plenário, de 12 de agosto de 2013, que encaminha, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo plenário do TCU nos autos do processo nº TC 013.070/2013-4, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam (fls. 329 a 342);

#### 26/08/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Em 26 de agosto de 2013, a Comissão realizou diligência à cidade de Monteiro/PB com a presença dos Senadores Vital do Rêgo, Cícero Lucena e Cássio Cunha Lima a fim de, junto com o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, participar da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço no montante de R\$ 700 milhões de reais para início da Meta 3 do eixo leste da Transposição do Rio São Francisco.



Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

#### 30/08/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Em 30 de agosto de 2013, foi realizada diligência na cidade de Serra Talhada/PE, com a presença dos Senadores Vital do Rêgo e Humberto Costa. No período da manhã foi realizada visita à adutora do agreste e ao canal de transposição. No período da tarde foram realizadas oitivas no Plenário da Câmara de Vereadores, com a participação das seguintes autoridades: Robson Botelho, Diretor de Projetos do Ministério da Integração Nacional; Stênio Albuquerque, do Ministério da Integração; Deputado Federal Gonzaga Patriota; Luciano Duque, Prefeito de Serra Talhada; Manoel Santos, Deputado Estadual de Pernambuco; Vereador José Raimundo, Presidente da Câmara de Vereadores de Serra Talhada; Luís Antônio Amorim, Procurador da República; Genival Delgado, Prefeito de Águas Belas; Adeilson Lustosa, Prefeito de Santa Terezinha; Erivaldo José da Silva, Prefeito de Calumbi; Antônio César Araújo, Prefeito de Ouricuri; Jóse Pereira Nunes, Prefeito de Quixadá; Francisco Pereira, Vice-Prefeito de Flores; Edivaldo Pereira de Souza, Prefeito de Parnamirim; Murilo Novaes, Vereador de Floresta.

#### 14/10/2013 SACEI - SERVICO APOIO COM, ESP. PARL, DE INQUERITO

Ação: Juntado o Aviso nº 1630-GP/TCU que encaminha à Comissão, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 2681/2013, proferido pelo Plenário do TCU na Sessão de 02/10/2013, nos autos do processo nº TC-009.861/2013-0 (fils. 343 a 348).

#### 10/12/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Na presente data foi realizada a 8ª Reunião da Comissão, oportunidade na qual foi apresentado o Balanço das Obras de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco pelo Ministro Francisco José Coelho Teixeira, do Ministério da Integração Nacional, e foi aprovada a Ata da 7ª Reunião.

Foram juntados os seguintes documentos:

1. Lista de Presença da 8ª Reunião (fl. 349); e

2. Ata da 7ª Reunião (fls. 350 a 354).

10/12/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Enviado à SSCLSF a pedido.

Encaminhado para: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

11/12/2013 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

# 11/12/2013 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Leitura do Requerimento nº 1456, de 2013, de autoria do Senador Vital do Rego e outros Senadores, que requer, nos termos do art. 76, § 1º do Regimento Interno do Senado Federal, a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão objeto do presente requerimento.

À SGCLSF.

Publicação em 12/12/2013 no DSF Página(s): 93353 ( Ver Diário )

Encaminhado para: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

12/12/2013 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Ação: Encaminhado ao Plenário.

Encaminhado para: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

12/12/2013 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

Ação: Aprovado o Requerimento nº 1456, de 2013.

Será cumprida a deliberação do Plenário.

À SACEI.

Publicação em 13/12/2013 no DSF Página(s): 94051 (Ver Diário)

Encaminhado para: SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

12/12/2013 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Recebido neste Órgão na presente data, às 19h15.

#### 13/02/2014 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado Ofício nº 01/2014 que solicita ao Ministério da Integração Nacional relatório sobre a situação atual de todas a obras relativas à Transposição do Rio São Francisco. (fl. 356)



## Atividade Legislativa - Tramitação de Matérias

#### 10/03/2014 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: A ata da 7ª reunião foi publicada no Suplemento C ao Diário do Senado Federal nº 212, de 19 de dezembro de 2013, página 058.

#### 29/04/2014 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Juntado o Oficio nº 193/MI, pelo qual o Ministro da Integração Nacional indica representante para participar de audiência pública da Comissão (fl. 357).

#### 06/05/2014 SACEI - SERVICO APOIO COM, ESP. PARL, DE INQUERITO

Ação: Na presente data, foi realizada a 9ª Reunião da Comissão, oportunidade na qual foi realizada Audiência Pública com os seguintes convidados: Ministro Francisco José Coelho Teixeira, do Ministério da Integração Nacional; Juliana Pontes Monteiro de Carvalho, Secretária de Fiscalização de Obras do Tribunal de Contas da União - TCU; e Wagner Rosa da Silva, Diretor de Auditoria - Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União - CGU. Foi aprovado Requerimento nº 07/2014 que convida o presidente da CODEVASF- Ministério da Integração; o representante do Ministério das Cidades; o presidente do Departamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS -, e o presidente da FUNASA - Ministério da Saúde, para prestarem esclarecimentos sobre o objeto desta Comissão

#### Foram juntados os seguintes documentos:

- 1. Lista de Presença da 9ª Reunião (fls. 358 e 359).
- 2. Requerimento nº 7/2014 aprovado (fl. 360).

#### 01/08/2014 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: A partir de 1º de agosto de 2014 os boletins de ação legislativa não mais serão impressos, nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 2014, do Secretário-Geral da Mesa. As consultas sobre a tramitação da matéria devem ser realizadas diretamente no sistema eletrônico próprio.

#### 12/11/2014 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Na presente data, foi juntado à fl. 361o Ofício 474/2014 - GSHCST, do Senador Humberto Costa, que solicita ao Presidente da Comissão o agendamento de visita às obras do eixo leste e norte da transposição do Rio São Francisco.

## 09/12/2014 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Conforme o Plano de Trabalho aprovado, a Comissão, no dia 08.12.2014, visitou as obras de Transposição do Rio São Fracisco, nos municípios de Campina Grande, Monteiro, Juazeiro do Norte e São José de Piranhas nos Estados da Paraíba e do Ceará. Participaram da visita as seguintes autoridades: os Senadores Vital do Rêgo, Humberto Costa e Cícero Lucena, e o Ministro da Integração Nacional, Senhor Francisco José Teixeira. Juntada a Programação da Visita (fls. 362 e 363).

#### 17/12/2014 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Ação: Na presente data foi realizada a 10ª Reunião da Comissão, oportunidade na qual foi apresentado o relatório final pelo Senador Humberto Costa. Após a sua leitura, foi aprovado o relatório final da Comissão, com a inclusão da sugestão feita pelo Senador Cícero Lucena.

Foram juntados os seguintes documentos:

- 1. Lista de Presença da 10ª Reunião (fis. 364 a);
- 2. Atas da 8ª, 9ª e 10ª Reuniões da Comissão (fls. 365 a 471); e
- 3. Relatório final aprovado (fls.472 a 502).

# 18/12/2014 SACEI - SERVIÇO APOIO COM. ESP. PARL. DE INQUERITO

Situação: COMISSÃO CONCLUIDA

Ação: Juntado Memorando nº 2/2014- CTERIOSF, comunicando o encerramento dos trabalhos deste coleigiadom e encaminhando o Relatório Final aprovado. (fls. 503 e 504).

## \*\*\*\*\*\*\* Retificado em 18/12/2014\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Juntado o Memorando nº 2/2014- CTERIOSF, comunicando o encerramento dos trabalhos deste colegiado e encaminhando o Relatório Final aprovado (fls. 503 e 504 - Volume II).

Encaminhado para: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

# SENADO FEDERAL

# COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011

# RELATÓRIO FINAL

PRESIDENTE: SENADOR VITAL DO RÊGO

VICE-PRESIDENTE: SENADOR CÍCERO LUCENA

**RELATOR: SENADOR HUMBERTO COSTA** 

# Brasília

Dezembro de 2014

# SUMÁRIO

Aprese	entaçãoentação	.3
I. His	stórico e composição	.6
II. Pla	no de Trabalho	.8
II.1	Cronograma das obras	.8
II.2	Questão regulatória	11
III. A	Audiências públicas realizadas	15
	Ministério da Integração Nacional, Ministério da Defesa e stério do Planejamento, Orçamento e Gestão (dezembro de 2012).	16
	Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União embro de 2012)	17
III.3	Empresas contratadas (fevereiro de 2013)	19
III.4	Audiência Pública em Serra Talhada (PE) (agosto de 2013)	20
III.5	Ministério da Integração Nacional (dezembro de 2013)	21
	Ministério da Integração Nacional, Controladoria Geral da União unal de Contas da União (maio de 2014)	
IV. V	Visitas às obras	23
IV.1	Eixo Norte (março de 2013)	23
IV.2	Eixo Leste (abril de 2013)	24
IV.3	Eixos Leste e Norte (dezembro de 2014)	25
V. Sit	uação atual do PISF	26
VI C	Conclusões	29

# **APRESENTAÇÃO**

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) e o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (PRSF) são iniciativas do Governo Federal sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional (MI) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

De acordo com o MI, o PISF é a iniciativa mais relevante do Governo Federal no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos. Seu objetivo é garantir a segurança hídrica a cerca de 12 milhões de habitantes em 390 municípios dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de gerar empregos e promover a inclusão social. O empreendimento tem extensão de 477 km organizados em dois eixos de transferência de água (Norte e Leste). A obra engloba a construção de quatro túneis, 14 aquedutos, nove Estações de Bombeamento e 27 reservatórios. Por sua vez, o PRSF envolve ações de revitalização e recuperação do rio São Francisco através do monitoramento da qualidade da água, do reflorestamento das nascentes, margens e áreas degradadas e do controle de processos erosivos.

Embora as ações de revitalização não sejam, por sua própria natureza, objeto de controvérsia, a transposição do rio São Francisco – que é a forma frequentemente empregada para se fazer referência ao PISF – pode ser considerada, conforme já se indicava no Requerimento nº 514, de 2011, que deu origem a esta Comissão Externa para Acompanhar os Programas de Transposição e Revitalização do Rio São Francisco (CTERIOSFR), "um dos temas mais polêmicos dos últimos anos em nosso País, gerando acalorados debates em todas as esferas da nossa sociedade". Mesmo após a construção de um consenso sobre o mérito da transposição

(indicado no Plano de Trabalho da CTERIOSFR), o acompanhamento desses projetos é, sem dúvida, um dos temas mais relevantes para a sociedade brasileira e, em particular, para os Estados diretamente envolvidos com os programas de transposição e revitalização do rio São Francisco.

Para que o Senado Federal pudesse acompanhar de perto essa questão, resguardando os interesses dos Estados e da sociedade brasileira, constituiu-se esta Comissão. Composta de cinco membros Titulares e igual número de Suplentes, seu objetivo, conforme indicado no Requerimento nº 514, de 2011, é:

Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como "Transposição do Rio São Francisco", bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, podendo para tanto realizar audiências públicas e diligências externas, requerer informações, bem como outros atos que julgue necessários para a consecução dos objetivos da Comissão.

Instalada em 13 de novembro de 2012, a Comissão reuniu-se em nove ocasiões, tendo sido apresentados e apreciados vários requerimentos durante seu funcionamento. A Comissão realizou diversas audiências públicas e visitou as obras de transposição do rio São Francisco.

Neste momento, de acordo com o MI, a execução física das obras de transposição do rio São Francisco alcança 67,5% e mais de 11 mil trabalhadores fazem parte da empreitada.

O presente Relatório é uma prestação de contas à sociedade do esforço que o Senado Federal tem dedicado ao acompanhamento das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas,

do Nordeste Setentrional e do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Descrevem-se aqui os trabalhos realizados pela Comissão, tais como audiências públicas e visitas às obras, e enfatizam-se os problemas indicados pela Comissão e as subsequentes soluções implementadas pelo MI. Em face das relevantes contribuições da Comissão para o andamento das obras e da necessidade de se fixarem padrões de regulação da oferta e do uso da água após a conclusão da transposição, propõe-se, na conclusão deste Relatório Final, a criação de uma nova Comissão para acompanhar o PISF e o PRSF na próxima legislatura.

# SENADOR HUMBERTO COSTA

# I. HISTÓRICO E COMPOSIÇÃO

A Comissão Externa para Acompanhar os Programas de Transposição e Revitalização do Rio São Francisco (CTERIOSFR) foi criada com base no Requerimento nº 514, de 2011, protocolado em 11 de maio daquele ano. Em 21 de março de 2012, o requerimento foi aprovado e, em 13 de novembro daquele mesmo ano, a Comissão foi instalada. O Requerimento nº 514, de 2011, previa um prazo de doze meses para o funcionamento da CTERIOSFR. O Requerimento nº 1.456, de 2013, de autoria do Senador Vital do Rêgo e outros Senadores, solicitou, nos termos do art. 76, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão até 22 de dezembro de 2014. Esse requerimento foi publicado no Diário do Senado Federal em 12 de dezembro de 2013.

A Composição da Comissão por ocasião de sua 9ª reunião realizada em 6 de maio de 2014 era a seguinte:

# Titulares:

- Vital do Rêgo (PMDB), Presidente;
- Cícero Lucena (PSDB), Vice-presidente;
- Humberto Costa (PT), Relator;
- Lídice da Mata (PSB); e
- Paulo Davim (PV);

# Suplentes:

- Antonio Carlos Valadares (PSB);
- Benedito de Lira (PP);
- Cássio Cunha Lima (PSDB);
- Ciro Nogueira (PP); e
- Inácio Arruda (PCdoB).

A tabela a seguir indica o número de reuniões da CTERIOSFR entre 2012 e 2014.

Ano	Reuniões
2012	5
2013	3
2014	1
Total	9

# II. PLANO DE TRABALHO

Aprovado em 28 de novembro de 2012, o Plano de Trabalho da CTERIOSFR propôs que a Comissão abordasse dois tópicos: o cronograma das obras e a regulação da oferta e do uso da água.

# II.1 Cronograma das obras

O objetivo do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) é assegurar oferta de água a cerca de 12 milhões de pessoas residentes em 390 municípios do agreste e do sertão dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Iniciado em 2007, o Projeto foi incluído na lista de prioridades do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Na ocasião em que o Plano de Trabalho desta Comissão foi aprovado, previa-se a construção de centenas de quilômetros de canal em dois eixos: Leste e Norte. No início de novembro de 2012, as obras haviam avançado 43% e deveriam estar em andamento em nove lotes, mas estavam estagnadas em quatro deles.

A parte concluída (que foi também a primeira iniciada) era o canal de aproximação, em Cabrobó (PE). O Exército foi o responsável por abrir esse trecho, cuja finalidade é distribuir a água do rio São Francisco para todo o Eixo Norte.

Em novembro de 2012, a previsão de custo da obra havia aumentado de R\$ 4,8 bilhões para R\$ 8,2 bilhões (aproximadamente 71%), conforme noticiado pela imprensa. O Plano de Trabalho registrava que os contratos teriam sido reajustados em até 25%, limite fixado pela Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993 ("Lei de Licitações"). Os reajustes teriam sido, também, autorizados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Ainda assim, naquele momento as obras estavam paradas em alguns trechos e o cronograma inicial já havia sido descumprido.

Diante desse diagnóstico, propunha-se que a Comissão fizesse, entre outros, os seguintes questionamentos:

- Qual o cronograma e o custo previstos para as obras?
- Qual o gasto até o momento? Comparar o custo previsto,
   o gasto efetuado e o que falta para concluir a obra.
- Foram realizados aditamentos, revisões contratuais e aplicadas sanções?
- Quais foram as auditorias realizadas, as que estão em andamento e as previstas? Quais foram os encaminhamentos realizados a partir dessas auditorias?
- Como está sendo realizado o acompanhamento e o monitoramento das obras?
- Quais os mecanismos propostos para adequar as obras ao projeto inicial?
- Por que as empresas abandonaram as obras?
- Os custos equivalem ao estimado? Se não, por quê?

- Não estaria ocorrendo um problema recorrente, em que as empresas que disputam licitações estabelecem preços baixos para ganhar a licitação, na esperança de contar com os reajustes?
- Quem será o responsável pelos custos associados à deterioração das obras que estão paradas?
- Qual o cronograma factível para o término das obras?
- O que é necessário fazer para que esse cronograma seja cumprido? São necessárias mudanças legais?

Para responder a esses questionamentos, o Plano de Trabalho indicava ser do interesse da Comissão realizar uma série de audiências com os seguintes órgãos:

- Ministério da Integração Nacional (MI);
- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG);
- Ministério da Defesa (Exército);
- Tribunal de Contas da União (TCU);
- Controladoria Geral da União (CGU);
- Representantes das empresas contratadas; e

 Outros que a Comissão avaliasse que seriam importantes para o debate.

O Plano de Trabalho sugeria ainda que a Comissão visitasse as obras, tanto nos locais onde a execução estava em fase adiantada, como nos locais onde estavam atrasadas ou interrompidas. Para essa ação, indicava-se que era possível que a Comissão solicitasse a cessão de funcionários dos órgãos públicos para prestar esclarecimentos e acompanhar as visitas, tornando-as mais produtivas. Previam-se também audiências públicas nas Assembleias Legislativas dos Estados do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte e visitas a seus Governadores.

# II.2 Questão regulatória

A respeito da questão regulatória, o Plano de Trabalho destacava, inicialmente, a diferença conceitual entre a aplicação de recursos públicos na implantação de sistemas de transposição de água entre bacias hidrográficas e o dispêndio de natureza continuada de recursos públicos na operação e manutenção destes sistemas.

Desde que tenha sido obtido um acordo entre a população da bacia doadora e aquela a ser beneficiada na bacia receptora, a implantação da infraestrutura hídrica necessária à movimentação de água pode ser compreendida como um gasto típico de recursos públicos.

Afinal, assegurar a disponibilidade de água, com segurança e a custos razoáveis, é uma responsabilidade própria do Estado, principalmente quando há uma evidente escassez relativa de água na bacia receptora. Assim, esse tipo de investimento é elegível para a ação governamental e recebe o mesmo tipo de questionamento quanto à urgência e relevância que

é feito na discussão de qualquer gasto expressivo de recursos financeiros pela administração pública.

Situação inversa, no entanto, se observa quando a discussão se refere à operação e manutenção de sistemas de movimentação de água de uma bacia à outra, pois a água é um bem econômico e sua utilização gera benefícios econômicos a serem apropriados pelos usuários na bacia receptora, ou seja, por agentes privados.

Desse modo, a utilização de água na geração de energia hidroelétrica, na irrigação ou no abastecimento às famílias e empresas acarreta custos e gera benefícios. Ainda que os custos principais sejam relativos ao funcionamento do sistema, com destaque para os de bombeamento de água, os benefícios são sempre identificáveis e perfeitamente mensuráveis.

Dessa questão decorre a indagação decisiva e que se refere à razão de ser do uso continuado de recursos públicos na geração de benefícios econômicos a serem apropriados por indivíduos, famílias ou entidades e empresas. Assim, é muito difícil justificar a concessão de subsídios para o custeio permanente do fornecimento de água. Afinal, se a água tem valor econômico, cabe aos que dela se aproveitam o pagamento pelos custos para seu fornecimento. Ou seja, seria inaceitável socializar, como encargo de todos os contribuintes, o custo parcial ou total de fornecimento de água a alguns usuários.

Além de perverso do ponto de vista distributivo, o acesso à água a um custo menor que seu valor econômico é fonte de desvios e ineficiência, o que, mais cedo ou mais tarde, conspirará contra a manutenção da eventual concessão de subsídios governamentais.

Portanto, na discussão do tema da transposição de águas, o Plano de Trabalho da Comissão estabelecia que era fundamental centrar o debate em três questões:

- Qual será o custo de bombeamento da água e o da construção e manutenção da infraestrutura de engenharia hidráulica?
- Quem serão os beneficiários e usuários da água a ser transposta?
- Sobre a perenidade da oferta de água, isto é, se haverá o recurso natural a ser distribuído.

A importância dessa questão deriva do fato de que qualquer transposição pode ser implantada, sob a dimensão de engenharia hidráulica. Ou seja, não há qualquer impedimento de engenharia para trazer água de outras bacias para as principais bacias nordestinas, pois o desafio maior não está na implantação das obras.

Caso a água se destine à irrigação, será indispensável a implementação de uma política agrícola apropriada, com formação técnica dos agricultores, com assistência técnica e apoio financeiro, além da implantação de canais de comercialização e a garantia de manutenção dos mananciais.

A tarifação correta da água atenderá a dois parâmetros de sustentabilidade do sistema: de um lado, estimular o uso eficiente dos recursos hídricos e, de outro lado, assegurar recursos para a manutenção da infraestrutura e para o custeio dos gastos de natureza operacional.

Em todo o mundo, tem-se verificado que o sucesso de uma transposição, com a maximização de seus impactos positivos nas bacias receptoras e a minimização de seus impactos negativos nas bacias doadoras, é um desafio que extrapola a dimensão física de obras, barragens, canais e sistemas de elevação e bombeamento.

Assim, destacava-se, no Plano de Trabalho, ser de suma importância discutir a regulação do sistema. Propunha-se, então, a realização de audiências com:

- Ministério do Meio Ambiente (MMA);
- Agência Nacional de Águas (ANA);
- Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e
   Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
   Francisco e do Parnaíba (Codevasf);
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
- Especialistas que estudam a regulação do uso da água; e
- Outros que a Comissão avaliasse que seriam importantes para o debate.

Assim, em resumo, o Plano de Trabalho da Comissão estabelecia que seu objetivo central era a fiscalização do cumprimento do cronograma das obras, cuja conclusão estava prevista para 2015, e o debate sobre os marcos da questão regulatória do sistema de abastecimento que será gerado, de forma a garantir a sustentabilidade da transposição.

# III. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS<sup>1</sup>

Descrevem-se, a seguir, as audiências públicas realizadas pela Comissão, enfatizando-se os problemas indicados e as subsequentes soluções implementadas pelo Ministério da Integração Nacional. Os detalhes relativos a cada audiência estão disponíveis nas atas das reuniões da Comissão.

As primeiras audiências públicas resultaram dos requerimentos relacionados abaixo, que foram apresentados pelo Relator na 3ª Reunião da Comissão, realizada em 28 de novembro de 2012:

- Requerimento nº 001/12: requer a realização de audiência pública para debater este tema com representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU). Autoria: Senador Humberto Costa.
- Requerimento nº 002/12: requer a realização de audiência pública para debater este tema com representantes do Ministério da Defesa (Comando do Exército). Autoria: Senador Humberto Costa.
- Requerimento nº 003/12: requer a realização de audiência pública para debater este tema com representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Autoria: Senador Humberto Costa.

Além das audiências indicadas nesta seção, representantes da CTERIOSFR participaram também de audiências sobre o tema em Monteiro (PB). Nesses casos, porém, os eventos não foram organizados pela Comissão.

 Requerimento nº 004/12: requer a realização de audiência pública para debater este tema com representantes do Ministério da Integração Nacional (MI). Autoria: Senador Humberto Costa.

Conforme se pode observar a seguir, todas as instituições mencionadas participaram de audiências públicas realizadas pela Comissão. Foi ainda realizada uma audiência pública com empresas contratadas para as obras. Além disso, ocorreu uma audiência da Comissão em Serra Talhada (PE). Na ocasião, discutiram-se as repercussões do processo de transposição sobre a região.

III.1 Ministério da Integração Nacional, Ministério da Defesa e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (dezembro de 2012)

A audiência pública ocorreu em 11 de dezembro de 2012, durante a 4ª Reunião da CTERIOSFR em Brasília.

## Convidados:

- Ministro Fernando Bezerra Coelho, Ministério da Integração Nacional (MI);
- General de Exército Joaquim Maia Brandão Júnior, Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, Representando o Ministério da Defesa; e
- Roberto Nami Garibe Filho, Secretário do Programa de Aceleração do Crescimento – Substituto, Representando

o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

O propósito central dessa audiência foi examinar os motivos do atraso nas obras e discutir as soluções que podem contribuir para a aceleração do cronograma. Na ocasião, destacou-se a importância do PISF para a Região Nordeste do Brasil e foi apresentada uma descrição detalhada do projeto. Apresentaram-se também informações sobre o avanço físico das obras e sobre seu cronograma de execução. Discutiram-se as estimativas de custos apresentadas para o Projeto, bem como o papel do Exército Brasileiro no PISF. Discutiu-se também a articulação do PISF com o PAC, uma vez que o Projeto consta da lista de prioridades do Programa.

Ponderou-se que a urgência inicial em relação ao início das obras pode ter motivado a aprovação de projetos básicos e executivos com imperfeições. Além disso, a ausência de estudos mais aprofundados sobre as condições do solo, além de restrições nas regras de licitação dificultaram contratações em bases mais realistas. O atraso das obras foi também associado, em alguns casos, a dificuldades com as licenças ambientais e a problemas fundiários. Observou-se que o lote de obras sob a responsabilidade do Exército avançou no ritmo esperado. Nesse caso, porém, trata-se de um trecho que envolveu serviços mais simples e que foi iniciado antes dos demais.

# III.2 Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União (dezembro de 2012)

A audiência pública ocorreu em 12 de dezembro de 2012, durante a 5ª Reunião da CTERIOSFR em Brasília.

# Convidados:

- Luiz Claudio de Freitas, Diretor de Auditoria de Programas da Área de Infraestrutura, representando a Controladoria Geral da União (CGU); e
- Juliana Pontes Monteiro de Carvalho, Titular da Secretaria de Fiscalização de Obras 4 (Secob-4), representando o Tribunal de Contas da União (TCU).

Nessa audiência, cujo foco foi o acompanhamento da transposição do rio São Francisco sob o ponto de vista dos órgãos de controle, sintetizou-se como a CGU tem empreendido esforços e priorizado, em suas ações, o acompanhamento do PISF. Discutiu-se ainda como o TCU vem fiscalizando a evolução das obras associadas ao projeto.

Na ocasião, os representantes da CGU e do TCU argumentaram que a previsão de que em 2015 o PISF estará concluído está associada a duas ações do Governo Federal: melhoria na gestão de contratos por parte do Ministério da Integração Nacional e reforço na supervisão e no acompanhamento dos trabalhos. De acordo com o representante da CGU, "por mais que haja licitações bem acabadas e contratos bem formulados, o que vai determinar o prazo é o sucesso do modelo de gestão apresentado. Já houve déficits de gestão consideráveis no projeto. A questão financeira não tem se mostrado obstáculo: o fluxo é recorrente, e as empresas têm interesse em executar a obra e têm interesse em receber". Já a representante da CGU argumentou que pode haver atrasos no cumprimento do cronograma se não houver o devido acompanhamento e fiscalização.

# III.3 Empresas contratadas (fevereiro de 2013)

A audiência pública ocorreu em 19 de fevereiro de 2013, durante a 6ª Reunião da CTERIOSFR em Brasília.

# Convidados:

- Adriano Fernandes, representante da Carioca Engenharia;
- Willian Tannus, representante do Grupo Serveng;
- Cassio Vitorri, representante da S/A Paulista Construções e Comércio;
- Elmar Varjão, Diretor Superintendente do Nordeste da Construtora OAS e, na audiência pública, representando também o grupo Coesa; e
- Alfredo Moreira Filho, representante da Construtora Barbosa Mello.

Nessa audiência, discutiram-se as razões pelas quais houve um processo lento de andamento em alguns lotes e por que alguns deles foram paralisados. As construtoras apontaram os problemas sob seu ponto de vista. Esses problemas envolveram, segundo os representantes das empresas, inconsistências no projeto básico, planilhas orçamentárias discrepantes da realidade da obra e pendências de ordem fundiária e ambiental.

Na reunião em que ocorreu essa audiência, foi apresentado o requerimento abaixo:

 Requerimento nº 005/13: requer seja encaminhada a essa Comissão cópia dos contratos e aditivos referentes a todos os lotes do projeto de transposição do Rio São Francisco, Autoria: Senador Cássio Cunha Lima.

O propósito desse requerimento foi aprofundar o entendimento sobre as razões da lentidão do andamento das obras em alguns lotes e por que alguns deles foram paralisados.

# III.4 Audiência Pública em Serra Talhada (PE) (agosto de 2013)

A audiência pública ocorreu em 30 de agosto de 2013, na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco. O requerimento que lhe deu origem, apresentado na 7<sup>a</sup> Reunião da CTERIOSFR, está transcrito a seguir:

Requerimento nº 006/13: requeiro, nos termos do art. 74, II, combinado com o art. 90, II e IV, do Regimento Interno do Senado Federal, realização de audiência pública desta Comissão na cidade de Serra Talhada – PE, com a finalidade de discutir o andamento da obra da Transposição do Rio São Francisco, bem como as obras de segurança hídrica, tal como da Adutora do Agreste. Autoria: Senador Humberto Costa.

A audiência contou com a participação dos Senadores Vital do Rêgo e Humberto Costa e foi precedida por uma visita desses Parlamentares aos trechos da obra no Município de Custódia. Compareceram ao evento políticos da região e representantes do Ministério

da Integração Nacional e da Procuradoria da República. Na ocasião, discutiram-se as repercussões do processo de transposição sobre a região.

# III.5 Ministério da Integração Nacional (dezembro de 2013)

A audiência pública ocorreu em 10 de dezembro de 2013, durante a 8ª Reunião da CTERIOSFR em Brasília.

#### Convidado:

 Ministro Francisco José Coelho Teixeira, Ministério da Integração Nacional (MI).

Nessa audiência, foi apresentado o Balanço das Obras de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Na ocasião, discutiu-se o Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional e o papel da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) como operadora federal desse sistema.

III.6 Ministério da Integração Nacional, Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da União (maio de 2014)

A audiência pública ocorreu em 6 de maio de 2014, durante a 9ª Reunião da CTERIOSFR em Brasília.

#### Convidados:

 Ministro Francisco José Coelho Teixeira, Ministério da Integração Nacional (MI);

- Juliana Pontes Monteiro de Carvalho, Secretária de Fiscalização de Obras do Tribunal de Contas da União (TCU); e
- Wagner Rosa da Silva, Diretor de Auditoria da Secretaria
   Federal de Controle Interno da Controladoria Geral da União (CGU).

Na ocasião, discutiu-se o andamento das obras de transposição do rio São Francisco. A representante do TCU destacou a importância da interação do Tribunal com a equipe do Ministério da Integração Nacional em face da magnitude do projeto. Destacou-se a necessidade de interação com o operador federal do Sistema de Gestão do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional conforme estabelecido no Decreto nº 8.207, de 13 de março de 2014. Discutiu-se a importância do acompanhamento das obras complementares que compõem os subsistemas do PISF. Destacou-se que a interlocução do Ministério da Integração Nacional com os órgãos de controle contribuiu para sanar eventuais irregularidades e para evitar paralisações.

#### IV. VISITAS ÀS OBRAS

Além das audiências públicas que promoveu, a Comissão teve a oportunidade de visitar as obras em três ocasiões.<sup>2</sup> Essas visitas complementam os relatos apresentados nas audiências, uma vez que permitem uma visão mais direta e apurada do significado das obras de transposição do rio São Francisco. Nesta seção, descrevem-se as principais conclusões dessas visitas.

## IV.1 Eixo Norte (março de 2013)

Em 7 e 8 de março de 2013, uma delegação da CTERIOSFR visitou as obras no Eixo Norte, ouvindo membros do Governo Federal e representantes de órgãos de controle e das empresas envolvidas na construção. O Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, participou da visita.

No dia 7 de março, o grupo visitou as obras do Túnel Cuncas I, no Município de São José de Piranhas, na Paraíba. Trata-se de uma obra de grande magnitude situada em um trecho fundamental para o conjunto das intervenções. Foi possível observar que a perfuração é feita na rocha maciça, avançando a um ritmo de cerca de quatro metros por dia. Na ocasião, um terço do túnel já estava concluído. Do outro lado da rocha, no Município de Mauriti, no Ceará, a delegação visitou o Túnel Cuncas II, de 4 km de extensão e já praticamente finalizado. Os dois túneis juntos formarão o maior túnel da América Latina para transporte de água.

As visitas registradas nesta seção envolveram uma delegação da CTERIOSFR. O Relator da Comissão, entretanto, visitou as obras em outras ocasiões. Esse é o caso, por exemplo, da visita ocorrida em maio de 2014, durante a qual o Senador Humberto Costa e outros Parlamentares acompanharam o Ministro da Integração Nacional Francisco José Coelho Teixeira, em uma inspeção nas obras da Adutora do Jatobá, na região da cidade de Ibimirim (PE).

No dia 8 de março, a delegação dirigiu-se para a barragem de Jati, que fica a 525 quilômetros de Fortaleza. Havia, na ocasião, cerca de 150 homens e 87 máquinas trabalhando na limpeza e no preparo da área. No local, estava sendo construída uma sequência de seis barragens e recuperava-se uma barragem já existente. Em seguida, o grupo conheceu a estáção de bombeamento EBI3, situada a 20 quilômetros do Município de Salgueiro, em Pernambuco. Essa estação deverá bombear água a 90 metros de altura, possibilitando então o escoamento até o Rio Grande do Norte apenas com a força da gravidade. Em seguida, o grupo dirigiu-se ao Município de Cabrobó, em Pernambuco, para visitar outra estação de bombeamento (EBI1). Trata-se de um trecho muito importante por ser o local de captação da água do rio São Francisco.

## IV.2 Eixo Leste (abril de 2013)

Em 19 de abril de 2013, uma delegação da CTERIOSFR visitou as obras no Eixo Leste. O grupo sobrevoou trechos do Eixo Leste nas cidades de Floresta e Sertânia, em Pernambuco, e de Monteiro e Campina Grande, na Paraíba.

Em Floresta (PE), a delegação da Comissão vistoriou as obras da Estação de Bombeamento nº 1, em construção pelo Exército e com 97% das obras concluídas. Na ocasião, o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, assinou o termo de aceitação da entrega do canal de aproximação do Eixo Leste. A Comissão sobrevoou os lotes 9 e 13, cujas obras estavam suspensas na ocasião (embora se previsse sua retomada a curto prazo após a conclusão do processo licitatório).

A delegação visitou também uma exposição fotográfica do Programa de Arqueologia, que faz parte de uma das 38 estratégias socioambientais desenvolvidas no âmbito do Projeto.

Finalmente, em Monteiro, na Paraíba, a delegação acompanhou uma audiência pública (itinerante) na Câmara Municipal, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado. Nessa audiência, discutiuse o andamento das obras.

### IV.3 Eixos Leste e Norte (dezembro de 2014)

Mais recentemente, em 8 de dezembro de 2014, uma delegação da CTERIOSFR fez nova visita técnica às obras do empreendimento nas cidades paraibanas de Monteiro e São José de Piranhas e sobrevoou de helicóptero o Município de Mauriti, no Ceará. Assim como nas visitas anteriores, o Ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, participou da visita.

O grupo iniciou a agenda de trabalho no Eixo Leste, em Monteiro (PB), e acompanhou a execução do túnel Engenheiro Giancarlo de Lins Cavalcanti (antigo túnel Monteiro) e da galeria Monteiro, outra estrutura de engenharia. Foi possível constatar que quase 130 trabalhadores atuam, em dois turnos de serviço, para executar as estruturas, que contam com 84 máquinas em operação. O túnel possui mais de 150 metros escavados e terá três quilômetros de extensão. Em seguida, a delegação seguiu para o Eixo Norte do projeto, tendo sobrevoado as obras que passam por Mauriti (CE).


#### V. SITUAÇÃO ATUAL DO PISF

Entre a aprovação do Plano de Trabalho da CTERIOSFR, em novembro de 2012, e outubro de 2014, houve um avanço significativo do PISF. Nesta seção, registra-se sua situação atual com base no Sumário Executivo do Projeto de Integração do Rio São Francisco, editado em outubro de 2014 pelo Ministério da Integração Nacional.

De acordo com esse documento, a execução física do PISF alcançou, em outubro de 2014, 67,5%. O Eixo Leste conta com 67,1% de execução e o Eixo Norte, com 67,8%. Esses percentuais correspondem à evolução dos projetos executivos, das obras civis, das instalações eletromecânicas e das ações ambientais.


No Sumário Executivo, destaca-se que, em outubro de 2014, foi iniciado o bombeamento no Eixo Leste, com enchimento das estruturas da Meta 1 Leste, composta por canais e pelo reservatório Areias. No Eixo Norte, o destaque foi a conclusão das escavações do Túnel Cuncas I.

O gráfico a seguir, também extraído do Sumário Executivo do PISF editado pelo Ministério da Integração Nacional, indica a execução financeira do Projeto, considerando investimentos em obras civis, equipamentos eletromecânicos, supervisão, gerenciamento, projeto e ações ambientais.

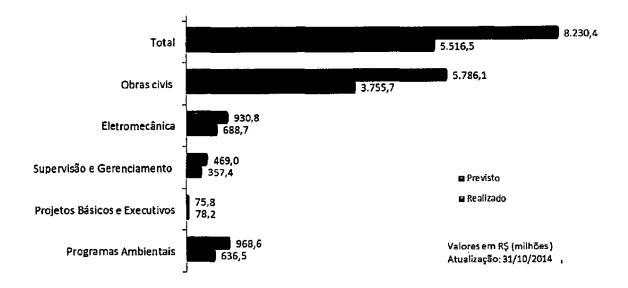

Conforme se pode observar, o orçamento total previsto para o Projeto alcança R\$ 8.230,4 milhões. Desse total, R\$ 5.516,5 milhões já foram realizados. Preveem-se, para os investimentos em obras civis, R\$ 5.786,1 milhões. Nessa rubrica, os valores realizados alcançaram, no final de outubro de 2014, R\$ 3.755,7 milhões, que correspondem a cerca de 65% dos valores previstos.

O Projeto registrava, em outubro deste ano, 11.295 trabalhadores contratados para atuarem nas obras. O gráfico a seguir mostra que esse indicador alcançou seus valores máximos no segundo semestre de 2014.

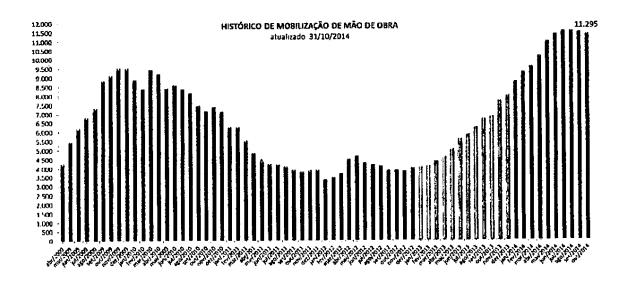

Além disso, alguns lotes de obras estão em funcionamento 24 horas por dia, e registravam-se, no mês de referência do documento. 3.878 máquinas em operação nas frentes de serviço.

#### VI. CONCLUSÕES

Ao longo de cerca de dois anos de funcionamento, a Comissão Externa para Acompanhar os Programas de Transposição e Revitalização do Rio São Francisco (CTERIOSFR) ajudou a identificar problemas e a propor soluções para que as obras de transposição do rio São Francisco pudessem avançar no ritmo que a sociedade brasileira deseja. Para isso, a Comissão reuniu-se em nove ocasiões, realizou diversas audiências públicas e visitou as obras associadas ao Projeto.

Conforme se evidenciou neste Relatório Final, a Comissão permitiu que o Senado Federal exercesse seu papel de fiscalização e, ao mobilizar diversas instituições em audiências públicas, seguramente contribuiu para uma melhor articulação entre o Governo Federal, os órgãos de controle e as empresas envolvidas na execução das obras.

Na ocasião em que o Plano de Trabalho desta Comissão foi aprovado, previa-se a construção de centenas de quilômetros de canal em dois eixos: Leste e Norte. No início de novembro de 2012, o progresso físico do PISF situava-se em 43% e as obras, que deveriam estar em andamento em nove lotes, estavam estagnadas em quatro deles.

Atualmente, de acordo com Sumário Executivo do Projeto de Integração do Rio São Francisco editado em outubro de 2014 pelo Ministério da Integração Nacional (MI), a execução física do PISF atinge 67,5%. Esse mesmo documento mostra que, no segundo semestre de 2014, a contratação de mão de obra e o número de máquinas em operação nas frentes de serviço alcançaram seus valores mais elevados. Neste momento, mais de 11 mil trabalhadores fazem parte da empreitada.

É claro que esse avanço significativo em dois anos é o resultado dos esforços de um conjunto de instituições e da própria sociedade brasileira e reflete um processo de aprendizado pelo qual passaram as instituições envolvidas. Considerando a magnitude da obra, houve dificuldades iniciais decorrentes, por exemplo, de imperfeições nos projetos básicos e executivos e da falta de conhecimento sobre a composição do solo. O atraso das obras foi também associado, em alguns casos, a restrições nas regras de licitação, a dificuldades com as licenças ambientais e a problemas fundiários. O Senado Federal, através desta Comissão, contribuiu para a superação desses problemas ao exercer seu papel de fiscalização e ao articular as instituições envolvidas com o PISF.

Apesar de todos esses avanços, o Senado Federal tem ainda muito a contribuir com esse processo. Em primeiro lugar, é preciso prosseguir acompanhando as obras de transposição, cuja conclusão está prevista para 2015, e de revitalização, que são requisito para a oferta abundante de recursos hídricos depois de terminadas as obras. Para isso, é necessário preservar a interlocução da Comissão com aqueles que já participaram de suas audiências públicas e auscultar outros segmentos da sociedade indiretamente envolvidos direta ou com processo. Adicionalmente, é preciso converter o aprendizado acumulado com o acompanhamento do PISF em proposições legislativas que contribuam para uma melhor e mais célere aplicação dos recursos destinados a grandes projetos de investimentos do Governo Federal. Por fim, o Senado Federal pode contribuir para a definição de um padrão de regulação capaz de garantir a sustentabilidade do processo após a conclusão da transposição. Essas questões vão se tornando mais definidas à medida que a obra aproxima-se de sua conclusão.

Concluímos este relatório com a sensação de dever cumprido, mas, ao mesmo tempo, antevendo os novos desafios que a próxima legislatura deverá enfrentar para que o Senado Federal continue contribuindo com o Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional e com o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. É por essa razão que propomos a criação de uma nova Comissão para acompanhar essas iniciativas na próxima legislatura e, nesse matiz, indicar ao Ministério da Integração Nacional a necessidade de incluir no Projeto o berço do Rio Piancó, no Estado da Paraíba, devido à importância estratégica e econômica que assume na Região. Entendemos que a continuidade dos trabalhos desta Comissão não somente contribuirá para um melhor andamento dessas iniciativas, como permitirá o transbordamento dos resultados alcançados para outras ações do Governo Federal que envolvam grandes projetos de interesse da população brasileira.

Assinam o Relatório Final, em 17 de dezembro de 2014.

Senador Cícero Lucena

Presidente Eventual

Senador Humberto Costa

Relator


# SENADO FEDERAL SECRETARIA DE COMISSÕES

Reunião: 10ª Reunião, Ordinária, da CTERIOSFR

Data: 17 de dezembro de 2014 (quarta-feira), às 14h30 Local: Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 9

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO - CTERIOSFR

1/L 411//L14	TYCHO DO MO	SAU FRANCISCO - CTERIOSI R
TITULARES	<b>i</b>	SUPLENTES
. Bloco	de Apoio ag Gover	no(PSOL, PT, PDT, PCdoB, PRB)
Humberto Costa (PT) Hume	村一	1. Inácio Arruda (PCdoB)
Lídice da Mata (PSB)		2. Antonió Carlos Valadares (PSB)
Blo	co Parlamentar da	Maioria(PV, PSD, PMDB, PP)
Vital do Rêgo (PMDB)		1. Benedito de Lira (PP)
Paulo Davim (PV)	00	2. Ciro Nogueira (PP)
	Bloco Parlamenta	rda Minoria (PSDB, DEM)
Cicero Lucena (PSDB) 🕰 _	OFF	1. Cássio Cunha Lima (PSDB)



# Coleção Direitos Sociais



Coletânea de publicações, com atualização periódica, sobre temas relacionados aos Direitos Sociais.

Conheça nossa livraria virtual, acesse: www.senado.gov.br/livraria

Edição de hoje: 50 páginas (O.S. 15769/2014)

Secretaria de Editoração e Publicações – SEGRAF

