



CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Diagnóstico situacional das obras inacabadas - Creches Proinfância e a Resolução 3/2018



Glademir Aroldi
Presidente da CNM
09/maio/2019

Diagnóstico Situacional – nov/17



O Programa Proinfância financiou a construção de 8.826 unidades de creches, sendo que apenas 3.595 haviam sido concluídas, à época. Também foram identificadas obras inacabadas (476) e paralisadas (441) em 695 Municípios.


Quando o FNDE classifica a obra como INACABADA, o convênio é considerado em finalização e, com isso, entra em fase de prestação de contas, podendo a autarquia solicitar a devolução dos recursos.

UF	Execução	Concluída	Obra Cancelada	Em Reformulação	Planejamento pelo proponente	Licitação	Contratação	Paralisada	Inacabada	Total
Total	1.828	3.595	455	487	911	475	158	441	476	8.826
% do Total	20,7%	40,7%	5,2%	5,5%	10,3%	5,4%	1,8%	5,0%	5,4%	100,0%

Fonte: SIMEC, novembro/2017 | FNDE

- A pesquisa realizada em **agosto/2018**, visando abranger as **476** obras inacabadas das creches municipais – Proinfância, alcançou 394 Municípios e, desses, **309 (78,4%) responderam**.
- Os dados avaliados reforçam que mesmo com a publicação da normativa pouco se avançou neste período para repactuação dos Termos de compromisso e a conclusão dessas obras.

Situação das obras inacabadas de creches

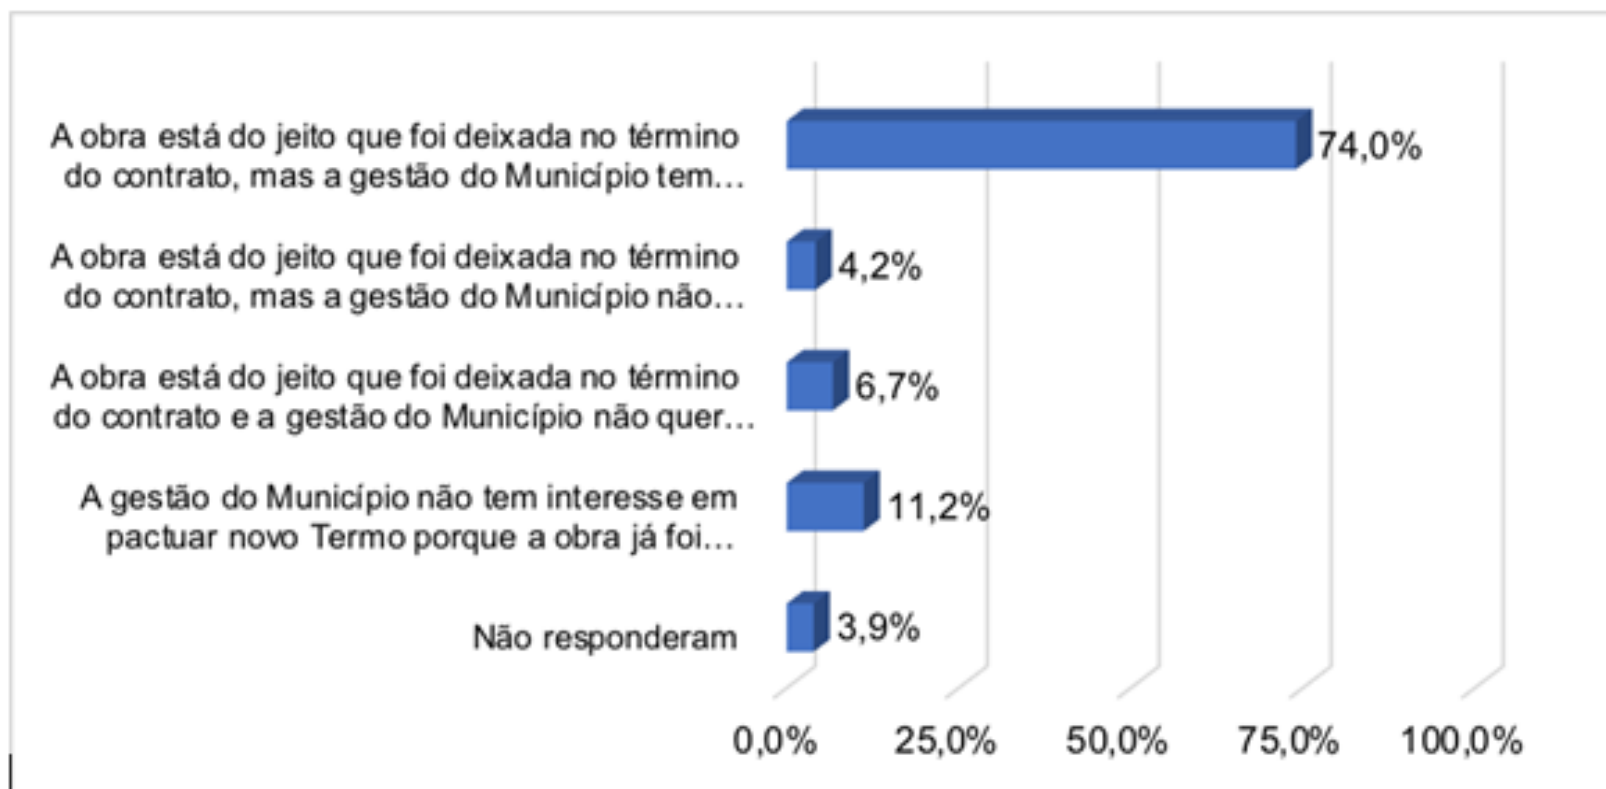

Fonte: CNM.

- **74% dos Municípios que responderam a pesquisa tem interesse em concluir a obra.**


Municípios que querem repactuar a obra – Status da Obra



Fonte: CNM.

- 96,2% dos Municípios que responderam a pesquisa tem interesse em repactuar a obra, independente do status.

Tempo de resposta do FNDE para novas pactuações

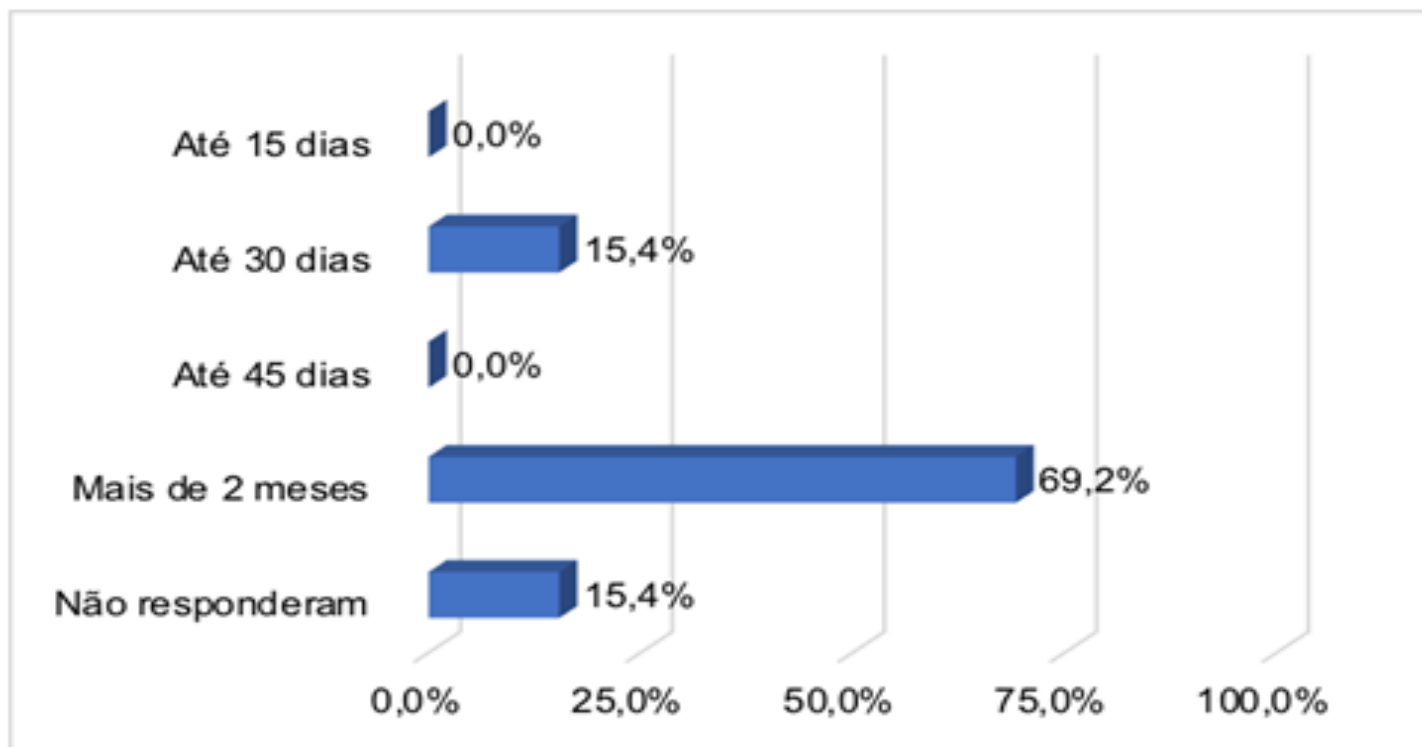

Fonte: CNM.

Conclusões da Pesquisa



- 1) **Desconhecimento sobre a Resolução 3/2018, do FNDE, por parte de 18% dos entrevistados.** Indica que mais esforços precisam ser adotados no sentido de fazer chegar a informação aos Municípios.
- 2) **Baixa resolutividade por parte da normativa.**
 - ✓ Apenas 179 Municípios (67,5%) estão providenciando ou já encaminharam os documentos necessários para repactuação.
 - ✓ Apenas 13 Municípios (4,9%) conseguiram firmar o novo Termo.
 - ✓ **É necessário que o FNDE reavalie as condições da repactuação e aprimore o fluxo da documentação.**

1. Para CNM, o FNDE e o governo federal devem intensificar ações de recuperação desses contratos, uma vez que 265 Municípios (85,7%) manifestaram a intenção de finalizar suas obras inacabadas.
2. É necessário encontrar soluções **para o aporte de recursos financeiros federais para conclusão das obras**, como medida conjunta entre os governos federal e municipal, em favor da Educação Básica Pública brasileira.

3. Somente a prorrogação do prazo da Resolução nº 3/2018 até a data de 25/09/2019, não resolverá os problemas já identificados.
4. Nas situações de conclusão da obra ou prestação de contas parcial, que o FNDE mantenha as bases de dados atualizadas, evitando bloqueios nos recursos e penalidades aos Municípios.
5. Realização de novo estudo entre CNM e FNDE para avaliar **em conjunto e profundidade** os motivos para não conclusão das obras na área da Educação.

Obrigado!

