

Message


Sent: 10/30/2020 1:23:27 AM
To: André Luiz de Abreu [andre.abreu@saude.gov.br]; INSUMOS CGLAB [insumos.cglab@saude.gov.br]; Mayrla da Silva Moniz [mayrla.moniz@saude.gov.br]; Alexandre Pinto de Paiva Nasser [Alexandre.Nasser@saude.gov.br]; Tainah Pedreira Thomaz Maya [tainah.maya@saude.gov.br]; Alexander Vargas [alexander.vargas@saude.gov.br]
CC: Cavalli, Selma [Selma.Cavalli@thermofisher.com]; Rebelatto, Alexandre [alexandre.rebelatto@thermofisher.com]; Camargo, Marisa d. [marisa.camargo@thermofisher.com]; Lande, Andrea [andrea.lande@thermofisher.com]; Moura, Rodrigo T. [rodrigo.moura@thermofisher.com]
Subject: RE: Up-date Contrato Nº 250/2020 - Extração - Thermo Fisher

Bom dia a todos!

Prezados,

Conforme apresentado na reunião de ontem e dando prosseguimento ao nosso processo de comunicação e atualização semanal, segue e-mail para acompanhamento das ações, questionamentos e esclarecimentos em geral:

Thermo Fisher Status 14/10

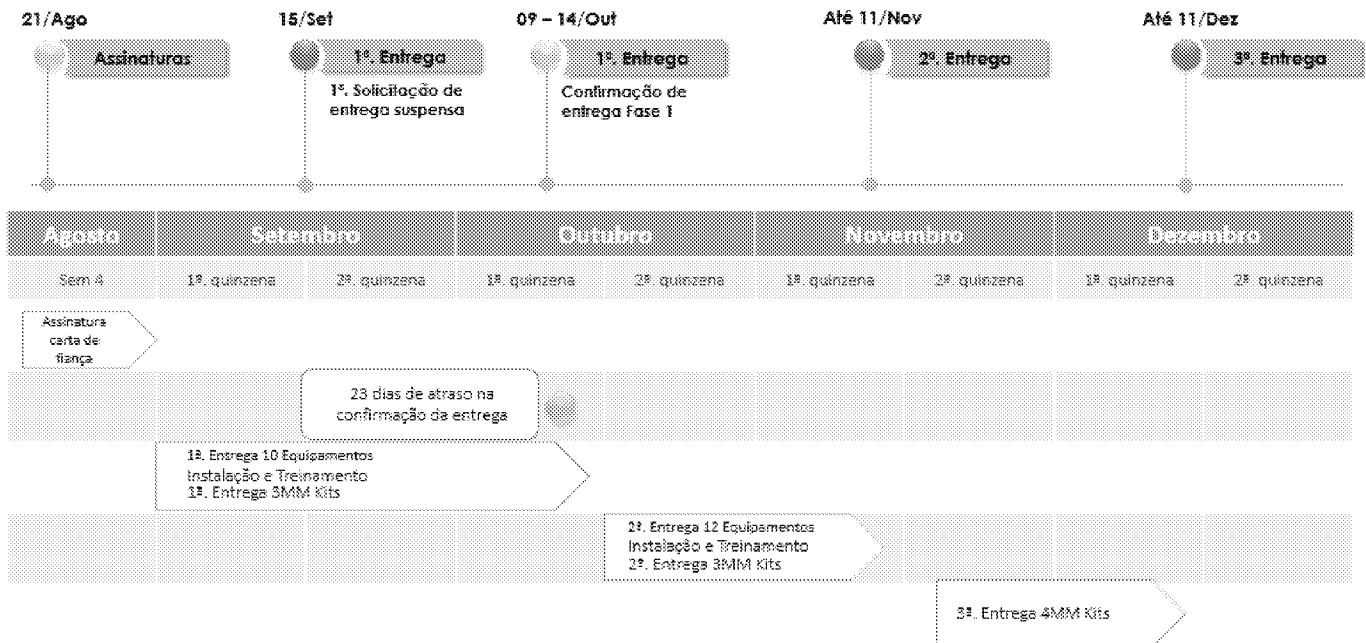

Fase 1 - Concluída

- 1ª. Entrega de consumíveis e equipamentos concluída

- 09-10/09 – 336 mil extrações (adiantamento)
- 09/10 – 312 mil extrações
- 13/10 – 1 milhão 344 mil extrações
- 14/10 – 1 milhão 8 mil extrações – previsão de conclusão – 14/10 fim do dia
- Totalizando 3 milhões de extrações

Fase 2 - Pendências

- 2ª. Entrega de equipamentos
- 2ª. Entrega de consumíveis

- Formalização e priorização de instalação / treinamento para 12 LACENS
- Thermo Fisher enviar cronograma
- 3MM de extrações já encontram-se no Brasil – entrepostada
- Previsão da 2ª. entrega até 11/Nov.
- Envio imediato de solicitação de pré agendamento para 11/Nov.

Fase 3 – Última entrega


- 3ª. Entrega de consumíveis

- Até 11/12 – 4 milhões de extrações

Atenciosamente, seguimos à disposição!

Paula Cherin

Gerente, Setor Público e Acesso a Mercado



A banner for ThermoFisher Scientific featuring a microscopic image of a virus on the left. The text in the center reads: "COVID-19 Confira nossas soluções para superarmos essa crise lado a lado! Saiba mais >". The ThermoFisher Scientific logo is on the right.

Thermo Fisher Scientific

Rua Eugenio de Medeiros, 303 • 11º andar • São Paulo • SP • 05425-000

Phone: +55 11 2730-3121 • Mobile: +55 11 95311-8465

paula.cherin@thermofisher.com/ www.thermofisher.com

Fique por dentro das ações da Thermo Fisher Scientific nas Redes Sociais.

Acompanhe as novidades na área das ciências da vida>>



ThermoFisher
SCIENTIFIC

From: Cherin, Paula

Sent: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 19:02

To: André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>; Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; Tainah Pedreira Thomaz Maya <tainah.maya@saude.gov.br>; Alexander Vargas <alexander.vargas@saude.gov.br>

Cc: Cavalli, Selma <Selma.Cavalli@thermofisher.com>; Rebelatto, Alexandre <alexandre.rebelatto@thermofisher.com>; Camargo, Marisa d. <marisa.camargo@thermofisher.com>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>; Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>

Subject: RE: Up-date Contrato Nº 250/2020 - Extração - Thermo Fisher

Importance: High

Boa tarde a todos!

Prezado André,


Conforme apresentado na reunião de hoje e dando prosseguimento aos nosso processo de comunicação e atualização semanal, segue e-mail para acompanhamento das ações, questionamentos e esclarecimentos em geral:

Thermo Fisher Status 21/09

Cronograma de entrega de equipamentos, instalação e treinamento

		Priorização de instalações e treinamentos	Previsão de entrega Equipamento / Notebook	Previsão de Instalação	Previsão de Treinamento	Comentários
1	RS	Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul - LACEN/RS	09/sep	09/sep	09/sep	Equipamento instalado e treinamento
2	TO	Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins - LACEN/TO	04/sep	09/sep	09/sep	Equipamento instalado e treinamento
3	PI	Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí - LACEN/PI	04/sep	11/sep	15/sep	Equipamento instalado e treinamento
4	GO	Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás - LACEN/GO	05/sep	05/sep	09/sep	Equipamento instalado e treinamento
5	DF	Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal - LACEN/DF	05/sep	09/sep	10/sep	Equipamento instalado e treinamento
6	MG	Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais - LACEN/MG	05/sep	03/sep	04/sep	Equipamento instalado e treinamento
7	PA	Laboratório Central de Saúde Pública do Pará - LACEN/PA	04/sep	05/sep	09/sep	Equipamento instalado e treinamento
8	MS	Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul - LACEN/MS	05/sep	05/sep	09/sep	Equipamento instalado e treinamento
9	MT	Laboratório Central de Saúde Pública do Mato Grosso - LACEN/MT	05/sep	08/sep	11/sep	Equipamento instalado e treinamento
10	SE	Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe - LACEN/SE	02/09/2020 16/09/2020	16/09/2020 21/09/2020	16/09/2020 21/09/2020	- Instalação realizada em 16/09, houve um problema na instalação. - Equipamento substituído entregue dia 18/09 - Instalação e conclusão do treinamento hoje dia 21/09

Entrega de pipetas LACEN GO



- Foi identificado um problema na entrega da pipeta em GO e está sendo providenciado a troca imediata.

LACEN MS

- Foi identificado um sobra de reagente (beads) no final do processo. Realizada a calibração do equipamento no dia de hoje 21/09.
- Execução de corrida de extração com amostras para testes.

Alinhamentos

- 1ª. Entrega de consumíveis prevista para dias 16 e 17/09.
 - 11/09 – pré agendamento
 - 14/09 – agendamento com envio de documentações (NFs e laudos)
 - 16/09 – suspensão não formalizada do agendamento
 - 16/09 – envio de notificação aos fiscais do contrato – Sr. Andre Abreu e Sr. Alexander Vargas
 - 17/09 – reunião virtual com diretor da DLOG – Sr. Roberto Dias. Aguardando posição estimada para 21/09.
- Produtos embalados, preparados para entrega e aguardando confirmação de agendamento.


FASE 2

- 3MM de extrações (2ª. Entrega) e 12 equipamentos King Fishers já encontram-se no Brasil.
- Formalização da priorização de instalação e treinamento para a Fase 2. (Whatsapp Tainah)

Atenciosamente, seguimos à disposição!

Paula Cherin

Gerente, Setor Público e Acesso a Mercado



Thermo Fisher Scientific

Rua Eugenio de Medeiros, 303 • 11º andar • São Paulo • SP • 05425-000

Phone: +55 11 2730-3121 • Mobile: +55 11 95311-8465

paula.cherin@thermofisher.com / www.thermofisher.com



From: Cavalli, Selma <Selma.Cavalli@thermofisher.com>

Sent: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 19:26

To: André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>; Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>; Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>; Camargo, Marisa d.

<marisa.camargo@thermofisher.com>; Rebelatto, Alexandre <alexandre.rebelatto@thermofisher.com>; Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>; Castaldelli, Caue R. <Caue.Castaldelli@thermofisher.com>

Subject: RES: Up-date Contrato Nº 250/2020 - Extração - Thermo Fisher

Caros André e Tainah,

Conforme falamos, estamos de acordo com a solicitação abaixo para entrega parcial descentralizada de 240.000 extrações para cada um dos Lacens listado abaixo. As demais 2.760.000 extrações serão entregues no Centro de Distribuição em Guarulhos. Desta forma, para essas 240.000 extrações, vocês podem efetuar a retirada na quarta-feira, dia 09/09, as 17:00h, no endereço a seguir:

Empresa (Company)	CNPJ	Unidade (Branch)	Endereço (Address)
LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA	63.067.904/0002-35	Filial 2 (Breno)	R BRENO FERRAZ DO AMARAL, 390 - VILA FIRMIANO PINTO - SAO PAULO - SP - CEP 04124-020

Contato: Caue Castaldelli - (11) 99806-3069

Atenciosamente,
Selma

De: André Luiz de Abreu <andre.abreu@saude.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 4 de setembro de 2020 14:40

Para: Cherin, Paula <paula.cherin@thermofisher.com>; INSUMOS CGLAB <insumos.cglab@saude.gov.br>; Mayrla da Silva Moniz <mayrla.moniz@saude.gov.br>; Alexandre Pinto de Paiva Nasser <Alexandre.Nasser@saude.gov.br>; Lande, Andrea <andrea.lande@thermofisher.com>; Camargo, Marisa d. <marisa.camargo@thermofisher.com>; Cavalli, Selma <Selma.Cavalli@thermofisher.com>; Rebelatto, Alexandre <alexandre.rebelatto@thermofisher.com>; Moura, Rodrigo T. <rodrigo.moura@thermofisher.com>

Assunto: ENC: Up-date Contrato Nº 250/2020 - Extração - Thermo Fisher

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Prezados,

A fim de dar celeridade no envio dos testes aos LACEN, gostaria de verificar a possibilidade de realizarmos a primeira entrega de forma descentralizada, ou seja, sem passar pelo CD/Guarulhos.

Na tabela abaixo há o quantitativo de testes dos 10 LACEN que estão recebendo os primeiros equipamentos e inclui o LACEN/BA para essa entrega.

Fico no aguardo para alinharmos os tramites dessa entrega.

LACEN/UF	QTT AUTORIZADO
LACEN/RS	12.000
LACEN/TO	24.000
LACEN/SC	12.000
LACEN/GO	12.000
LACEN/DF	24.000

LACEN/MG	24.000
LACEN/PB	12.000
LACEN/MS	24.000
LACEN/MT	24.000
LACEN/SE	12.000
LACEN/BA	60.000
TOTAL	240.000

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o.
