Figura 23 – Cronograma atual do fechamento das frentes de lavra por enchimento
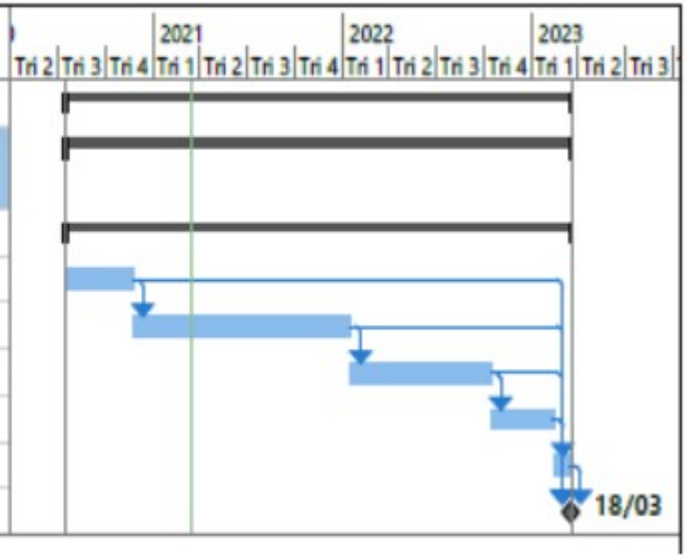
Id	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
1	FECHAMENTO DAS LAVRAS DE MINARÇÃO	697 dias	Qui 16/07/20	Sáb 18/03/23
2	CRONOGRAMA MASTER FECHAMENTO DA MINA	697 dias	Qui 16/07/20	Sáb 18/03/23
3	PJ-1300522 - ENCHIMENTO DE MINA	697 dias	Qui 16/07/20	Sáb 18/03/23
4	Mobilização / Obras de Canteiro Principal	131 diasd	Qui 16/07/20	Ter 24/11/20
5	Enchimento das frentes de lavra 07 e 19	420 diasd	Ter 24/11/20	Ter 18/01/22
6	Enchimento das frentes de lavra 17	270 diasd	Ter 18/01/22	Sáb 15/10/22
7	Enchimento das frentes de lavra 04	120 diasd	Sáb 15/10/22	Dom 12/02/23
8	Desmobilização	34 diasd	Dom 12/02/23	Sáb 18/03/23
9	Término do Projeto	0 dias	Sáb 18/03/23	Sáb 18/03/23
